

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Mart-2010



İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	2
1. YÖNETİCİ ÖZETİ.....	3
2. GENEL DEĞERLENDİRME.....	4
2.1.Vizyon.....	4
2.2. Misyon.....	4
2.3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri.....	5
2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları.....	7
2.5. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi.....	7
2.6. 2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	9
2.7. 2009 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	10
a- Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	10
b- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	10
3- 2009 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	11
EKLER: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ.....	29

1. YÖNETİCİ ÖZETİ



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda etkili ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere çeşitli raporların hazırlanmasını ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Üniversiteler eğitim ve öğretim misyonunu yerine getirirken değişen zaman ve çağın gereksinimleri doğrultusunda, bu misyonu sürekli yenilemek ve kuvvetlendirmek zorunda olan kurumlardır. Bilgi toplumu olma sürecindeki ülkemizde, üniversiteler sürekli olarak değişim ve gelişimin rotasını belirleyen ve bunu görev edinen bir yapıyla eğitim öğretim hizmetini devam ettirmektedir. Uluslararası rekabet üstünlüğünün bilim ve teknoloji ile ölçüldüğü bir yüzyılda, 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini yaratma gayreti içerisindeki Gaziantep Üniversitesi, bir yandan çağdaş değerleri yaratma hizmetine girerken; diğer taraftan da hedef kitlesi olan öğrencilerinin iyi bir eğitim alması için tüm imkânlarını seferber etmektedir. 1987 yılında eğitim öğretime başlayan ve bölgenin önemli üniversitelerinden biri olan Gaziantep Üniversitesi, her geçen gün değişen ve büyüyen bir yapıyla öğrencilerine kaliteli bir eğitim vererek, onları Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda yetiştirmeyi gaye edinmiştir. Bu doğrultuda gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen üniversitemiz, bu amaçla fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalışmaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesine göre hazırlanan üniversitemizin 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların bilgisine sunulmuş bulunmaktadır.

Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN
Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. Vizyon

- Mevcut ve yeni yaratılacak kaynakların akılcı ve yerinde kullanımıyla,
- Özgüveni, saygınlığı, motivasyonu temel alan, sözde değil gerçekten katılımcı ve insan odaklı bir yönetişim anlayışıyla,
- Misyonu özümsemiş akademisyen ve diğer elemanlardan kurulu; bilimsellik, karşılıklı saygı ve güven ortamına oturan, ayrımcılığın olmadığı; açıklık, aydınlık ve özgürlük zemininde ilişkilere dayalı, dünya ölçeğinde bir üniversite olmak

2.2. Misyon

- Üstün nitelikli, dürüst, bilgili, sosyal ve kültürel açıdan donanımlı, ülkenin aydınlık geleceğine katkısı olacak elemanlar yetiştiren,
- İçinde barındıracağı yüksek kaliteli akademisyen gücüyle yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte araştırmalara dayalı bilgi, teknoloji, sosyal projeler üreten, kültür ve sanata katkıda bulunan,
- Ürettiği bilgi teknolojisi, sosyal projeler, sanat ve sağlık hizmetlerini bulunduğu doku ile paylaşarak bütünleşen ve buna bağlı olarak toplumun üretime katkısını ve toplumun problemlerine dair çözümleri ateşleyen,
- Değişen, değiştiren, değişimi yöneten,
- Büyük ATATÜRK'ÜN kurduğu demokratik, laik ve sosyal devletin "Çağdaş Medeniyetin Üzerine Çıkarılması" hedefine bağlı, öncü ve lokomotif olan bir üniversite.



2.3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemizin 2009-2013 Stratejik Planında belirlenen Amaç ve Hedefler aşağıda sıralanmıştır. 2009 yılı yatırımları da bu amaç ve hedefler doğrultusunda harcanmıştır.

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Stratejik Amaç-1 Eğitim Öğretim Kalitesini Yükseltmek.	Hedef-1 Çalışanların memnuniyeti iş tatminini artırmak ve çalışanın gelişimini sağlamak.
	Hedef-2 Akademik ve idari personelin alanları ile ilgili seminer ve konferanslara katılımı sağlanacaktır.
	Hedef-3 2011 yılı sonuna kadar öğrenciler için etkili eğitim ortamları (sınıf, laboratuvar çalışma ofisleri) oluşturulacaktır.
	Hedef-4 Eğitim öğretimin daha sağlıklı, güvenli ve verimli bir ortamda sürdürülmesi
	Hedef-5 Eğitimsel çalışmaların sürdürülmesi
	Hedef-6 Yönetimsel kadrolarda görev alan akademisyenlerin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin verilmesi
	Hedef-7 Yabancı dil eğitiminin güçlendirilmesi
	Hedef-8 Lisans ve lisansüstü eğitim – öğretimde kalitenin artırılması
	Hedef-9 Her eğitim öğretim yılından önce ders kataloglarının gözden geçirilerek ihtiyaca binaen değişikliklerin yapılması.
	Hedef-10 Kapalı Devre Radyo Televizyon Yayın Kalitesinin artırılması
	Hedef-11 Eğitimde uluslararası işbirliğinin artırılması
	Hedef-12 E-öğrenim programının başlatılması
	Hedef-13 Nitelikli öğrencilerin Gaziantep Üniversitesini tercihini sağlamak
	Hedef-14 Doktora ve Tıpta Uzmanlık sınavlarında ön sıralarda tercih edilen üniversite olmak için bu öğrencilere bir dönem yurt dışında eğitim imkânı sağlamak
	Hedef-15 Bilişim ve teknoloji eksikliklerinin tamamlanması
	Hedef-16 Bazı alanlarda bulunmayan kitap ve süreli yayınların kütüphane kaynaklarına eklenmesi;
Stratejik Amaç-2 Bilimsel Araştırma Stratejileri	Hedef-1 Ulusal ve uluslararası proje yürütme ve ortak olma girişimlerinin teşvik edilmesi
	Hedef-2 Bilimsel yayın sayısının ve kalitesinin artırılması.
	Hedef-3 Ulusal ve uluslararası konferanslara katılım ve bildiri sunma faaliyetlerinin teşvik edilmesi
	Hedef-4 Üniversitede ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların teşvik edilmesi
	Hedef-5 Sanayi ve kamu kuruluşlarınca desteklenen proje ve tez çalışmalarının artırılması
	Hedef-6 Proje hazırlama biriminin oluşturulmasıyla ilgili alt yapı çalışmalarının başlatılması
	Hedef-7 Bilimsel araştırma, tez ve altyapı projelerinin teşvik edilmesi
Stratejik Amaç-3 Toplumun Sunulan Hizmetleri Geliştirilmesi Stratejileri	Hedef-1 Araştırma ve Uygulama hastanesinin verdiği hizmetlerin geliştirilmesi ve verimliliğinin artırılması
	Hedef-2 Araştırma ve Uygulama hastanesi bünyesinde Onkoloji ve Kardiyoloji enstitülerinin kurulması.



	<p>Hedef-3: Önümüzdeki 5 yıllık süreçte; yurt dışına açılmak konusundaki çalışmalara ivme kazandırmak.</p> <p>Hedef-4 Daha nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine zemin hazırlamak</p> <p>Hedef-5 Üniversitenin tanıtım materyallerinin çeşitliliğinin ve sayısının artırılması</p> <p>Hedef-6 Üniversiteyle ilgili görsel, işitsel ve e-haber olarak olumlu haber sayısının artırılması.</p> <p>Hedef-7 Ulusal ve uluslararası tanıtım amaçlı sportif, sanatsal, kültürel etkinliklerin artırılarak sürdürülmesi</p> <p>Hedef-8 Üniversitenin paydaşlarıyla ilişkilerinin sağlam temellere dayanması ve sürekliliğinin sağlanması</p> <p>Hedef-9 Mezun öğrenciler e-sisteminin kurulması</p> <p>Hedef-10 Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi</p> <p>Hedef-11 Toplum sorunları ile ilgili merkezlerimizin etkinliklerinin artırılması</p> <p>Hedef-12 E-öğrenme sisteminin topluma hizmet verebilecek şekilde oluşturulması</p>
Stratejik Amaç-4 Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme	<p>Hedef-1 2008 yılında yapımına başlanan Fakülte ve Yüksekokul bina inşaatlarının tamamlanması.</p> <p>Hedef-2 Üniversitenin ihtiyaç duyduğu altyapı ve yenileme çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır.</p> <p>Hedef-3 Merkez Kampüs içerisinde bulunan eski binaların tamirat ve tadilat işlerinin tamamlanması</p> <p>Hedef-4 İhtiyaç duyulan hayvan deney laboratuvarı, oluşturulması için gerekli çalışmaların başlaması</p> <p>Hedef-5 Öğrenci ve öğretim üyesi sosyal hizmet binalarının artırılması için kaynak arama çalışmalarının yapılması.</p> <p>Hedef-6 1000 kişilik 1, 250'şer kişilik 4 adet kongre toplantı salonu bulunan kongre merkezi kurulması</p> <p>Hedef-7 Üniversitemiz öğrencilerinin sportif faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli spor alanlarının oluşturulması.</p> <p>Hedef-8 Kurulma çalışmalarına başlanması planlanan yeni fakültelerin ve bölümlerin kurulma çalışmalarına başlanması</p>
Stratejik Amaç-5 Öğrencilerin Sosyal Kültürel Ve Akademik Gelişimlerini Sağlamaya Yönelik Stratejiler	<p>Hedef-1 4-5 bin kişilik amfi tiyatro ve spor rekreasyon alanları geliştirilmesi</p> <p>Hedef-2 Öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmalık hizmetlerini etkili ve kapsamlı hale getirmek.</p> <p>Hedef-3 Öğrencilerin beslenme ulaşım ve güvenlik gibi konularda yaşam koşullarını iyileştirmek.</p> <p>Hedef-4 Öğrencilere daha fazla tiyatro sinema vb. kültürel faaliyetler düzenlemek.</p> <p>Hedef-5 Başarılı fakat maddi imkânları kısıtlı olan öğrencilere destek olunması amacıyla kısmi zamanlı olarak çalıştırılmaları.</p> <p>Hedef-6 Öğrencilerin sosyal donanımlarının artırılarak, sosyal projelere katılımının sağlanması.</p> <p>Hedef 7: Engelli öğrencilerin şartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması</p>

2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları

2009 Bütçe Kanunu ile Üniversitemize Yatırım projelerinin harcamaları için 22.384.000 TL. ödenek verilmiş, yıl içinde ise 2.000.000 TL. si yedek ödenekten olmak üzere toplam 5.920.000 TL. ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 28.304.000 TL.'ye ulaşmıştır. Ayrıca Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Büyük Onarımları Projesine, Döner Sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 2.000.000 TL. ödenek konulmuş yıl içinde yapılan ekleme ile söz konusu ödenek 3.719.000 TL.'ye ulaşmış ve anılan ödeneğin tamamı harcanmıştır.

(000 TL.)

Finansman Kaynağı	2009 Yılı Bütçe Ödeneği	Eklenen	2009 Yılı Toplam Ödeneği
Hazine	16.134	2.000	18.134
Öz Gelir	6.250	3.920	10.170
Yatırım Projeleri Toplamı	22.384	5.920	28.304
Döner Sermaye	2.000	1.719	3.719
Bütçe + Döner Sermaye	24.384	7.639	32.023
Kamulaştırma	50	1.500	1.550
Genel Toplam	24.434	9.139	33.573

Ayrıca Üniversitemiz Bütçesine 62.000 TL. değerinde iki adet hibe taşıt konulmuş ancak yıl içinde bir adet 118.000 TL. değerinde T2 Binek otomobil hibe alınarak hesaplara işlenmiştir.

2.5. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi

Adını, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük sanayi ve ticaret merkezi olan Gaziantep ilinden alan Üniversitemizin temeli, 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümüne dayanmaktadır. 27 Haziran 1987 yılında, 3389 sayılı yasa ile bugünkü statüsüne kavuşan Gaziantep Üniversitesi, zaman içinde hızla büyüyerek 10 fakülte, 4 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 12 araştırma ve uygulama merkezi, 5 rektörlüğe bağlı bölüm, 1.099 akademik ve 812 idari personeli ile 17.110 öğrenciye eğitim veren bir bölge üniversitesi konumuna ulaşmıştır.

Rekabetin, üretilen malın kalitesi ile ilişkili olduğunu bilen Üniversitemiz, gerek üretilen malın kalitesinin, gerekse kullanılan teknolojinin geliştirilmesi amacıyla 2004 yılında Üniversite-KOSGEB işbirliği ile kurulan "TEKMER - Teknoloji Geliştirme Merkezi" ile sanayi kuruluşlarımıza destek vermektedir.

9 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak resmen kurulan GAZİANTEP TEKNOPARK için Üniversite kampus alanı içerisinde 170 dönümlük arazi ayrılmıştır. Gaziantep Teknopark, bilim ve teknoloji potansiyeli yüksek olan Gaziantep Üniversitesinin bu alandaki başarılı çalışmalarının ticarileştirilmesine uygun ortamı sağlayacak ve öğrenciler için de bir istihdam alanı olacaktır. Ayrıca bölgede yer alan firmaların akademik bilgiden yararlanmalarını sağlayacaktır. Bir iş ve girişimcilik merkezi olmayı hedefleyen Gaziantep Teknopark, Ar-Ge ve yazılım alanında faaliyet gösteren firmaları bir araya getirerek bir işbirliği ve dayanışma ortamı yaratacaktır.

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 – 1989 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencileri ile eğitime başlamıştır. 1989 yılında Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak Eski Verem Hastanesi, Kolejtepe hastane binasında poliklinik hizmeti vermeye başlamıştır. Her türlü teknik ve tıbbi cihaz ekipmanından yoksun olarak 9 öğretim üyesi ile açılmıştır. Günümüze kadar olan zaman diliminde hızla gelişerek büyüyen hastane tüm branşlardan öğretim üyeleriyle ve tam teşekküllü cihazlarla hizmet verir duruma gelmiştir. 2008 yılı itibari ile klinikleşmeye gidilerek, her klinik birimin kendine ait servisi oluşturulmuştur. Ana yoğun bakım ünitelerin yanı sıra 40 yataklı ara yoğun bakım üniteleri gelişmiş cihaz donanımlarıyla hizmete sunulmuştur.

Bugünkü konumuyla hastaneler kompleksi halini alan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, sahip olduğu teknik donanımı ve öğretim üyesi, yalnızca Türkiye’nin değil Orta doğunun da en önemli hastanelerinden birisi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Gün Hastanesi

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde bulunan Gün Hastanesi; gününbirlik tedavi edilebilecek hastaların daha hızlı ve seri bir şekilde işlemlerinin yapılmasını sağlamak amaçlı kurulan gün hastanesi de bölgede ilk olma özelliği taşımaktadır. Kendi içinde ameliyathaneleri ve konforlu klinik imkânlarını mevcuttur.

Onkoloji Hastanesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ilk kanser hastanesi olan Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Gaziantep’li hayırseverimizin büyük katkılarıyla yapılmıştır.



Onkoloji Hastanesi Güneydoğu bölgemize ve komşu devletlere hizmet için, 2 Aralık 2006 açılmıştır. 118 yatak kapasiteli olan Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi; en modern ve en gelişmiş radyoterapi ve kemoterapi cihazlarıyla, her türlü kanserin teşhis ve tedavi uygulamasını yapabilecek donanıma sahiptir.

2.6. 2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2009 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz inşaatlarının yapımı için Merkezi Derslik ve İdari Binalar Projesine verilen ödenek ile 2009 yılında biten ve 2009 yılında başlayıp halen devam eden inşaatlar belirtilmiştir.

Tamamlanan İnşaatlar

Tamamlanan İnşaatın Adı	Tamamlanma Tarihi	Kapalı Alanı (m2)
Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Ek Binası İnşaatı	24.07.2009	6.526
Yabancı Diller Yüksek Okulu İnşaatı	10.09.2009	4.560
Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu İnşaatı	15.12.2009	5.500
Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası İnşaatı	28.07.2009	1.663
Endüstri Mühendisliği Bölüm Binası İnşaatı	08.06.2009	1.750
Eğitim Fakültesi (A-B Blok) Binası İnşaatı	30.03.2010	7.600
TOPLAM KAPALI ALAN		27.599

Devam Eden İnşaatlar

İnşaatın Adı	Tamamlanma Tarihi	Kapalı Alanı (m2)
3.000 Kişilik Anfi Tiyatro İnşaatı	18.08.2010	3.655
Meslek Yüksek Okulu Binası İnşaatı	11.10.2010	5.200
Eğitim Fakültesi (C Blok) Binası İnşaatı	08.11.2010	3.845
TOPLAM KAPALI ALAN		12.700

Diğer İnşaatlar

Yapılan İşin Adı	Kapalı Alanı (m2)
Mevcut Mekanlarda Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri	4.525
Laboratuar Mekanları Onarım, Tadilat, yenileme İşleri	1.850
Çatı Onarım, Yenileme İşleri	2.405
Kütüphane Mekanı Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri	790

2.7. 2009 Yılı Yatırım Uygulamaları

a- Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2009 yılı Bütçe kanunu ile Yatırım projelerinin harcamaları için 22.384.000 TL. ödenek verilmiş 2.000.000 TL. si yedek ödenekten olmak üzere toplam 5.920.000 TL. ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 28.304.000 TL.'ye ulaşmıştır.

Üniversitemizin Hastane Büyük Onarım Projesi için kaynağı döner sermaye olmak üzere bütçeye 2.000.000 TL. ödenek konulmuş olup yıl içinde yapılan ekleme ile bu projenin ödeneği 3.719.000 TL. ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin tamamı harcanmıştır.

Ayrıca 2009 yılı bütçemize 62.000 TL. değerinde 2 adet T2 hibe Binek Otomobil konulmuş, ancak yıl içinde bedel artışı neticesinde bir adet 118.000 TL. değerinde makam aracı hibe alınarak hesaplara işlenmiştir.

Yatırım Ödeneklerinin Sektörel Bazda Dağılımı ve Harcama Durumu

(000 TL.)

SEKTÖRÜ	2009 Yılı Bütçe Ödeneği	Eklenen	2009 Yılı Toplam Ödeneği	Yıl Sonu Harcama	Harcama (%)
Eğitim	14.950	4.586	19.536	17.682	90
Spor	200	255	455	360	79
Kültür	300	0	300	300	100
Sağlık	1.000	0	1.000	976	98
Diğer Kamu Hiz.	5.934	1.079	7.013	7.013	100
Yatırım Projeleri Toplamı	22.384	5.920	28.304	26.331	93
Sağlık (Döner Sermaye)	2.000	1.719	3719	3719	100
Bütçe+Döner Sermaye	24.384	7.639	32.023	30.050	94
Kamulaştırma	50	1.500	1.550	1.550	100
Genel Toplam	24.434	9.139	33.573	31.600	94

b- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Kurumumuz yatırım ödenekleri Orta Vadeli Mali Plan ile belirlenen ödenek tavanları ile sınırlı tutulduğundan üniversitemiz yatırımlarının süreleri uzamakta ve inşaatlarımız programlanan sürelerde bitirilememektedir.
- Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve mevsimsel şartlar Maliye Bakanlığınca göz önüne alınır ve buna göre oranlar verilirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir.



- Ayrıntılı Finans Programının ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyi yerine birinci düzeyinde hazırlanması, 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine uygun olacaktır.

3- 2009 YILI PROJE UYGULAMALARI

PROJE NO : 2009H031090
PROJE ADI : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2009-2009

Bu projeye 2009 Yılı Bütçe Kanunu ile 75.000 TL. ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde 14.680 TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 89.680 TL.'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 89.680 TL.'si harcanmıştır.

Harcanan bu ödenek ile merkez kampusu içerisinde yapılması öngörülen 5.200 m² kapalı alanlı MYO yeni bina ve ek bina statik, tesisat ve mimari, 3.655 m² açık alanlı 3000 kişilik Amfi tiyatro inşaatı zemin etüdü, statik, tesisat ve mimari, 16.500 m² kapalı alanlı Dış Hekimliği fakültesi zemin etüdü, statik, tesisat ve mimari projeleri yaptırılmıştır.

PROJE NO : 1988H031310
PROJE ADI : Merk. Ders., Lab.ve İd.Binalar (GAP)
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 1988-2013

Bu projeye 2009 Yılı Bütçe Kanunu ile 7.575.000 TL. ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde GAP Eylem Planı çerçevesinde 2.000.000 TL. hazine tahakkuk devrinden 2.500.000 TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 12.075.000 TL. olmuştur. Bu ödeneğe kampus altyapısından 1.318.000 TL. öz gelirlere 25.000TL. ve kütüphane yayın alımlarından 100.000TL. aktararak 13.518.000 TL. ödeneğe ulaşılmıştır. 2009 yılsonu itibariyle bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. Harcanan 13.518.000 TL. ödenek ile aşağıdaki işler yapılmıştır.

2008 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan, 5.500 m² kapalı alanlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu binası inşaatı 15.12.2009 tarihinde tamamlanarak hizmete açılmıştır.

2008 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan, 7.600 m² kapalı alanlı Eğitim Fakültesi (A ve B blok) binası inşaatı 30.03.2010'da tamamlanması planlanmaktadır. 2008 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan, 4.560 m² kapalı alanlı Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası inşaatı 10.09.2009 tarihinde tamamlanarak hizmete açılmıştır. 2008 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan, 1.663 m² kapalı alanlı Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası inşaatı 28.07.2009 tarihinde tamamlanarak hizmete açılmıştır. 2008 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan, 6.526 m² kapalı alanlı Tıp

Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Ek Binası inşaatı 24.07.2009 tarihinde tamamlanarak hizmete açılmıştır. 2008 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan, 1.750 m² kapalı inşaat alanlı Endüstri Mühendisliği binası inşaatı 08.06.2009 tarihinde tamamlanarak hizmete açılmıştır. Aynı proje içerisinde yer alan Merkezi Derslik Donanım projesinde daha önce hizmete alınmış Fakültelerin ve Yüksek Okulların donanımları yapılmıştır. Bu donanımlar içerisinde; Naci Topçuoğlu MYO. Amfi Sırası alımı ihalesi, bilgisayar alımı ihalesi yapılmış sonuçlandırılmış ve malzemeler teslim alınarak ilgili birimlere teslim edilmiştir. Tüm Kampus içi ve taşra birimlerinde kullanılmak üzere donanım alımı ihalesi (çalışma masası, sıra, yazı tahtası, çalışma koltuğu v.b), Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimlerinde kullanılmak üzere perde yaptırılması, alımları yapılmıştır

Bu Proje Kapsamında Biten İnşaatlar

İŞİN ADI	TIP FAKÜLTESİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ EK BİNASI İNŞAATI
İHALE BEDELİ	4.242.669,23-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	21.07.2008
BİTİŞ TARİHİ	24.07.2009
TOPLAM KAPALI ALAN	6.526 m ²
AÇIKLAMA	4 Ad. 125 Kişilik Amfi, 2 Ad. 250 Kişilik Amfi, 1 Ad. Dış Laboratuvarı, 2 Ad. Derslik, 38 Ad. Ofis 1ad. Toplantı Odası, Kafeterya, Okuma Salonu



İŞİN ADI	YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU İNŞAATI
İHALE BEDELİ	1.971.150,00-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	05.12.2008
BİTİŞ TARİHİ	10.09.2009
TOPLAM KAPALI ALAN	4560 m ²
AÇIKLAMA	42 Ad. Derslik, 1 Ad. Bilgisayar Laboratuvarı, 1 Ad. Toplantı Odası, 1 Ad. Sinema Odası





İŞİN ADI	BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU İNŞAATI
İHALE BEDELİ	2.719.000,00-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	22.01.2009
BİTİŞ TARİHİ	15.12.2009
TOPLAM KAPALI ALAN	5.500 m ²
AÇIKLAMA	1 Ad. Amfi,12Ad. Derslik, 1 Ad. Laboratuar,1 Fitness Salonu



İŞİN ADI	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIK BİNASI İNŞAATI
İHALE BEDELİ	1.364.138,90-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	22.08.2008
BİTİŞ TARİHİ	28.07.2009
TOPLAM KAPALI ALAN	1663 m ²
AÇIKLAMA	3 Ad. Konferans Salonu, 3 Ad. Derslik



İŞİN ADI	ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BİNASI İNŞAATI
İHALE BEDELİ	1.200.251,74-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	04.08.2008
BİTİŞ TARİHİ	08.06.2009
TOPLAM KAPALI ALAN	1.663 m ²
AÇIKLAMA	Mühendislik fakültesi dekanlığı ve Fen Bilimleri Enstitüsü olarak kullanılmaktadır.



İŞİN ADI	EĞİTİM FAKÜLTESİ (A-B BLOK) BİNASI İNŞAATI
İHALE BEDELİ	4.224.424,00-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	15.01.2009
BİTİŞ TARİHİ	30.03.2010
TOPLAM KAPALI ALAN	7.600 m ²
AÇIKLAMA	102 Ad. Ofis, 7 Ad. Toplantı odası, 20 Ad. Derslik, 1 Ad. 250 Kişilik Amfi 7 Ad. Laboratuvar, 3 Ad. Kafeterya



Devam Eden Projeler:

İŞİN ADI	3.000 KİŞİLİK ANFİ TİYATRO İNŞAATI
İHALE BEDELİ	1.846.423,00-TL
BAŞLANGIÇ	22.12.2009
BİTİŞ TARİHİ	18.08.2009
TOPLAM KAPALI	3.655 m ²
AÇIKLAMA	6 Ad. Dükkân



İŞİN ADI	MESLEK YÜKSEK OKULU BİNASI İNŞAATI
İHALE BEDELİ	1.629.000,00-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	16.12.2009
BİTİŞ TARİHİ	11.10.2010
TOPLAM KAPALI	5.200 m ²
AÇIKLAMA	52 Ad. Ofis,20 Ad. Derslik,2 Ad. Çizim Salonu,9 Ad. Laboratuar



İŞİN ADI	EĞİTİM FAKÜLTESİ (C BLOK) BİNASI İNŞAATI
İHALE BEDELİ	1.661.069,32-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	23.12.2009
BİTİŞ TARİHİ	08.11.2010
TOPLAM KAPALI ALAN	3845 m ²
AÇIKLAMA	7 Ad. Laboratuar, 7 Ad. Müzik Çalışma Odası, 1 Ad. 250 Kişilik Anfi, 1 Adet Resim Atölyesi, 16 Ad. Derslik, 3 Adet Kafeterya



PROJE NO : 1991H030810
PROJE ADI : Kampüs Altyapısı
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 1991-2013

Bu projeye 2009 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 2.500.000 TL. verilmiş, anılan projeden yıl içinde 1.318.000 TL. ödenek, Merk. Ders. Lab. ve İd. Bina+Donanım bütçesine **aktarılarak** toplam ödenek 1.182.000 TL. olmuştur. 2009 yılsonu itibariyle bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. Harcanan 1.182.000 TL. ödenek ile aşağıdaki işler yapılmıştır.

Kampus içerisinde ısınma amaçlı kullanılan mevcut ısı merkezinin Isı Merkezi ve Eşanjör daireleri tadilatı ihalesi yapılarak sonuçlandırılmış, 2009 yılı içinde tamamlanarak hizmete alınmıştır. Kampus OG Hattı Yenileme ihalesi yapılarak sonuçlandırılmış, 2009 yılı içinde tamamlanarak hizmete alınmıştır. Bu proje kapsamında Onkoloji Hast. Klima Grubu yenilenmesi işi ihalesi yapılmış, sonuçlandırılmış ve işin tamamı 2009 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir. Ayrıca Nizip MYO. telefon hattı yapımı, Yabancı Diller Yüksekokulu otopark ve kaldırım yapılması, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri ek binası bağlantı yolu ve Yapı İşleri önü otoparkının kilit taşı ile yapılması işleri doğrudan temin usulü ile tamamlanmıştır.



PROJE NO : 2009H040120
PROJE ADI : Cenani Evi Restorasyonu
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2009-2010

Bu projeye 2009 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 300.000 TL. verilmiştir. Proje ihalesi yapılarak, 23.11.2009 tarihinde yapımına başlanmıştır. 2010 yılı eylül ayında tamamlanması planlanmıştır.

İŞİN ADI	CENANİ KONAĞI RESTERASYONU İNŞAATI
İHALE BEDELİ	328.300,000-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	23.11.2009
BİTİŞ TARİHİ	18.09.2010
TOPLAM KAPALI ALAN	500 m ²



PROJE NO : 1992H050160
PROJE ADI : Açık Kapalı Spor Tesisleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2009-2010

Bu projeye 2009 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 200.000 TL. verilmiştir. Yıl içinde Sağlık Kültür Spor Gelirlerinden 255.000 TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 455.000 TL. olmuştur. Proje kapsamında toplam 360.000 TL. ödenek harcanmıştır. Harcanan ödenek ile Spor Sahası suni çim yapımı ihalesi, Atletizm pisti çizgi ve yedek kulübe yapımı ihalesi sonuçlandırılarak yapımları tamamlanmış ve hizmete alınmıştır.





PROJE NO : 2009H031100
PROJE ADI : Muhtelif İşler (B.Onr. Mak. Tech. Bilg. Don.Yazl. Küt. Yay alımları)
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2009-2009

Bina Büyük Onarımları

Bu projeye 2009 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından bina büyük onarımları için 1.200.000 TL. ödenek verilmiştir. 2009 yılsonu itibariyle bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. Harcanan 1.200.000 TL. ödenek ile aşağıdaki işler yapılmıştır.

Büyük Onarım projesi ihalesi kapsamında Gıda Mühendisliği Binası ve Spor Salonu dış cephe PVC malzeme ile kaplanması işi ihalesi yapılmış sonuçlandırılmış ve işin tamamı 2009 yılında bitirilmiştir. Ayrıca bu proje kapsamında Nizip Meslek Yüksekokulunun asansör yapımı, Gaziantep Meslek Yüksekokulu Takı teknolojisi programı tadilatı ve onarımı, Tekstil Mühendisliği Atölyesi çelik konstrüksiyonla asma kat yapılması, Kütüphane Binası PVC zemin kaplaması yapılması işleri bitirilmiştir. GMYO Gıda Teknolojisi Laboratuvar tadilat ve onarımı, Kampus ve Rektörlük Girişi Tretuvar Onarımı, Biyoloji Bölümü deney havuz onarımı, Dış Hekimliği Klinik Tadilatı, Sağlık Yüksekokulu Tıbbi Beceri Laboratuvar tadilat ve onarımı, Nizip MYO laboratuvar derslik tadilatı, Nurdağı MYO. Tadilatı, İdare Bina tadilatı ve İnşaat Mühendisliği Zemin laboratuvar bölme yapılması işleri tamamlanmıştır.

Üniversite Makine Teçhizat Alımları

Bu projeye 2009 Yılı Bütçe Kanunu ile 634.000 TL. hazine yardımı 1.016.000 TL. öz gelir olmak üzere 1.650.000 TL. ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde Fen Edebiyat Fakültesi bütçesine 25.000 TL. ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bütçesine ise 36.000 TL. öz gelirden ödenek eklenerek toplam ödenek 1.711.000 TL.'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 772.750 TL.'si harcanmıştır. Bu harcamanın 714.263 TL.'si İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesinden yapılmış, 22.656 TL. Fen Edebiyat Fakültesi bütçesinden 35.388 TL. ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden yapılmıştır.

Makine Teçhizat Projesi Kapsamında Yapılan Alımların Listesi

Alınan Malzemenin Adı	Miktarı	Tutarı TL.	Alındığı Birim
Motorlu şeritli tester	1 adet	12.095	Makine Mühendislik Bölümü
El tipi testere	5 adet	295	Makine Mühendislik Bölümü
Ses ölçme aleti	1 adet	24.544	Makine Mühendislik Bölümü
Kameralı mikrofon	1 adet	2.950	Tekstil Mühendislik Bölümü
Dijital terazi	1 adet	1.416	Tekstil Mühendislik Bölümü
Trinoküler mikroskop	1 adet	9.310	Tekstil Mühendislik Bölümü
Manyetik karıştırıcı ısıtıcı	3 adet	2.592	Tekstil Mühendislik Bölümü



Çekme basma test cihazı	1 adet	133.210	Makine Mühendislik Bölümü
Buruşma dönüşüm ve hid. Cihazı	1 adet	39.346	Tekstil Mühendislik Bölümü
PLC eğitim seti	2 adet	18.290	Elekt. Elektronik Mühendislik Bölümü
Y.Gerilim darbe jeneratörü	1 adet	41.300	Elekt. Elektronik Mühendislik Bölümü
Kaynak makinesi	1 adet	12.095	Makine Mühendislik Bölümü
Karbon kaplama makinesi	1 adet	43.306	Fizik Mühendislik Bölümü
Işıl işlem fırını	1 adet	18.290	Makine Mühendislik Bölümü
Binoküler mikroskop	20 adet	46.728	Gıda Mühendisliği Bölümü
Işık ve fotoğraf apareyleri	7 adet	4.923	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Konsül piyano	4 adet	19.470	Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
Hoparlör	4 adet	944	Naci Topçuoğlu MYO
Müzik altı sehpa	6 adet	153	Naci Topçuoğlu MYO
Müzik aleti kuvvetlendirici	1 adet	1.003	Naci Topçuoğlu MYO
Kablosuz mikrofon	6 adet	1.150	Naci Topçuoğlu MYO
Geniş tabanlı otomat	1 adet	5.738	Naci Topçuoğlu MYO
Kablosuz mikrofon sistemi	1 adet	9.897	Gaziantep MYO
Data kasası ve sunucu	1 adet	885	Gaziantep MYO
Adaptör	1 adet	2.995	Gaziantep MYO
Işık gösterici seti	1 adet	8.936	Gaziantep MYO
Temrinlik malzeme	20 adet	35.234	Sağlı Hizmetleri MYO
Muhtelif malzeme	44 adet	21.653	Diş Hekimliği Fakültesi
Diş protez malzemesi	9 adet	4.838	Sağlı Hizmetleri MYO
Anatomi eğitim maketi	1 adet	158.958	Tıp Fakültesi
SFT ve EKG cihazı	2 adet	11.642	Fizyoloji Ana Bilim Dalı
Jeneratör	1 adet	20.077	Oğuzeli MYO
Genel Toplam		714.263	

PROJE NO : 2009H031100
PROJE ADI : Yayın Alımları
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2009-2009

Üniversitemizin 2009 yılı Yayın Alımları Projesine Bütçe Kanunu ile 500.000 TL. ödenek konulmuş bu ödeneğin 351.000TL. 'si yayın alımları için harcanmış 115.000 TL.'si Derslik ve Merkezi Birimler projesine aktarılmıştır. Geriye kalan 34.000 TL. ise harcanmayarak



yılsonu itibariyle iptal olmuştur. Yıl içinde harcanan 351.000 TL'lik ödenek ile üniversitemiz eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 150 adet yabancı, 1.058 adet yerli yayın olmak üzere toplam 1.208 adet kitap alımı yapılmış 74 adet yerli kaynaktan dergi aboneliği, 16 adet veri tabanı ödemesi ve 4 yeni veri tabanına üyelik işlemi yapılmıştır.

Abone olunan Tam Metin (Full Text) Veri Tabanları

1. American Institute of Physics (AIP)
2. Annual Reviews
3. Cambridge University Press
4. Ebrary
5. Institute of Physics (IoP)
6. JASN ([Journals of the American Society of Nephrology](#))
7. JSTOR
8. [JSTOR Business Collection](#)
9. MDConsult
10. Oxford Online Journals
11. Proquest Central
12. ProQuest Dissertations and Thesis Full Text
13. SpringerLink
14. UptoDate
15. Serial Solutions
16. Wiley-Blackwell



2009 YILINDA Abone olunan Veri tabanları

1. ProQuest Dissertations and Thesis Full Text
2. BioOne
3. Derwent Innovation Index
4. [Dentistry & Oral Science Source](#)

ULAKBİM Tarafından Sağlanan Veri tabanları

1. Academic Search Complete (Ebsco)
2. BMJ Journals
3. InformaWorld (Taylor and Francis)
4. ScienceDirect
5. Web of Science (WoS)





Üniversite Bilgi Teknolojileri

Bu projeye 2009 Yılı Bütçe Kanunu ile 650.000 TL. hazine yardımı 50.000 TL. öz gelir olmak üzere toplam ödenek 700.000 TL. olmuştur. Bu yılsonu itibariyle 569.736 TL.'si harcanmıştır. Söz konusu ödenek ile yapılan alımlar aşağıda listelenmiştir.

Alınan Malzemenin Adı	Miktarı	Tutarı TL.	Alındığı Birim
Dizüstü mini Bilgisayar	180 adet	109.058	Üniversite geneli
Projeksiyon cihazı	24 adet	23.203	Üniversite geneli
Dizüstü Bilgisayar bataryası	60 adet	6.571	Üniversite geneli
Bilgisayarların yükseltilmesi	350 adet	75.934	Üniversite geneli
Masaüstü bilgisayar	300 adet	174.744	Üniversite geneli
UTP kablo	60 kutu	6.634	Bilgi İşle Daire Başkanlığı
Switch kabini	20 adet	6.679	Bilgi İşle Daire Başkanlığı
RJ- 45 jack	10.000 adet	472	Bilgi İşle Daire Başkanlığı
Switch anahtar	33 adet	40.114	Bilgi İşle Daire Başkanlığı
Bilgisayar	8 adet	20.287	Tıp Fakültesi
Modem	2 adet	2.696	Bilgi İşle Daire Başkanlığı
Bilgisayar panel	10 adet	19.418	Bilgi İşle Daire Başkanlığı
Fiber konektör	250 adet	501	Bilgi İşle Daire Başkanlığı
Fiber konektör uç	200 adet	3.717	Bilgi İşle Daire Başkanlığı
zımpara	1 kutu	64	Bilgi İşle Daire Başkanlığı
Parlatıcı	1 kutu	64	Bilgi İşle Daire Başkanlığı
Fiber modül	15 adet	13.268	Bilgi İşle Daire Başkanlığı
Dokunmatik panel bilgisayar	8 adet	14.429	Bilgi İşle Daire Başkanlığı
Sunucu bilgisayar	9 adet	15.575	Üniversite geneli
Çok fonksiyonlu ve normal yazıcı	2 adet	447	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri alımı toplamı		533.875	
Bilgisayar Program alımı			
Bap otomasyon ek model program	1 adet	3.000	Genel Sekreterlik
UK. M.HPSS POOP Programı	1 adet	10.030	Elektrik Elek. Mühendislik Bölümü
ANSYS akademik program	1 adet	9.381	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
DAVASOFT Program	1 adet	2.950	Hukuk Müşavirliği
AMP EBYS Yazılım	1 adet	4.900	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
AMP EBYS Yazılım	2 adet	5.600	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
Bilgisayar Program alımı toplamı		35.861	
Bilgi Teknolojileri Toplamı		569.736	

PROJE NO : 2009I00410
PROJE ADI : Hastane Makine ve Teçhizatı (GAP)
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2009-2009



2009 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Hastane Makine ve Teçhizat Projesine 1.000.000 TL ödenek verilmiş bu ödeneğin 976.000 TL.' si yılsonu itibariyle harcanmıştır. Geriye kalan 24.000 TL. ödenek ise yılsonu itibariyle harcanmayarak iptal olmuştur. 2009 yılında alınan ve aşağıdaki tabloda dökümü makine teçhizat 4734 Sayılı Kamu İhale

Kanununun 19, 21 ve 22. maddeleri kullanılarak alımları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Makine Teçhizatlar tabloda belirtilen hastanemiz bölümlerine alınmıştır.

2009 Yılında Hastaneye Alınan Makine Teçhizat Listesi

Alınan Malzemenin Adı	Miktarı	Tutarı	Alındığı Bölüm
Alıcı Set	1 set	36.146,87	Genel Cerrahi AD
Böbrek ve Canlı Donör Seti	1 set	36.155,92	"
Transplasyon mikrocerrhi seti	1 set	35.691,85	"
Fibrilatör Cihazı	1 adet	7.117,20	Kalp Cerrahisi AD.
Ameliyat Masası	2 adet	58.060,80	Anestezi ve Reanimasyon (Ameliyathane)
Anestezi Cihazı	2 adet	136.944,00	"
Serum Askısı	6 adet	1.019,52	"
Kan pompası	1 adet	495,72	"
Port küvet	6 adet	545,16	"
Mayo masası	2 adet	2.084,35	"
Paslanmaz Çelikten raf	5 adet	8.773,30	"
Ameliyathane malzeme dolabı	2 adet	3.851,52	"
X bacaklı çöp arabası	4 adet	1.628,40	"
Traksiyon cihazı	1 adet	7.311,60	Fizik tedavi AD.
Kombine elektro ve Terapi Cih.	1 adet	6.123,60	"
Portatif Smilatör Cihazı	1 adet	378	"
Tens Cihazı	1 adet	1.922,40	"
Hotpack Cihazı	1 adet	1.659,96	"
Ekstracorporel Shockwave Cihazı	1 adet	43.038,00	"
Hemodiyaliz cihazı	2 adet	53.740,80	Nefroloji AD.
Portable Su sistemi	2 adet	28.508,80	"
Yenidoğan Balon Maskesi	5 adet	783	Çocuk Sağ.ve Hast.AD.
Yenidoğan Yatağı	10 adet	3.469,20	"
Fototerapi Cihazı	2 adet	23.220,00	"



2009 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Gaz Sterilizasyon Cihazı	1 adet	85.298,40	Sterilizasyon Ünitesi
Yüksek Düzey Renkli Doppler Ultrasonografi	1 adet	184.032,00	Radyoloji AD.
Elektro koter cihazı	1 adet	19.440,00	Gastroenteroloji AD.
Video Gastrokopi cihazı	1 adet	45.360,00	"
Renkli Doppler Ultr. Cihazı	1 adet	81.000,00	Üroloji AD.
Nebulizatör	5 adet	6.183,00	Başhemşirelik
Defibrilatör	2 adet	23.880,96	"
Koter+koter arabası	2 adet	32.233,04	"
Toplam		976.097,37	

PROJE NO : 2009I00410
PROJE ADI : Hastane Büyük Onarımı (GAP)
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2009-2009


Üniversitemizin 2009 yılı yatırım bütçesine, kaynağı Döner Sermayeden olmak üzere 2.000.000 TL. ödenek konulmuş yıl içinde bu projeye 1.719.000 TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 3.719.000 TL. olmuştur. Yılsonu itibariyle söz konusu ödeneğin tamamı harcanmıştır.

PROJE NO : 2009K120690
PROJE ADI : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (GAP)
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2009-2009


Bu projeye 2009 yılı Bütçe Kanunu ile 4.304.000 TL. sermaye giderleri, 291.000 TL. cari olmak üzere toplam 4.725.000 TL. ödenek verilmiş olup anılan ödeneye yıl içinde 1.079.000 TL. sermaye giderlerine 322.510 TL. ise cari giderlere eklenmiştir. Eklemeler sonucunda sermaye giderleri ödeneği 5.513.000 TL.'ye cari giderler ödeneği ise 613.610 TL.'ye ulaşmıştır. Söz konusu ödenekler ile 2009 yılı içerisinde aşağıda detayları verilen toplam 124 projeye destek verilmiştir. Söz konusu projelerin destek miktarları ile bu projeler için yapılan harcamalar tablolar halinde belirtilmiştir.




BÖLÜMÜ	TIP FAK.	MÜHENDİSLİK	FEN EDBİYAT	DIŞ HEKİMLİĞİ	İKT. VE İDARİ BİRİMLER	M.Y.O	REKTÖRLÜK
PROJE ADEDİ	66	24	23	6	1	3	1



PROJE TÜRLERİ	KAPSAMLI	ALT YAPI	KATILIMLI	YÜK.LİSANS	DOKTORA TEZİ	DESTEK PRO.
ADEDİ	72	1	6	12	30	3




BÖLÜMÜ	TIP FAK.	MÜHENDİSLİK	FEN EDEBİYAT	DIŞ HEKİMLİĞİ	İKT. VE İDR. BİL. FAK.	M.Y.O.	REKTÖRLÜK
DESTEKLENEN MİKTAR (TL)	4.781.911,00	559.414,00	231.338,00	341.807,00	7.500,00	14.590,00	14.590,00



2009 Yılında Desteklenen Projelerin Harcama Kalemlerine Dağılımı

Birim Adı	Üretim Yönelik Mal ve Malz. Alımı	Tüketim Yönelik Mal ve Malz. Alımı	Yolluklar	Hizmet Alımları	Bakım Onarım Giderleri	Mamul Mal Alımları
Tıp Fakültesi		312.409,18		6.864,00	1.250,00	3.622.533,65
Mühendislik Fakültesi	1.100,00	16.932,76	425,00	42.787,88	6.771,14	401.570,00
Fen Edebiyat Fakültesi		30.623,48	14.287,27	118.676,05	11.974,52	14.109,76
Diş Hekimliği Fakültesi		4.441,60			10.022,80	232.972,00
İktisadi Ve İdari Bilimler Fak.		544,77		6.844,00		
Rektörlük				12.555,36	605,87	
Genel Toplam	1.100,00	364.951,79	14.712,27	187.727,29	30.624,33	4.271.185,41

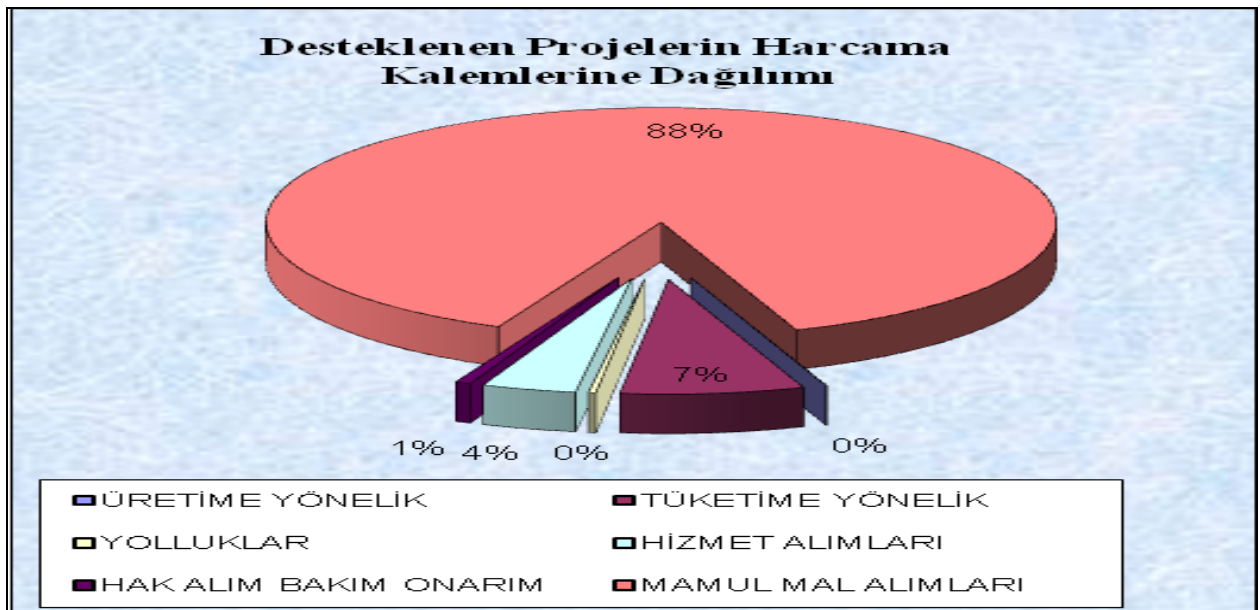

PROJE NO : 2009K120700
PROJE ADI : Gıda Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (GAP)
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2009-2010



Bu projeye 2009 yılı Bütçe Kanunu ile 1.500.000 TL. ödenek verilmiş olup anılan ödeneğin tamamı yıl içerisinde harcanmıştır.

Proje Kapsamında Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Çalışmalar:

Proje teklifinde belirtilen cihazlar Gıda Sanayi ile yapılan görüşmeler ve proje ekibi ile yapılan toplantılarda detaylı olarak incelenerek, üretime ve üretim

sonrası araştırmalara yönelik cihazların alınmasına karar verilmiştir.

2009 yılı bütçe harcamaları analitik ölçüm cihazlarına ayrılmıştır. 2010 yılı bütçe harcamaları ise diğer analitik ve pilot üretim cihazlarına ayrılacaktır. Bu nedenle araştırmalarda en

çok önemli ve ihtiyaç duyulan cihazların alınmasına öncelik verilmiştir. Bazı cihazların sanayide yaygın olarak bulunmasından ve bazılarının ise maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle alımlarından vazgeçilmiştir. Gıda Mühendisliği ek pilot tesis binası (3 laboratuvar analitik ölçüm cihazları ve 2 laboratuvar pilot üretim cihazları) cihazların yerleştirilmesi için ayrılmıştır.



2009 yılında yaşanan döviz kuru artışı

cihaz alımlarının istenilen düzeyde gerçekleşmemesinde önemli bir etken olmuştur.

A- Alımı Yapılan Cihazlar

1. X-Işın Difraktometresi sıcaklık kontrol ünitesi

İhale Tarihi: 21.04.2009

İhale Bedeli: 218.300 TL.

Bölümümüzde mevcut olan X-ışın Difraktometresi'nin sanayi araştırmaları için gerekli olan sıcaklık kontrol ünitesi ve diğer aksesuarları tamamlanmıştır.

2. Yüksek Basıncılı Sıvı Kromatografisi (HPLC)

İhale Tarihi: 03.07.2009

İhale Bedeli: 129.800 TL.



3. Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

İhale Tarihi: 03.07.2009

İhale Bedeli: 112.100 TL.

4. Görüntü Analiz Sistemi (Makroskop)

İhale Tarihi: 03.07.2009

İhale Bedeli: 59.000 TL.

5. Rheometre

İhale Tarihi: 04.2009

İhale Bedeli: 271.400 TL.

6. Klimatik Test Kabini (2 adet)

İhale Tarihi: 10.07.2009

İhale Bedeli: 179.950 TL.

7. Spektrometrik Analiz Sistemi

İnfrared Spektrometre

Raman Spektrometre

UV-Vis Spektrometre

İhale Tarihi: 16.09.2009

İhale Bedeli: 342.200 TL.

8. NMR cihazı (katı yağ içeriği ve yağ miktarı tayini için)

İhale Tarihi: 16.09.2009

İhale Bedeli: 147.500 TL.

C-Yurtdışı Seyahatler

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarının katılımıyla Avrupa'nın iki önemli Üniversitesinde bulunan Araştırma Merkezlerine gidilmiştir. Bunlar Fransa Montpellier Üniversitesi-Fransa'da bulunan Fransa Ulusal Araştırma (Montpellier SupAgro) ve Wageningen Üniversitesi-Hollanda'da bulunan Gıda Araştırmaları (Agrotech) Merkezleridir.

Merkez faaliyetlerinin yürütülmesi, sanayi projeleri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci desteği ve Bölümümüzle yapılacak araştırma işbirliği konularında görüşmeler yapılmıştır.



D-Faaliyetler

1. 2009 yılında başlanan iki sanayi projesi mevcut imkânlarla yürütülmektedir. Devam eden ve yapılacak arařtırmalarla; ürün geliştirilmesine, sanayinin ihtiyacı olan konularda yapılacak çalışmalar ve bunların sonucunda ortaya çıkacak patent oluşturulması merkezin hedefleri kapsamındadır.
2. Bölge Üniversitelerinin arařtırmalarına destek verilmektedir.
3. Yurtdışı Üniversiteler ve Arařtırma Merkezleriyle yapılacak ortak çalışmalar konusunda görüşmeler yapılmaktadır.



EKLER:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

EK-3

Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar

2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2008 Sonu Kümülatif Harcama			2009 Yılı Program Ödenek			2009 Yılı Revize Ödenek			2009 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim	6		85.113		57.289	57.289		15.450	15.450		20.291	20.291		18.342	18.342
Sağlık (*)	1		3.000		0	0		3.000	3.000		4.719	4.719		4.695	4.695
D.Kamu Hizm.	2		8.013		0	0		5.934	5.934		7.013	7.013		7.013	7.013
-İktisadi															
-Sosyal	2		4.304		0	0		5.934	5.934		7.013	7.013		7.013	7.013
TOPLAM	9	22.599	96.126		57.289	57.289		24.384	24.384		32.023	32.023		30.050	30.050

(*) Bu Projeye Döner sermaye Gelirlerinden 2.000 TL. ödenek konulmuş yıl içinde 1.719 TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 3.719 TL.'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle tamamı harcanmıştır.



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

EK-3

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2008 Sonu Kümülatif Harcama			2009 Yılı Program Ödenek			2009 Yılı Revize Ödenek			2009 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim	6		85.113		57.289	57.289		15.450	15.450		20.291	20.291		18.342	18.342
Sağlık	1		1.000		0	0		1.000	1.000		1.000	1.000		976	976
D.Kamu Hizm.	2		8.013		0	0		5.934	5.934		7.013	7.013		7.013	7.013
-İktisadi															
-Sosyal	2		4.304		0	0		5.934	5.934		7.013	7.013		7.013	7.013
TOPLAM	9	22.599	94.126		57.289	57.289		22.384	22.384		28.304	28.304		26.331	26.331



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

EK-3

Bütçe Türü: Döner Sermaye

2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2008 Sonu Kümülatif Harcama			2009 Yılı Program Ödenek			2009 Yılı Revize Ödenek			2009 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Sağlık			0		0	0		2.000	2.000		3.719	3.719		3.719	3.719
TOPLAM			0		0	0		2.000	2.000		3.719	3.719		3.719	3.719

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Hibe

2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2008 Sonu Kümülatif Harcama			2009 Yılı Program Ödenek			2009 Yılı Revize Ödenek			2009 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim			0					62	62		118	118		118	118
TOPLAM	0		0					62	62		118	118		118	118



2009 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

(DÖNEM=4)

Kuruluş Adı : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı : Eğitim

2009 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2008 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)	
5591	441,	2009H031090	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2009	Gaziantep	0,	75,	0,	0,	0,	90,					90	
5592	441,	1988H031310	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2011	Gaziantep	0,	53.000,	39.424,	0,	0,	13.518,					13.518	
5593	441,	1991H030810	Kampüs Altyapısı (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2010	Gaziantep, Nizip	0,	21.000,	15.065,	0,	0,	1.182,					1.181	
5594	441,	2009H031100	Muhtelif İşler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2009	Gaziantep	0,	4.862,	0,	0,	0,	4.746,					2.893	
5595	441,		Muhtelif İşler (GAP)	DİĞERLERİ	2009	Gaziantep	0,	0,	0,	0,	0,	62,					118	
5965	441,	2009H040120	Cenani Evi Restorasyonu (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2009	Gaziantep	0,	300,	0,	0,	0,	300,					300	
6032	441,	1992H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2010	Gaziantep	0,	3.300,	2.800,	0,	0,	455,					360	
TOPLAM							0,	82.537,	57.289,	0,	0,	20.291,						18.342



Sektör Adı :Sağlık

2009 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2008 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
4628	441,	2009I000410	Muhtelif İşler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2009	Gaziantep	0,	3.000,	0,	0,	0,	1.000,					976
4629	441,		Muhtelif İşler (GAP)	DÖNER SERMAYE	2009	Gaziantep	0,	0,	0,	0,	0,	2.000,	,+	1.719			3.719
TOPLAM							0,	3.000,	0,	0,	0,	3.000,					4.695

Sektör Adı : DKH

2009 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2008 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
6140	441,	2009K120690	Rektörlük Bilimsel Araşt. Prj. (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2009	Gaziantep	0,	4.434,	0,	0,	0,	5.513,	0				5.513
6141	441,	2009K120700	Gıda Ürünleri Arşt.Gel.Mer.(GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2010	Gaziantep	0,	2.500,	0,	0,	0,	1.500,	0				1.500
TOPLAM								6.934,		0,	0,	7.013,					7.013
