



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart-2011



İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	2
1. YÖNETİCİ ÖZETİ	2
2. GENEL DEĞERLENDİRME	5
2.1. Vizyon	5
2.2. Misyon	5
2.3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	6
2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları	8
2.5. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi	8
2.6. 2010 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	8
2.7. 2010 Yılı Yatırım Uygulamaları	11
a- Genel Yatırım Uygulama Durumu	11
b- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	12
3- 2010 YILI PROJE UYGULAMALARI	13
EKLER: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ	24



1. ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda etkili ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere çeşitli raporların hazırlanmasını ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Üniversiteler eğitim ve öğretim misyonunu yerine getirirken değişen zaman ve çağın gereksinimleri doğrultusunda, bu misyonu sürekli yenilemek ve kuvvetlendirmek zorunda olan kurumlardır. Bilgi toplumu olma sürecindeki ülkemizde, üniversiteler sürekli olarak değişim ve gelişimin rotasını belirleyen ve bunu görev edinen bir yapıyla eğitim öğretim hizmetini devam ettirmektedir. Uluslararası rekabet üstünlüğünün bilim ve teknoloji ile ölçüldüğü bir yüzyılda, 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini yaratma gayreti içerisindeki Gaziantep Üniversitesi, bir yandan çağdaş değerleri yaratma hizmetine girerken; diğer taraftan da hedef kitlesi olan öğrencilerinin iyi bir eğitim alması için tüm imkânlarını seferber etmektedir.

1987 yılında eğitim öğretime başlayan ve bölgenin önemli üniversitelerinden biri olan Gaziantep Üniversitesi, her geçen gün değişen ve büyüyen bir yapıyla öğrencilerine kaliteli bir eğitim vererek, onları Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda yetiştirmeyi gaye edinmiştir. Bu doğrultuda şekillenen Misyon ve Vizyonumuzla 2009-2013 Stratejik Planında hedeflenen 23.000 öğrenci sayısına 2010 yılı sonu itibariyle büyük oranda ulaşılmış olup öğrenci sayısındaki bu artışa paralel olarak fiziki mekan ve bu fiziki mekanların donanım ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen üniversitemiz, bu amaçla fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalışmaktadır.

Bu bağlamda; Meslek Yüksek Okulu Ek Bina, Eğitim Fakültesi C Blok, Biyoloji Ek Bina ve Amfi Tiyatro inşaatları tamamlanmış olup hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi Morfoloji ve Araban Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatlarına 2010 yılında başlanmıştır. 2011 Yılı sonunda bitirilmesi planlanan bölgenin en büyük kongre kültür merkezi binası hizmete açıldığında üniversite toplum bütünleşmesine katkı sağlayacağı gibi kongre turizmi açısından bölgemize ve komşu ülkelere hizmet verecek olup ilimizi bir çekim merkezi haline getirecektir.



Öğrenci sayısının artışına paralel olarak açık ve kapalı spor alanları yapımına hız verilmiş olup çok amaçlı Spor Kompleksi yapımına başlanmış ve 2011 Yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

Araştırma geliştirme faaliyetleri noktasında da üniversitemizde önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bu konuda disiplinler arası veya disiplinler üstü araştırmalara önem vermek, üretime yönelik araştırmalar noktasında yeni bir anlayış ortaya koymaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede sanayi ile işbirliği özellikle çok özen gösterdiğimiz ayrı bir alandır ve bu konuda Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organize Sanayi ile Sivil Toplum Kuruluşları ile çok yakın ilişkiler içerisinde bulunmaya devam etmekteyiz. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde bulunan teknoparkımız için Avrupa Birliğinden bulduğumuz yedi milyon Euro'luk projenin tamamlanması ile teknoparkımız, içinde nano teknoloji dâhil teknik laboratuvarında yer aldığı çok özel ve özgün bir hale gelecektir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesine göre hazırlanan üniversitemizin 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların bilgisine sunulmuş bulunmaktadır.

Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN
Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1.Vizyon

- Mevcut ve yeni yaratılacak kaynakların akılcı ve yerinde kullanımıyla,
- Özgüveni, saygınlığı, motivasyonu temel alan, sözde değil gerçekten katılımcı ve insan odaklı bir yönetim anlayışıyla,
- Misyonu özümsemiş akademisyen ve diğer elemanlardan kurulu; bilimsellik, karşılıklı saygı ve güven ortamına oturan, ayrımcılığın olmadığı; açıklık, aydınlık ve özgürlük zemininde ilişkilere dayalı, dünya ölçeğinde bir üniversite olmak

2.2. Misyon

- Üstün nitelikli, dürüst, bilgili, sosyal ve kültürel açıdan donanımlı, ülkenin aydınlık geleceğine katkısı olacak elemanlar yetiştiren,
- İçinde barındıracağı yüksek kaliteli akademisyen gücüyle yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte araştırmalara dayalı bilgi, teknoloji, sosyal projeler üreten, kültür ve sanata katkıda bulunan,
- Ürettiği bilgi teknolojisi, sosyal projeler, sanat ve sağlık hizmetlerini bulunduğu doku ile paylaşarak bütünleşen ve buna bağlı olarak toplumun üretime katkısını ve toplumun problemlerine dair çözümleri ateşleyen,
- Değişen, değiştiren, değişimi yöneten,
- Büyük ATATÜRK'ÜN kurduğu demokratik, laik ve sosyal devletin "Çağdaş Medeniyetin Üzerine Çıkarılması" hedefine bağlı, öncü ve lokomotif olan bir üniversite.



2.3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemizin 2009-2013 Stratejik Planında belirlenen Amaç ve Hedefler aşağıda sıralanmıştır. 2009 yılı yatırımları da bu amaç ve hedefler doğrultusunda harcanmıştır.

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Stratejik Amaç-1 Eğitim Öğretim Kalitesini Yükseltmek.	Hedef-1 Çalışanların memnuniyeti iş tatminini artırmak ve çalışanın gelişimini sağlamak.
	Hedef-2 Akademik ve idari personelin alanları ile ilgili seminer ve konferanslara katılımı sağlanacaktır.
	Hedef-3 2011 yılı sonuna kadar öğrenciler için etkili eğitim ortamları (sınıf, laboratuvar çalışma ofisleri) oluşturulacaktır.
	Hedef-4 Eğitim öğretimin daha sağlıklı, güvenli ve verimli bir ortamda sürdürülmesi
	Hedef-5 Eğitimsel personelin eğitimi çalışmalarının sürdürülmesi
	Hedef-6 Yönetimsel kadrolarda görev alan akademisyenlerin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin verilmesi
	Hedef-7 Yabancı dil eğitiminin güçlendirilmesi
	Hedef-8 Lisans ve lisansüstü eğitim – öğretimde kalitenin artırılması
	Hedef-9 Her eğitim öğretim yılından önce ders kataloglarının gözden geçirilerek ihtiyaca binaen değişikliklerin yapılması.
	Hedef-10 Kapalı Devre Radyo Televizyon Yayın Kalitesinin artırılması
	Hedef-11 Eğitimde uluslararası işbirliğinin artırılması
	Hedef-12 E-öğrenim programının başlatılması
	Hedef-13 Nitelikli öğrencilerin Gaziantep Üniversitesini tercihini sağlamak
	Hedef-14 Doktora ve Tıpta Uzmanlık sınavlarında ön sıralarda tercih edilen üniversite olmak için bu öğrencilere bir dönem yurt dışında eğitim imkânı sağlamak
	Hedef-15 Bilişim ve teknoloji eksikliklerinin tamamlanması
	Hedef-16 Bazı alanlarda bulunmayan kitap ve süreli yayınların kütüphane kaynaklarına eklenmesi;
Stratejik Amaç-2 Bilimsel Araştırma Stratejileri	Hedef-1 Ulusal ve uluslararası proje yürütme ve ortak olma girişimlerinin teşvik edilmesi
	Hedef-2 Bilimsel yayın sayısının ve kalitesinin artırılması.
	Hedef-3 Ulusal ve uluslararası konferanslara katılım ve bildiri sunma faaliyetlerinin teşvik edilmesi
	Hedef-4 Üniversitede ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların teşvik edilmesi
	Hedef-5 Sanayi ve kamu kuruluşlarınca desteklenen proje ve tez çalışmalarının artırılması
	Hedef-6 Proje hazırlama biriminin oluşturulmasıyla ilgili alt yapı çalışmalarının başlatılması
	Hedef-7 Bilimsel araştırma, tez ve altyapı projelerinin teşvik edilmesi
Stratejik Amaç-3 Toplumun Sunulan Hizmetleri Geliştirilmesi Stratejileri	Hedef-1 Araştırma ve Uygulama hastanesinin verdiği hizmetlerin geliştirilmesi ve verimliliğinin artırılması
	Hedef-2 Araştırma ve Uygulama hastanesi bünyesinde Onkoloji ve Kardiyoloji enstitülerinin kurulması.



	<p>Hedef-3: Önümüzdeki 5 yıllık süreçte; yurt dışına açılmak konusundaki çalışmalara ivme kazandırmak.</p> <p>Hedef-4 Daha nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine zemin hazırlamak</p> <p>Hedef-5 Üniversitenin tanıtım materyallerinin çeşitliliğinin ve sayısının artırılması</p> <p>Hedef-6 Üniversiteyle ilgili görsel, işitsel ve e-haber olarak olumlu haber sayısının artırılması.</p> <p>Hedef-7 Ulusal ve uluslararası tanıtım amaçlı sportif, sanatsal, kültürel etkinliklerin artırılarak sürdürülmesi</p> <p>Hedef-8 Üniversitenin paydaşlarıyla ilişkilerinin sağlam temellere dayanması ve sürekliliğinin sağlanması</p> <p>Hedef-9 Mezun öğrenciler e-sisteminin kurulması</p> <p>Hedef-10 Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi</p> <p>Hedef-11 Toplum sorunları ile ilgili merkezimizin etkinliklerinin artırılması</p> <p>Hedef-12 E-öğrenme sisteminin topluma hizmet verebilecek şekilde oluşturulması</p>
Stratejik Amaç-4 Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme	<p>Hedef-1 2008 yılında yapımına başlanan Fakülte ve Yüksekokul bina inşaatlarının tamamlanması.</p> <p>Hedef-2 Üniversitenin ihtiyaç duyduğu altyapı ve yenileme çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır.</p> <p>Hedef-3 Merkez Kampüs içerisinde bulunan eski binaların tamirat ve tadilat işlerinin tamamlanması</p> <p>Hedef-4 İhtiyaç duyulan hayvan deney laboratuvarı, oluşturulması için gerekli çalışmaların başlaması</p> <p>Hedef-5 Öğrenci ve öğretim üyesi sosyal hizmet binalarının artırılması için kaynak arama çalışmalarının yapılması.</p> <p>Hedef-6 1000 kişilik 1, 250'şer kişilik 4 adet kongre toplantı salonu bulunan kongre merkezi kurulması</p> <p>Hedef-7 Üniversitemiz öğrencilerinin sportif faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli spor alanlarının oluşturulması.</p> <p>Hedef-8 Kurulma çalışmalarına başlanması planlanan yeni fakültelerin ve bölümlerin kurulma çalışmalarına başlanması</p>
Stratejik Amaç-5 Öğrencilerin Sosyal Kültürel Ve Akademik Gelişimlerini Sağlamaya Yönelik Stratejiler	<p>Hedef-1 4-5 bin kişilik amfi tiyatro ve spor rekreasyon alanları geliştirilmesi</p> <p>Hedef-2 Öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmalık hizmetlerini etkili ve kapsamlı hale getirmek.</p> <p>Hedef-3 Öğrencilerin beslenme ulaşım ve güvenlik gibi konularda yaşam koşullarını iyileştirmek.</p> <p>Hedef-4 Öğrencilere daha fazla tiyatro sinema vb. kültürel faaliyetler düzenlemek.</p> <p>Hedef-5 Başarılı fakat maddi imkânları kısıtlı olan öğrencilere destek olunması amacıyla kısmi zamanlı olarak çalıştırılmaları.</p> <p>Hedef-6 Öğrencilerin sosyal donanımlarının artırılarak, sosyal projelere katılımının sağlanması.</p> <p>Hedef 7: Engelli öğrencilerin şartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması</p>



2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemize 2010 Bütçe Kanunu ile Yatırım projelerinin harcamaları için 24.998.000 TL. ödenek verilmiş, yıl içinde ise 8.000.000 TL. si yedek ödenekten olmak üzere toplam 10.522.000 TL. ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 35.520.000 TL.'ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 27.132.000 TL.'si yıl içinde harcanmış harcama oranı % 76 olarak gerçekleşmiştir. Bütçe kanunu ile Üniversitemize verilen 24.998 TL.'lik toplam ödeneğin 17.792 TL.'si hazine yardımı geriye kalan 7.206 TL. ise öz gelirlere oluşturmaktadır.

Ayrıca Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi makine teçhizat, taşıt alımları ve büyük onarımları için Döner Sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 2.000.000 TL. ödenek konulmuş yıl içinde bu ödeneğin 390.000 TL.'si harcanmıştır. Harcama oranı % 20 olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra Üniversitemiz Bütçesine 86.000 TL. değerinde iki adet hibe taşıt konulmuş ve yıl içinde 100.300 TL. değerinde 2 adet T2 Binek otomobil hibe alınarak hesaplara işlenmiştir.

Yatırım ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı (000 TL.)

Finans Kaynağı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı (%)
Hazine Yardımı	18.348	28.517	21.609	76
Öz Gelir	6.650	7.003	5.523	79
Öz Gelir (Döner Sermaye)	2.000	2.000	390	20
GENEL TOPLAM	24.998	35.520	27.132	76

2.5. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi

Bölgedeki üniversitelerin kurulmasında öncü rol alan Üniversitemiz, 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bağlı Makine Mühendisliği Bölümü ile başlamış ve zaman içinde hızla büyüyerek 13 fakülte, 4 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 11 araştırma ve uygulama merkezi, 5 Rektörlüğe bağlı birim, 1.142 akademik ve 812 idari personeli, 21.000'e ulaşan öğrenci sayısı ile bir bölge üniversitesi konumuna ulaşmıştır.

Üniversitemizin 2009-2013 yıllarını kapsayan Stratejik Planında, 2008-2009 Eğitim Öğretim döneminde 13.357 olan öğrenci sayısının 2013 yılı sonuna kadar 24.000'e ulaşacağı hedeflenmiş bu hedef doğrultusunda 2010/2011 yılı Eğitim Öğretim döneminde öğrenci sayımızın son yapılan kayıtlarla birlikte 17.110'dan 21.000'e çıkmıştır. Bu da öğrenci sayımızda önemli bir artış meydana getirmiştir.



Öğrencilerimiz için sosyo-kültürel imkânların artırılması amacıyla 3.500 kişilik amfi tiyatronun inşaatı tamamlanmış ayrıca 2.000 kişilik yeni ve modern bir yurt binası, kapalı yüzme havuzu ve kongre kültür merkezi inşaatlarının kısa sürede başlanarak hizmete alınması planlanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle ilişkilerimiz artırılarak Suriye’den öğrenci kabul edilmiş ayrıca Suriye Halep Üniversitesi ile sağlık, mutfak, mimari, eğitim alanlarında yoğun bir işbirliği dönemi içerisine girmiş bulunmaktayız.

Sağlık açısından baktığımızda da; artık üniversitemiz hem tıp eğitimi açısından hem de verdiğimiz sağlık hizmeti açısından Türkiye’nin en yetkin Üniversitelerinden biridir. Üniversitemiz sağlık hizmetlerini; teknolojik açıdan gelişmiş, modern araç gereçlerle donatılmış 925 yatak kapasitesine ulaşmış olan Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi aracılığıyla sunarak, çevre il ve komşu ülkelerden yoğun hasta kabul etmektedir. Hastanemiz bünyesinde en son olarak da transplantasyon (organ nakli) konusunda büyük adımlar atılarak 2009 yılında Karaciğer nakli programına başlanmış, böbrek ve kalp nakilleri gerçekleştirilmiştir. Kulak Burun Boğaz İmplant ve Kemik İliği Nakil programı da devam etmektedir.

Ayrıca Ulusal Kanser Derneği’nin ilimizde yaptırdığı 110 yatak kapasiteli Onkoloji Hastanesi, 49 yıllığına kiralanarak hasta kabulüne başlamıştır. Onkoloji Hastanesi Medikal ve Radyasyon Onkoloji üniteleri, Nükleer Tıp İyot Tedavi üniteleri ile bölgemizdeki tek merkez konumundadır. Hastanemize komşu ülkeler olan Suriye ve İraktan da hasta kabulü yapılmaktadır. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde günlük 2.000 dolayında polklinik hizmeti, yılda 45.000’in üzerinde ameliyat yapılmaktadır. Hastanemizdeki hızlı gelişme ve yatak kapasitesindeki artış beraberinde tıbbi cihaz talebini ve model ve kullanım olarak devre dışı kalan cihazların yenilenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Hastanemizin ihtiyaç duyduğu eksik cihazların temin edilmesiyle hizmet kalitesindeki artış daha da belirginleşecektir.

Araştırma geliştirme faaliyetleri noktasında da üniversitemizde önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bu konuda disiplinler arası veya disiplinler üstü araştırmalara önem vermek, üretime yönelik araştırmalar noktasında yeni bir anlayış ortaya koymaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede sanayi ile işbirliği özellikle çok özen gösterdiğimiz ayrı bir alandır ve bu konuda Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organize Sanayi ile Sivil Toplum Kuruluşları ile çok yakın ilişkiler içerisinde bulunmaya devam etmekteyiz. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde bulunan teknoparkımız için Avrupa Birliğinden bulduğumuz yedi milyon Euro’luk projenin tamamlanması ile teknoparkımız, içinde nano teknoloji dâhil teknik laboratuvarında yer aldığı çok özel ve özgün bir hale gelecektir.



Toplumla bütünleşme noktasında da üniversitemizde yeni bir anlayış geliştirilmiş bu kapsamda Üniversitemizde son bir yıl içerisinde topluma yönelik kültürel ve sanatsal etkinliklerde önemli artışlar meydana gelmiştir. Toplumla bütünleşme noktasında bir diğer önemli adım ise Üniversitemizde 2009/2010 eğitim-öğretim yılından itibaren hayata geçirdiğimiz Toplumsal Duyarlılık projeleridir. Bu kapsamda Üniversiteye giren her öğrencinin bir toplumsal duyarlılık projesinde yer almasının öğrencilerin toplumla bütünleşme sürecini daha da hızlandıracağını düşünmekteyiz

2.6. 2010 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemizin 2009-2013 yıllarını kapsayan Stratejik Planında, 2013 yılı sonuna kadar öğrenci sayısının 24.000'e ulaşacağı hedeflenmiş bu hedef doğrultusunda 2010/2011 yılı Eğitim Öğretim döneminde yapılan kayıtlarla öğrenci sayımız yaklaşık 21.000'e ulaşmıştır. Yapılan son öğrenci alımlarıyla stratejik plandaki hedefe yaklaşmış bulunmaktayız. Öğrenci sayısındaki artış doğal olarak derslik, sportif ve sosyal alan ihtiyacını doğurmuştur. Bu eksiklikleri gidermek ve öğrencilerimiz için sosyo-kültürel imkânların artırılması amacıyla 3.500 kişilik amfi tiyatronun inşaatı tamamlanmış ayrıca 2.000 kişilik yeni ve modern bir yurt binası, spor kompleksi ve kongre kültür merkezi inşaatlarının 2011 yılında tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır.

Ayrıca 2010 yılında mevcut 10 fakülteye ilave olarak 4 yeni fakülte kurulmuş ve fakülte sayımız 14 olmuştur. Aynı dönemde (2010 yılında) Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu ve Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı İslahiye Meslek yüksekokulu Üniversitemize bağlı aynı isimde İslahiye de faaliyet Meslek yüksekokulumuzla birleştirilerek üniversitemize devredilmiştir.

Ayrıca Üniversitemiz inşaatlarının yapımı için Merkezi Derslik ve İdari Binalar Projesine verilen ödenek öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak ihtiyaç duyulan derslik ve idari binaların yapımında kullanılmaktadır. Bu proje kapsamında 2010 yılında devam eden ve biten inşaatlar aşağıda belirtilmiştir.



Tamamlanan İnşaatlar

Tamamlanan İnşaatın Adı	Tamamlanma Tarihi	Kapalı Alanı (m ²)
1- Meslek Yüksek Okulu Ek Bina	11.10.2010	4.000
2- Eğitim Fakültesi C Blok	08.11.2010	3.500
3- Biyoloji Ek Bina	30.12.2010	825
4- Amfi Tiyatro (3.500 kişilik)		750
Toplam		9.075 m2

Devam Eden İnşaatlar

Devam Eden İnşaatın Adı	Sözleşmeye Göre İş Bitirme Tarihi	Kapalı Alanı (m ²)
Diş Hekimliği Fakültesi	29.01.2012	16.500
Kongre Kültür merkezi	30.10.2012	17.000
Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	20.12.2012	14.400
Atölye Binaları	30.07.2011	3.600
Araban Meslek Yüksekokulu İnşaatı	08.10.2011	3.600
Spor Kompleksi İnşaatı	04.11.2012	7.600
Toplam Kapalı Alan		62.700

Diğer Tamamlanan İnşaatlar

Yapılan İşin Adı
I Nolu Çevre Tanzimi İnşaatı
Cenani Konağı Onarımı Ve Restorasyonu İnşaatı
Mevcut Mekanlarda Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri
Laboratuar Mekanları Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri
Çatı Onarım, Yenileme İşleri
Kütüphane Mekanı Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri

2.7. 2010 Yılı Yatırım Uygulamaları

a- Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2010 yılı Bütçe kanunu ile Yatırım projelerinin harcamaları için 24.998.000 TL. ödenek verilmiş 8.000.000 TL. si yedek ödenekten olmak üzere toplam 10.522.000 TL. ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 35.520.000 TL.'ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 27.132.000 TL.'si harcanmış ve harcama oranı %76 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemizin Hastane Büyük Onarım ve Makine Teçhizat Projesine için kaynağı döner sermaye olmak üzere bütçeye 2.000.000 TL. ödenek konulmuş olup yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 390.000 TL.'si harcanmıştır.

Ayrıca 2009 yılı bütçemize 86.000 TL. değerinde 2 adet T2 hibe Binek Otomobil konulmuş, ancak yıl içinde bedel artışı neticesinde bir adet 100.300 TL. değerinde 2 adet T2 hibe Binek Otomobil hibe alınarak hesaplara işlenmiştir.



Yatırım Projelerinin Sektörel Bazda Dağılımı ve Harcama Durumu

Sektör Adı	Proje Sayısı	Bütçe Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı (%)
Eğitim	6	19.292	29.814	21.426	72
Sağlık (*)	1	2.000	2.000	390	20
DKH.	3	5.706	5.706	5.706	100
Genel Toplam	10	24.998	35.520	27.132	76

Yatırımlardan Tamamlanan/Bitenlerin Projelerin Durumu

Sektör Adı	Proje Sayısı	Bütçe Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı (%)
Devam Eden Projeler	5	16.142	24.342	16.441	68
Tamamlanan Projeler (*)	5	10.856	13.178	10.991	96
Genel Toplam	10	24.998	35.520	27.132	76

b- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- ✚ Maliye Bakanlığının yatırım tavanlarını belirlenmesi sürecinde kurumlarla görüşmesi ve tavanların belirlenmesinde objektif kriterlerin ortaya konulması büyük önem arz etmektedir. Ancak şimdiye kadar kurumlardan görüş alınmadan tavanların belirlenmesi kurumların yatırımlarla ilgili hedeflediklerinde sapmalara neden olmaktadır.
- ✚ Kurumumuz yatırım ödenekleri Orta Vadeli Mali Plan ile belirlenen ödenek tavanları ile sınırlı tutulduğundan üniversitemiz yatırımlarının süreleri uzamakta ve inşaatlarımız programlanan sürelerde bitirilememektedir.
- ✚ Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve mevsimsel şartlar Maliye Bakanlığınca göz önüne alınır ve buna göre oranlar verilirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir.
- ✚ Ayrıntılı Finans Programının ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyi yerine birinci düzeyinde hazırlanması, 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine uygun olacaktır.



3- 2010 YILI PROJE UYGULAMALARI

2010 yılı yatırım programında 10 adet projemiz bulunmaktadır. Başlangıç ödenekleri 24.98.000 TL. olan ve yıl içinde yapılan eklemelerle 35.520.000 TL.'lik ödeneye ulaşmış ve bu projelerin yıl sonu itibariyle 27.132.000 TL.'si harcanmıştır. Yatırım projelerimizin 6'sı eğitim, 3'ü Diğer Kamu Hizmetlerinde (DKH) 1'i ise sağlık sektöründe yer almaktadır. Aşağıda bu projelerin uygulamaları belirtilmiştir.

3.1-PROJE NO : 2010H030850
PROJE ADI : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP)
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2010-2010

Bu projeye 2010 Yılı Bütçe Kanunu ile 100.000 TL. ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde 107.000 TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 207.000 TL.'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 206.913 TL.'si harcanmıştır.

Harcanan bu ödenek ile merkez kampusu içerisinde yapılması öngörülen 16.000 m² kapalı alanlı Kongre ve Kültür Merkezi binası statik, tesisat ve mimari, 7.000 m² kapalı alanlı Spor Kompleksi inşaatı statik, tesisat ve mimari, 16.000 m² kapalı alanlı Temel Tıp Bilimleri inşaatı statik, tesisat ve mimari proje bedelleri karşılanmıştır.

3.2-PROJE NO : 1988H031310
PROJE ADI : Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 1988-2013

Bu projeye 2010 Yılı Bütçe Kanunu ile 11.892.000 TL. ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde 7.000.000 TL. yedek ödenekten 700.000 TL. ise öz gelirden eklenerek yıl sonu itibariyle toplam ödenek 19.592.000 TL. olmuştur. 2010 yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 12.879.000 TL.'si harcanmıştır. Harcanan bu ödenek ile aşağıdaki işler yapılmıştır.

2009 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan, 3.655 m² açık amfi binası inşaatı 13.09.2010 tarihinde, 3.845 m² kapalı alanlı Eğitim Fakültesi (C Blok) binası inşaatı 08.12.2010'da 5.200 m² kapalı alanlı Meslek Yüksek Okulu Binası inşaatı 15.11.2010 tarihinde tamamlanarak hizmete açılmıştır. Bunun yanı sıra 2010 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan, 1.100 m² kapalı alanlı Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ek Binası inşaatı 29.12.2010 tarihinde tamamlanarak hizmete açılmıştır. Ayrıca bu projeden Diş hekimliği Fakültesi için 4.246.910 TL. ödenek harcanarak Diş Hekimliği Fakültesi Binası % 50 oranında tamamlanmıştır.

Aynı proje içerisinde yer alan Merkezi Derslik Donanım projesinde daha önce hizmete alınmış Fakültelerin ve Yüksek Okulların donanımları ihaleler yapılarak sonuçlandırılmış, malzemeler teslim alınarak ilgili birimlere teslim edilmiştir. Bu proje kapsamından biten ve devam eden inşaatlar belirtilmiştir.



BİTEN PROJELER

İŞİN ADI	AÇIK AMFİ BİNASI İNŞAATI
İHALE BEDELİ	2.178.779,14-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	21.12.2009
BİTİŞ TARİHİ	13.09.2010
TOPLAM KAPALI ALAN	3655 m ²
AÇIKLAMA	750 m ² Gösteri Hazırlık Binası, 300 m ² Sahne Platformu, 2605 m ² Seyirci Platformu ve Alışveriş Alanları



İŞİN ADI	MESLEK YÜKSEKOKULU EK BİNA İNŞAATI
İHALE BEDELİ	2.265.859,60-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	16.12.2009
BİTİŞ TARİHİ	12.11.2010
TOPLAM KAPALI ALAN	5.200 m ²
AÇIKLAMA	52 Ad. Ofis, 20 Ad. Derslik, 2 Ad. Çizim Salonu, 9 Ad. Laboratuar





İŞİN ADI	EĞİTİM FAKÜLTESİ C BLOK BİNASI İNŞAATI
İHALE BEDELİ	1.960.061,80-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	23.12.2009
BİTİŞ TARİHİ	08.11.2010
TOPLAM KAPALI ALAN	3645 m ²
AÇIKLAMA	7 Ad. Laboratuvar, 7 Ad. Müzik Çalışma Odası, 1 Ad. 250 Kişilik Amfi, 1 Adet Resim Atölyesi, 16 Ad. Derslik, 3 Adet Kafeterya



İŞİN ADI	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ EK BİNASI İNŞAATI
İHALE BEDELİ	540.982,80-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	07.09.2010
BİTİŞ TARİHİ	15.12.2010
TOPLAM KAPALI ALAN	1.100 m ²
AÇIKLAMA	2 Ad. Derslik, 6 Ad. Laboratuvar, 9 Ad. Ofis Ve 1Ad. Toplantı Salonu





DEVAM EDEN PROJELER

İŞİN ADI	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNASI İNŞAATI
İHALE BEDELİ	9.912.000,000-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	01.03.2010
BİTİŞ TARİHİ	29.01.2012
TOPLAM KAPALI ALAN	16.500 m ²
AÇIKLAMA	9 Ad. Toplantı Salonu, 42 Ad. Ofis, 12 Ad. Klinik, 7 Ad. Sterilizasyon, 7 Ad. Ameliyathane 7 Ad. Özel Muayene, 2 Ad. Bilgisayar Odası, 5 Ad. Röntgen Odası



İŞİN ADI	KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI İNŞAATI
İHALE BEDELİ	15.640.900,00-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	01.12.2010
BİTİŞ TARİHİ	30.10.2012
TOPLAM KAPALI ALAN	16.000 m ²
AÇIKLAMA	1 Ad. Çok Amaçlı Salon, 3 Ad. Konferans Salonu, 4 Ad. Dans Atölyesi, 2 Ad. Prova Odası Ve 9 Ad. Çalıştay Odası





İŞİN ADI	TEMEL TIP BİLİMLERİ BİNASI İNŞAATI
İHALE BEDELİ	8.478.300,00-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	11.01.2011
BİTİŞ TARİHİ	10.12.2012
TOPLAM KAPALI ALAN	15.000 m ²
AÇIKLAMA	3 Ad. Amfi, 14 Ad. Derslik, 32 Ad. Laboratuar, 60 Ad. Ofis, 4ad. Seminer Salonu, 1 Ad. Kütüphane, 1 Ad. Sergi Salonu, 1 Ad. İnternet Salonu



İŞİN ADI	ARABAN MESLEK YÜKSEKOKULU BİNASI İNŞAATI
İHALE BEDELİ	1.469.100,00-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	13.12.2010
BİTİŞ TARİHİ	08.10.2011
TOPLAM KAPALI ALAN	5.200 m ²
AÇIKLAMA	52 Ad. Ofis, 20 Ad. Derslik, 2 Ad. Çizim Salonu, 9 Ad. Laboratuar



İŞİN ADI	YAPI İŞLERİ ATÖLYELERİ BİNALARI İNŞAATI
İHALE BEDELİ	1.614.240,00-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	3.12.2010
BİTİŞ TARİHİ	30.07.2011
TOPLAM KAPALI ALAN	3.800 m ²
AÇIKLAMA	4 Ad. Atölye Binası, 10 Ad. Teknik Ofis, 4 Ad. Takımhane, 6 Ad. Depo



3.3-PROJE NO : 1991H030810
PROJE ADI : Kampüs Altyapısı (GAP)
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 1991-2013

Bu projeye 2010 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 1.500.000 TL. verilmiş olup yıl içinde yedek ödenekten 500.000 TL. ödenek aktarılmış ve toplam ödenek 2.000.000 TL.'ye ulaşılmıştır. 2010 yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 1.656.270 TL.' si harcanmıştır. Harcanan 1.656.270 TL. ödenek ile aşağıdaki işler yapılmıştır.

Kampus içerisinde ısınma amaçlı kullanılan mevcut ısı merkezinin Isı Merkezi ve Eşanjör daireleri tadilatı ihalesi yapılarak sonuçlandırılmış, 2010 yılı içinde tamamlanarak hizmete alınmıştır. Kampus Telefon ve Pis Su hattı ihalesi yapılarak sonuçlandırılmış, 2010 yılı içinde tamamlanarak hizmete alınmıştır. Kampus 1. nolu çevre tanzimi ihalesi yapılarak tamamlanmıştır. Kampus Giriş Kapısı ve Kampus 2 nolu çevre tanzim ihalesi yapılmış olup yapımları devam etmektedir.

Ayrıca Nizip MYO. telefon hattı yapımı, Taşıt Yakıt Deposu üstünün kapatılması ve Atatürk Büstü ışıklandırılması işleri bu proje kapsamında ancak doğrudan temin usulü ile tamamlanmıştır.



İŞİN ADI	I NOLU ÇEVRE TANZİMİ İNŞAATI
İHALE BEDELİ	606.777,48-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	31.05.2010
BİTİŞ TARİHİ	21.10.2010
TOPLAM AÇIK ALAN	23.000 m ²
AÇIKLAMA	Çimleme, oturma grupları, yürüme yolları, satranç alanı, ağaçlandırma



3.4-PROJE NO : 2009H040120
PROJE ADI : Cenani Evi Restorasyonu
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2009-2010

Bu projeye 2010 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 300.000 TL. ödenek verilmiştir. verilen bu ödenek 2009 yılında ihalesi yapılan Cenani Evi Restorasyon işinin 160.651 TL. lik hakedişleri ödenmiş ve proje kapsamında bir adet konağın restorasyonu tamamlanmış diğer konağın restorasyon ihalesi ise 2011 yılında yapılacaktır.

İŞİN ADI	CENANİ KONAĞI ONARIMI ve RESTORASYONU İNŞAATI
İHALE BEDELİ	387.394,00-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	23.11.2009
BİTİŞ TARİHİ	20.08.2010
TOPLAM KAPALI ALAN	500 m ²



3.5- PROJE NO : 1992H050160
PROJE ADI : Açık Kapalı Spor Tesisleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2009-2010

Bu projeye 2010 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 1.500.000 TL. ödenek verilmiştir. Proje kapsamında 7.000 m² kapalı alanlı Spor Kompleksi inşaatının ihalesi yapılmış ve bu kapsamda 794.730 TL. ödenek harcanmıştır. Kompleksin 2012 yılı içerisinde bitirilmesi düşünülmektedir.

İŞİN ADI	SPOR KOMPLEKS BİNASI İNŞAATI
İHALE BEDELİ	8.980.000,00-TL
BAŞLANGIÇ TARİHİ	07.12.2010
BİTİŞ TARİHİ	04.11.2012
TOPLAM KAPALI ALAN	7.600 m ²
AÇIKLAMA	Yarı Olimpik Havuz, Çok Amaçlı Salon (Basketbol, Hentbol, Vb), Bowling, Buz Pateni



3.6- PROJE NO : 2010H030860
PROJE ADI : Muhtelif İşler
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2010-2010

2010 Yılı Bütçe Kanunu ile bu projeye hazine yardımından 4.000.000 TL. ödenek verilmiş olup bu ödeneye, öz gelirlerden 2.215.230 TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 6.215.230 TL.'ye ulaşılmıştır. 2010 yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 5.728.075 TL. harcanmıştır. Harcanan ödenek ile aşağıdaki işler yapılmıştır.

1. Bina Büyük Onarımları: 2010 yılı bütçesine bu tertibe 2.200.000 TL. ödenek konulmuş olup yıl içinde bu ödeneye 549.000 TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 2.749.000 TL. olmuştur. Bu ödenek ile aşağıdaki işler yapılmıştır. Büyük Onarım projesi ihalesi kapsamında Meslek Yüksekokulu Laboratuvar, Makine Mühendisliği Binası, Fen Edebiyat Fakültesi, Merkezi Derslik Binası, Nurdağı Meslek Yüksekokulu, Nizip Meslek Yüksekokulu, İslahiye Meslek Yüksekokulu, Araban Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi Meslek Yüksekokuluna ait spor Salonu ve Kütüphane Binası, Fizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği Laboratuvarları binaları onarımı ve tamirat işleri tamamlanmıştır.



2. **Makine Teçhizat ve Bilgisayar Alımları:** 2010 yılı bütçesine bu tertibe 1.400.000 TL. ödenek konulmuş olup yıl içinde bu ödeneğe 1.666.230 TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 3.066.230 TL. olmuştur. Bu ödenek ile Üniversitemiz harcama birimlerinin ihtiyacı olan 2.503.424 TL. makine teçhizat ve 556.185 TL. Bilgisayar alımı yapılmıştır.
3. **Kütüphane Yayın Alımları:** 2010 yılı bütçesine bu tertibe 400.000 TL. ödenek konulmuştur. Verilen bu ödenek ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 566'ı yabancı olmak üzere toplam 2009 adet kitap, 105 adet DVD, 35 adet Türkçe süreli yayın, 17 adet veri tabanı için toplam 398.865 TL. harcama yapılmıştır.

3.7- PROJE NO : 2009K120700
PROJE ADI : Gıda Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (GAP)
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2009-2010

Bu projeye 2010 yılı Bütçe Kanunu ile 950.000 TL. ödenek verilmiş olup anılan ödeneğin tamamı yıl içersinde proje özel hesabına aktarılmıştır. Proje özel hesabından 2010 yılında 680.933,58 TL. harcanmıştır.



Proje Kapsamında Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Proje teklifinde belirtilen cihazlar Gıda Sanayi ile yapılan görüşmeler ve proje ekibi ile yapılan toplantılarda detaylı olarak incelenerek, üretime ve üretim sonrası araştırmalara yönelik cihazların alınmasına karar verilmiştir. 2009 yılı

bütçe harcamaları analitik ölçüm cihazlarına, 2010 yılı bütçe harcamaları ise diğer analitik ve üretim cihazlarına ayrılmıştır. Bu nedenle araştırmalarda en çok önemli ve ihtiyaç duyulan cihazların alımına öncelik verilmiştir. Bazı cihazların sanayide yaygın olarak bulunmasından ve bazılarının ise maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle alımlarından vazgeçilmiştir. Gıda Mühendisliği ek pilot tesis binası (3 laboratuvar analitik ölçüm cihazları ve 2 laboratuvar pilot üretim cihazları) cihazların yerleştirilmesi için kullanılmaktadır.

1. 2009 yılında başlanan iki sanayi projesinden biri tamamlanmış ve diğeri mevcut imkanlarla yürütülmektedir. Devam eden ve yapılacak araştırmalarla; ürün geliştirilmesine, sanayinin ihtiyacı olan konularda yapılacak çalışmalar ve bunların sonucunda ortaya çıkacak patent oluşturulması merkezin hedefleri kapsamındadır.

2. 2010 yılı sonunda kabul edilen bir SAN-TEZ projesi Nisan 2011 tarihinde başlayacaktır



3. İki Yüksek Lisans öğrencisi tez çalışmalarını tamamlamış ve 2 Doktora öğrencisi Merkez imkanlarını kullanarak çalışmalarına devam etmektedir. Üniversitemiz Gıda Mühendisliği, Biyoloji ve Kimya Bölümleri Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin ve araştırmacıların çalışmaları merkezde yürütülmektedir.

4. Bölge Üniversitelerinden gelen Araştırmacı, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin çalışmalarına destek verilmektedir.

5. Yurtdışı Üniversiteler ve Araştırma Merkezleriyle yapılacak ortak çalışmalar, araştırma amaçlı akademisyen ve öğrenci değişimi konusunda görüşmeler yapılmaktadır.

3.8- PROJE NO : 2010K120910

PROJE ADI : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (GAP)

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2010-2010

Bu projeye 2010 yılı Bütçe Kanunu ile 4.656.000 TL. ödenek verilmiş olup anılan ödeneğin tamamı yıl içerisinde proje özel hesabına aktarılmıştır. Anılan ödenek ile toplam 171 projeye destek verilmiştir. Söz konusu projenin bütçesi ile bu proje için yapılan harcamalar aşağıda tablolar halinde belirtilmiştir

Üniversitemizdeki Bilimsel Araştırma Projelerinin Ödeneği ve Harcama Durumu

EKONOMİK KOD:		ÖDENEĞİ	ÖZEL HESABA AKTARILAN	HARCAMA
03.2	TÜKETİM YÖNELİK MAL VE MALZ. ALIMLARI	311.050,00	311.050,00	614.760,40
03.3	YOLLUKLAR	50.000,00	50.000,00	59.116,61
03.5	HİZMET ALIMLARI	43.000,00	43.000,00	128.908,24
03.7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	28.000,00	28.000,00	48.203,22
(03) TOPLAM		432.050,00	432.050,00	850.988,47
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	3.650.000,00	3.650.000,00	972.505,29
06.2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	896.000,00	896.000,00	
06.9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	110.000,00	110.000,00	
(06) TOPLAM		4.656.000,00	4.656.000,00	972.505,29
GENEL TOPLAM		5.088.050,00	5.088.050,00	1.823.493,76

2010 yılı itibariyle Üniversitemizdeki Bilimsel Araştırma Projeleri


ADI:	ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEDEN PROJE SAYISI	2010 YILI İÇİNDE EKLENEN	TOPLAM	YIL İÇİNDE TAMAMLANAN PROJE	2010 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ (TL.)
BAP	107	64	171	46	4.656.000



Üniversitemizdeki Bilimsel Araştırma Projelerinin Birimlere Dağılımı

BÖLÜMÜ	KAPSAMLI A.P.	ALTYAPI PR.	KATILIMLI A.P.	YÜK. LİS. TEZİ A.P.	DOKTORA TEZİ	DESTEK PR.
Tıp Fakültesi	4	2	1	6	18	
Mühendislik Fakültesi	2		1	4	4	1
Fen Edebiyat Fakültesi	6	1		5	1	
Diş Hekimliği Fakültesi	2					
İktisadi ve İdari Bil.Fak.						
Meslek Yüksekokulu	1				1	
Rektörlük		1				3
Eğitim Fakültesi						
TOPLAM	15	4	2	15	24	4

Üniversitemizdeki Bilimsel Araştırma Projelerinin Türlerine Göre Dağılımı

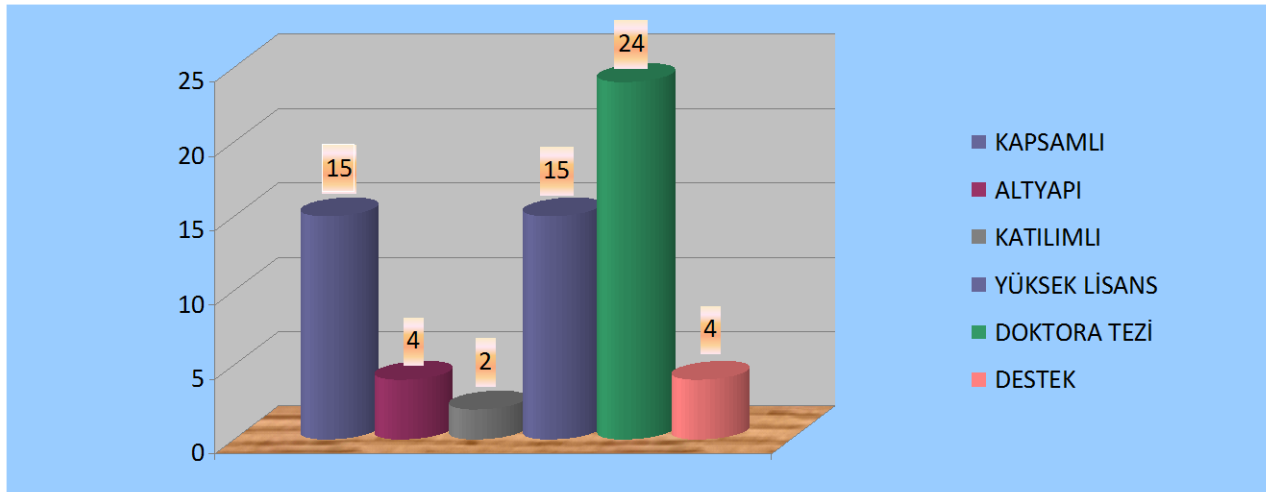

3.9- PROJE NO : 2010K120510

PROJE ADI : Merkezi Araştırma Laboratuvarı (GAP)

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2010-2010

Bu projeye 2010 yılı Bütçe Kanunu ile 100.000 TL. ödenek verilmiş olup anılan ödeneğin tamamı yıl içerisinde proje özel hesabına aktarılmıştır. Anılan ödenek ile üniversitemizde yapılacak merkezi araştırma laboratuvarının projesi yapılmış ve bu iş için 40.474 TL. harcanmıştır.

3.10- PROJE NO : 2010I000370

PROJE ADI : Muhtelif İşler (GAP)

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2010-2010

Üniversitemizin 2010 yılı yatırım programında, Hastane Makine Techizat ve Büyük Onarımlarında kullanılmak amacıyla kaynağı Döner Sermayeden olmak üzere 2.000.000 TL. ödenek konulmuş yılsonu itibariyle bu ödeneğin 390.000 TL.'si harcanmıştır. Söz konusu ödenek Hastane Büyük Onarımlarında kullanılmıştır.



EKLER:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

EK-3

Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar

2010 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2009 Sonu Kümülatif Harcama			2010 Yılı Program Ödenek			2010 Yılı Revize Ödenek			2010 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim	6		87.200		60.102	60.102		19.292	19.292		29.814	29.814		21.426	21.426
Sağlık	1							2.000	2.000		2.000	2.000		390	390
D.Kamu Hizm.	3		7.286		1.580	1.580		5.706	5.706		5.706	5.706		5.706	5.706
<i>-İktisadi</i>															
<i>-Sosyal</i>	3		7.286		1.580	1.580		5.706	5.706		5.706	5.706		5.706	5.706
TOPLAM	10		94.486		61.682	61.682		24.998	24.998		35.520	35.520		27.132	27.132

(*) Bu Projeye Döner sermaye Gelirlerinden 2.000 TL. ödenek konulmuş ve bütçe toplamına dahil edilmemiştir Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 390 TL. si harcanmıştır



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

EK-3

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2010 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2009 Sonu Kümülatif Harcama			2010 Yılı Program Ödenek			2010 Yılı Revize Ödenek			2010 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim	6		87.200		60.102	60.102		19.292	19.292		29.814	29.814		21.426	21.426
D.Kamu Hizm.	3		7.286		1.580	1.580		5.706	5.706		5.706	5.706		5.706	5.706
<i>-İktisadi</i>															
<i>-Sosyal</i>	3		7.286		1.580	1.580		5.706	5.706		5.706	5.706		5.706	5.706
TOPLAM	9		94.486		61.682	61.682		24.998	24.998		35.520	35.520		27.132	27.132



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

EK-3

Bütçe Türü: Döner Sermaye

2010 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2009 Sonu Kümülatif Harcama			2010 Yılı Program Ödenek			2010 Yılı Revize Ödenek			2010 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Sağlık	1		0		0	0		2.000	2.000		2.000	2.000		390	390
TOPLAM			0		0	0		2.000	2.000		2.000	2.000		390	390

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Hibe

2010 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2009 Sonu Kümülatif Harcama			2010 Yılı Program Ödenek			2010 Yılı Revize Ödenek			2010 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim								86	86		100	100		100	100
TOPLAM								86	86		100	100		100	100



2010 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

(DÖNEM=4)

Kuruluş Adı : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı : Eğitim

2010 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2009 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Toplam (18)
5591	441,	2010H030850	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2010	Gaziantep	0,	100,		220,	,-	13,	207
5592	441,	1988H031310	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) (1)	ÖZEL BÜTÇE	2012	Gaziantep	0,	55.000,	41.354,	12.092,	,+	7.500	12.879
5593	441,	1991H030810	Kampüs Altyapısı (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2011	Gaziantep, Nizip	0,	21.000,	15.298,	1.500,	,+	500	1.656
5594	441,	2010H030860	Muhtelif İşler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2010	Gaziantep	0,	4.000,		4.853,	,+	1.362,	5.728
5595	441,		Muhtelif İşler (GAP)	DiĞERLERİ	2010	Gaziantep	0,	86,		86,			100
5965	441,	2009H040120	Cenani Evi Restorasyonu	ÖZEL BÜTÇE	2010	Gaziantep	0,	600,	300,	300,			161
6032	441,	1992H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2011	Gaziantep	0,	6.500,	3.150,	1.500,			795
TOPLAM							0,	87.200,	60.102,	20.465,		9.349,	21.426,



Sektör Adı : Sağlık

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2009 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Toplam (18)
4629	441,	2010I000370	Muhtelif İşler (GAP)	DÖNER SERMAYE	2010	Gaziantep	0,	0,		2.000,			390
TOPLAM							0,	0,	0,	2.000,			390

Sektör Adı : DKH.

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2009 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Toplam (18)
6140	441,	2010K120910	Rektörlük Bilimsel Araşt. Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2010	Gaziantep	0,	4.656,		4.656,			4.656,
6141	441,	2010K120700	Gıda Ürünleri Arşt.Gel.Merkezi	ÖZEL BÜTÇE	2010	Gaziantep	0,	2.530,	1.580,	950,			950,
6141	441,	2010K121510	Merkezi Araştırma Lab.	ÖZEL BÜTÇE	2010	Gaziantep	0,	100,		100,			100,
TOPLAM								7.286,	1.580,	5.706,			5.706,
