



**T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**

**2016 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Şubat - 2017



T.C

GAZIANTEP ÜNİVERSİTESİ

**2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

Şubat-2017

ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ



Gaziantep Üniversitesi, geçtiğimiz yıllar içerisinde önemli gelişmeler kaydederek ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında yer almıştır. Üniversitemiz bundan sonra da kentiyle kucaklaşan, sanayicisiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, her kesimle buluşan bir üniversite olma ilkesinden asla taviz vermeden, kaliteli bir şekilde büyümeye devam edecektir. Üniversitemiz; Türkçe, İngilizce ve Arapça eğitim veren Ülkemizdeki tek üniversite olmasının yanında, 107 ülkeden yaklaşık

3.700 yabancı uyruklu öğrencisi ile çok renkli, çok kültürlü, çok dinli ve çok dilli, huzurlu bir üniversitedir. Yabancı öğrencilerimizle birlikte öğrenci sayımız 50.000'i aşmış bulunmaktadır.

Kaliteli büyüme hedefiyle yoluna devam edecek olan Üniversitemizin; Eğitim Sektöründe 5, Sağlık Sektöründe 2, Spor Sektöründe 1, Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe ise 2 olmak üzere toplam 10 adet yatırım projesi yürütülmüştür. Söz konusu projelere, bütçe kanunu ile verilen ödeneklere ilave olarak yıl içinde likit kaynaklarımızdan 21.043.250 ₺ ödenek eklemiştir. Bu projelere hazine yardımı ve likit karşılığı kaydedilen ödeneklerden 46.874.389,47 ₺, öz gelirden 14.022.659,39 ₺ olmak üzere toplamda 60.897.048,86 ₺ harcama yapılmıştır. Yapılan harcamalar sonucunda kapalı alanı 4.426 m² olan 3 adet inşaat tamamlanarak hizmete açılmış olup, kapalı alanı 26.547 m² olan 3 adet inşaatın ise 2017 yılının ortalarına doğru tamamlanması planlanmaktadır.

Ayrıca Üniversitemizin son yıllarda öğrenci sayısındaki artışlar neticesinde; başta personel ve öğrencilerimizin yanı sıra şehirde bulunan diğer üniversite öğrencileri ile üniversiteye hazırlanan öğrencilerin de faydalanacağı 27.000 m² kapalı alana sahip modern bir kütüphane binasına ihtiyaç duyulmuştur. Merkez yerleşkede yapılması planlanan kütüphane binası; aynı anda 3.500-4.000 öğrenciye 7/24 saat esasına göre hizmet verebilecek içerisinde sosyal donatıların olduğu bir yaşam alanı olarak planlanmış ve proje, yatırım programına alınması için Kalkınma Bakanlığına teklif edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25. maddesi gereği Üniversitemiz yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmek üzere 2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Ali GÜR
Rektör

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ.....	iii
İÇİNDEKİLER	iv
ŞEKİLLER TABLOSU	vi
GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
1. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri.....	2
2. Yatırımların Finansman Kaynakları	4
3. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi	4
4. 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	6
5. 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	7
5.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	7
5.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	9
6. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	10
6.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ	10
6.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	10
6.1.2. Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	11
6.1.3. Kampüs Altyapısı (GAP)	19
6.1.4. Muhtelif İşler (GAP).....	20
6.1.4.1. Makine ve Teçhizat, Bilgisayar, Donanım ve Taşıt Alımları	20
6.1.4.2. Bina Büyük Onarımları.....	23
6.1.5. Yayın Alımı (GAP).....	24
6.2 EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ	26
6.2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	26
6.3. SAĞLIK SEKTÖRÜ.....	27
6.3.1. Muhtelif İşler (GAP).....	27

6.3.1.1.Makine Teçhizat, Büyük Onarım ve Taşıt Alımları (Özel Bütçe):	28
6.3.1.2.Makine, Teçhizat, Taşıt ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye):	29
6.3.2. Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m2):	29
6.4. Diğer Kamu Hizmetleri	30
6.4.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	30
6.4.2. Merkezi Araştırma Laboratuvarı	31
7. EKLER	33
7.1. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (YILSONU)	33
7.2. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI HARCAMALARI YILSONU GERÇEKLEŞME RAPORU	36

ŞEKİLLER TABLOSU

Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler	3
Tablo 2: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı.....	4
Tablo 3: Tamamlanan İnşaatlar	6
Tablo 4: Devam Eden İnşaatlar	7
Tablo 5: 2016 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı	8
Tablo 6: 2016 Yılı Yatırım Projelerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödeneklerin Dağılımı ve Harcama Durumu.....	8
Tablo 7: 2016 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı	9
Tablo 8: 2016 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı.....	9
Tablo 9: 2016 Yılı Tamamlanan İnşaatlar	12
Tablo 10: Devam Eden İnşaatlar	15
Tablo 11: Muhtelif İşler Kapsamında Harcama Birimlerine Alınan Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Yazılım ile Donanım Alımları	22
Tablo 12: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları	25
Tablo 13: 2014-2016 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları.....	25
Tablo 14: 2016 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu.....	28
Tablo 15: 2016 Yılı İtibariyle BAP Kapsamında Yürütülen Projeler.....	30
Tablo 16: 2016 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Arş. Projelerinin Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı	31



GENEL DEĞERLENDİRME

Üniversitemizin 2015-2019 dönemi stratejik planında; kurumsal misyon, vizyon amaç ve hedefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

MİSYONUMUZ

Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli insan yetiştiren; bireylere, topluma ve tüm kurum-kuruluşlara eğitim, bilim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında hizmet üreten değişime açık bir üniversite.

VİZYONUMUZ

Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde uluslararası rekabet kabiliyeti yüksek bir dünya üniversitesi olmak.

1. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedefler aşağıda sıralanmıştır. 2016 yılı yatırımlarına da bu amaç ve hedefler doğrultusunda harcama yapılmıştır.

Stratejik Amaç-1 Eğitim Öğretim Kalitesini Yükseltmek	
Hedef-1	Nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine zemin hazırlamak ve üniversitemizin saygınlığını arttırmak için, üniversitenin tanıtımının etkin ve olumlu yönde planlanıp uygulanmasını sağlamak,
Hedef-2	Nitelikli öğretim elemanı sayısını arttırmak,
Hedef-3	Yabancı dil eğitiminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması,
Hedef-4	Disiplinlerarası etkileşimi arttırarak eğitimde sinerji oluşturmak,
Hedef-5	Eğitimde uluslararası işbirliğinin arttırılması,
Hedef-6	E-öğrenim programının yaygınlaştırılması,
Hedef-7	Doktora ve Tıpta Uzmanlık sınavlarında ön sıralarda tercih edilen üniversite olmak için bu öğrencilere bir dönem yurtdışında eğitim imkanı sağlamak,
Hedef-8	Kapalı devre radyo televizyon yayın kalitesinin arttırılması,
Hedef-9	Kitap, elektronik kitap, süreli yayın, veri tabanları ile görsel ve işitsel materyal (DVD, VCD vb.) sayısının arttırılması,
Hedef-10	Ders dışı eğitim ve sertifika programlarının yaygınlaştırılması,
Hedef-11	Uygulama odaklı eğitim modellerinin yaygınlaştırılması,
Hedef-12	Üniversite Eğitim-Araştırma-Hizmet süreçlerinde ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması,
Stratejik Amaç-2 Bilimsel Araştırmaların Nicelik ve Niteliğini Arttırmak	
Hedef-1	Ulusal ve uluslar arası proje yürütme ve ortak olma girişimlerinin teşvik edilmesi,
Hedef-2	Bilimsel yayın sayısının ve kalitesinin arttırılması ile üniversitenin Türkiye' deki diğer üniversiteler arasında bilimsel yayın sıralamasındaki konumunun iyileştirilmesi,
Hedef-3	Üniversitede ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantıların teşvik edilmesi,
Hedef-4	Sanayi ve kamu kuruluşlarıncı desteklenen proje ve tez çalışmalarının arttırılması,
Hedef-5	Bilimsel araştırma projelerinin teşvik edilmesi,
Hedef-6	Patent ve faydalı model sayısının arttırılması,
Stratejik Amaç-3 Toplumun Sunulan Hizmetleri Geliştirmek	
Hedef-1	Araştırma ve Uygulama Hastanesinin verdiği hizmetlerin geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması
Hedef-2	Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde Onkoloji, Kardiyoloji Enstitüleri kurulması, ayrıca çalışmasına başlanmış olan yanık tedavi merkezinin kurulması,
Hedef-3	Yurtdışına açılmak konusundaki çalışmalara ivme kazandırmak, özellikle komşu ülkelerden hastalara sağlık hizmeti verecek ilimizde sağlık turizminin geliştirilmesi,
Hedef-4	Üniversitenin tanıtım materyallerinin çeşitliliğinin ve sayısının arttırılması, ayrıca görsel, işitsel ve e-haber olarak olumlu haber sayısının arttırılması,
Hedef-5	Ulusal ve uluslar arası sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin arttırılması,



Hedef-6	E-öğrenme sisteminin topluma hizmet verebilecek şekilde oluşturulması,
Stratejik Amaç-4 Üniversitemiz Yerleşkelerinin Fiziksel Alan ve Altyapılarını Geliştirmek	
Hedef-1	Üniversitemizin bina inşaatları ile altyapı ve yenileme çalışmalarının yapılması,
Hedef-2	Çocuk Hastanesinin kurulması,
Hedef-3	Bilimsel Teknolojik Araştırma Merkezi (GÜBTAUM) kurulması,
Hedef-4	Üniversitemiz personel ve öğrencilerin sportif faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli spor alanlarının oluşturulması,
Hedef-5	Kampüste Atılı Yaşam Projesini faaliyete geçirerek atların ve faytonların bulunduğu doğal bir kampüs oluşturmak,
Stratejik Amaç-5 Öğrencilerin Sosyal-Kültürel ve Akademik Gelişimlerini Arttırmak	
Hedef-1	Öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini etkili ve kapsamlı hale getirmek,
Hedef-2	Öğrencilerin beslenme, ulaşım ve güvenlik gibi konularda yaşam koşullarını iyileştirmek,
Hedef-3	Öğrencilere yönelik düzenlenen kültürel ve sosyal (Tiyatro, sinema vb.) etkinliklerin arttırılması,
Hedef-4	Maddi imkânları kısıtlı olan öğrencilere destek olunması amacıyla kısmi zamanlı olarak çalıştırılmaları,
Hedef-5	Öğrencilerin sosyal donanımlarının arttırılarak, sosyal projelere katılımının sağlanması,
Hedef-6	Engelli öğrenci şartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması,
Hedef-7	Yabancı uyruklu öğrencilerin iletişim ve uyum sorunlarının giderilmesi amacıyla Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisinin kurulması,
Hedef-8	Öğrencilerin ihtiyaçlarını daha modern ortamda hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla öğrenci yaşam merkezlerinin kurulmasının sağlanması,
Hedef-9	Toplumsal Duyarlılık Projelerine katılımın yaygınlaştırılması,
Stratejik Amaç-6 Kurumsallaşmanın Güçlendirilmesini Sağlamak	
Hedef-1	İnsan kaynakları yönetiminin hayata geçirilmesi ile işgücü planlaması yapılarak hizmetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesinin sağlanması,
Hedef-2	Hizmet alanlarının memnuniyetinin arttırılması,
Hedef-3	Hizmet verenlerin memnuniyetinin arttırılması,
Hedef-4	Akademik ve idari personele hizmet alanları ile ilgili eğitim verilerek; Üniversitemizin kalitesini arttırma, küresel rekabet, sosyal değişime meydan okuma ve teknolojik ilerlemenin iş tasarımındaki değişimle birleştirmesini sağlamak,
Hedef-5	Tüm personelin bilgiye ve bilgilendirmeye erişimini kolaylaştırmak,
Hedef-6	Personelin ödüllendirilmesi için objektif bir değerlendirme sistemi kurmak ve uygulamak,
Hedef-7	İç kontrol sisteminin kurulmasının sağlanması,
Hedef-8	Üniversitenin kurumsal ve idari süreçlerinin iyileştirilmesi,

Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler

2. Yatırımların Finansman Kaynakları

2016 yatırım programında bulunan 10 adet yatırım projesi için; 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile 39.944.000,00 ₺, döner sermaye bütçesinden ise 6.500.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, toplam yatırım ödeneğimiz 46.444.000,00 ₺ olmuştur. Yıl içinde likit karşılığı 21.043.250 ₺ ve gelir fazlası 6.393.314,60 ₺ olmak üzere toplam 27.436.564,60 ₺ ödenek eklenmiş olup, yılsonu itibariyle toplam ödenek 73.880.564,60 ₺'ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 60.897.048,86 ₺'si harcanmış, harcama oranı ise % 82 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemize verilen 46.444.000 ₺ lik başlangıç yatırım ödeneğinin 32.341.000 ₺'si hazine yardımı, 7.603.000 ₺'si öz gelir ve 6.500.000 ₺'si döner sermaye ödeneğinden oluşmaktadır. Yılsonu itibariyle hazine yardımı, öz gelir, likit kaynaklar ve döner sermaye ödeneklerinin dağılımı ve harcamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı (Bin ₺)				
Finans Kaynağı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı (%)
Hazine Yardımı	32.341	32.342	46.874	88
Likit Kaynaklar	0	20.953		
Öz Gelir	7.603	14.086	14.023	99
Bütçe Toplamı	39.944	67.381	60.897	90
Döner Sermaye	6.500	6.500	0	0
GENEL TOPLAM	46.444	73.881	60.897	82

Tablo 2: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı

3. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi

Gaziantep Üniversitesinin temeli, 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümüne dayanmaktadır. 27 Haziran 1987 yılında, 3389 sayılı yasa ile bugünkü statüsüne kavuşan Üniversitemiz zaman içerisinde hızla büyüyerek bugün itibariyle; 16 fakülte, 4 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 24 araştırma ve uygulama merkezi, 1.519 akademik, 1.233 idari ve 50.683 öğrencisi ile sadece bölgenin değil ülkemizin sayılı üniversiteleri arasına girmiş bulunmaktadır. 2016 yılında kapatılarak Üniversitemize devredilen 15 Temmuz Yerleşkesi ile birlikte kapalı alanımız 93.000 m² artarak 546.971 m²'ye ulaşmıştır. Gaziantep Üniversitesinin toplam yüzölçümü 3.784.392,81 m², toplam kapalı alanı ise 546.971,47 m² dir. Üniversitemizin toplam 8 adet yerleşkesi bulunmaktadır. Merkez kampüste 88 adet lojman bulunmakta olup bu lojmanların 8 tanesi dubleks, 16 tanesi 2+1, geriye kalan 64 tanesi ise 3+1'dir.



Üniversitemiz sağlık hizmetlerini Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi aracılığıyla sunmaktadır. Hastanemiz alanında Türkiye'nin en iyi araştırma ve uygulama hastanelerinden biri olup; şehrimizin ve bölgemizin ve hatta

komşu ülkelerin sağlık sorunlarına çözüm üretmektedir. 2016 yılı itibariyle hasta sayımız 1.020.537, tetkik sayımız 8.486.071, ameliyat sayımız 31.755, klinik sayımız 43.347, poliklinik sayımız 787.015' ye ulaşmıştır. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde bulunan Gün Hastanesi; gününbirlik tedavi edilebilecek hastaların daha hızlı ve seri bir şekilde işlemlerinin yapılmasını sağlamak amaçlı kurulan gün hastanesi de bölgede ilk olma özelliği taşımaktadır. Kendi içinde ameliyathaneleri ve konforlu klinik imkânlarını mevcuttur.



Güneydoğunun ilk kanser hastanesi olan Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Gaziantep'te hayırseverimizin büyük katkılarıyla 2006 yılında yapılmıştır. 72 yataklı kapasiteli olan Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi; en modern ve en gelişmiş radyoterapi ve kemoterapi cihazlarıyla, her türlü kanserin teşhis ve tedavi uygulamasını yapabilecek donanıma sahiptir. Hastaların tanı tedavi sürecinin hızlı olabilmesi amacıyla

bünyesinde laboratuvarı hizmeti veren hastanemiz sadece Gaziantep ve çevre illere değil komşu ülkelerden gelen hastalarında umut ışığı olmuştur. 2016 yılında tedavi gören hasta sayısı 27.455' ye ulaşmıştır.



Diş Hekimliği Fakültesi, 31.10.2006 tarihinde 26332 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak kurulmuştur. 2008 yılının Nisan ayında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi binasında eğitim-

öğretim ve tedavi hizmetine başlamıştır. 2012 yılsonu itibariyle fakültemiz 17.000 m² kapalı alana sahip yeni binasına taşınan Diş Hekimliği Fakültemiz burada hizmet vermeye başlamıştır. Fakültemiz; Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Oral Diagnoz ve Radyoloji, Endodonti, Periodontoloji, Ortodonti, Restoratif Diş Tedavisi, Pedodonti ve

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dallarında ilimiz ve çevre ilerden gelen hastalara hizmet vermektedir.

4. 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemizde yeni açılan akademik birim ve buna bağlı olarak artan öğrenci sayısı yeni bina ihtiyacını doğurmaktadır. Üniversitemizde bu kapsamda; kapalı alanları 1.976 m² olan Hangar Bina İnşaatı, 1.000 m² Nizip ve İslâhiye Yemekhane Bina İnşaatı, 1.450 m² olan Su Sporları Bina İnşaatı tamamlanmıştır. Ayrıca Kongre ve Kültür Merkezi Yürüyen Merdiven, Yol, Kaldırım ve Çevre Tanzimi Onarımı, Kampüs Güvenlik Sistemi Yapımı, bina tadilat ve onarımları ile Gıda Mühendisliği Tadilat ve Onarımları işleri tamamlanmıştır. Bununla birlikte; kapalı alanları 12.760 m² olan Hukuk Fakültesi Bina İnşaatı, 11.359 m² olan Mimarlık Fakültesi Bina İnşaatı, 2.428 m² olan Kreş ve Anaokulu Bina İnşaatının 2017 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.

Yatırım projeleri kapsamında 2016 yılında tamamlanan ve devam eden inşaatlar aşağıda gösterilmiştir.

TAMAMLANAN İNŞAATLAR VE İŞLER				
İnşaatın Adı	Toplam Maliyeti	Kapalı alanı (m ²)	İnşaatın Başlangıç/Bitiş Tarihi	Tamamlanma Süresi (ay)
1-Hangar Bina İnşaatı	3.077.467,77	1.976	11.02.2015-15.06.2016	15
2- Nizip ve İslâhiye Yemekhane Binası	1.230.728,85	1.000	07.03.2016-12.08.2016	5
3- Su Sporları Merkezi	3.311.051,55	1.450	17.11.2014-29.07.2016	27
4- Yol, Kaldırım ve Çevre Tanzimi Onarım İşİ	3.712.536,60	0	23.11.2015-19.08.2016	9
5- Bina Tadilat ve Onarımları	3.165.239,44	0	01.07.2016-16.12.2016	5
6- Kongre ve Kültür Merkezine Yürüyen Merdiven İşİ	895.620,00	0	18.02.2016-29.06.2016	4
7-Gıda Mühendisliği Tadilat ve Onarımları	830.338,63	0	26.07.2016-07.11.2016	4
8-Kampüs Güvenlik Sistemi Yapılması	600.951,73	0	23.10.2015-19.02.2016	4
TOPLAM	16.823.934,57	4.426		

Tablo 3: Tamamlanan İnşaatlar

DEVAM EDEN İNŞAATLAR				
İnşaatın Adı	İhale Bedeli (KDV Dâhil)	Kapalı alanı (m2)	İnşaatın Başlangıç/Bitiş Tarihi	Tamamlanma Oranı (%)
1-Hukuk Fakültesi İnşaatı	15.244.420,00	12.760	18.12.2015-01.05.2017	75
2-Mimarlık Fakültesi İnşaatı	10.356.860,00	11.359	05.08.2015-20.04.2017	79
3-Kreş ve Anaokulu İnşaatı	2.584.082,00	2.428	13.07.2016-10.03.2017	27
TOPLAM	28.185.362,00	26.547		

Tablo 4: Devam Eden İnşaatlar

5. 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları

5.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım projelerinin harcamaları için bütçeden 39.944.000,00 ₺ ve döner sermaye bütçesinde ise 6.500.000,00 ₺ ödenek verilerek toplam ödenek 46.444.000,00 ₺ olmuştur. Yıl içinde bu ödeneye 27.436.564,60 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 73.880.564,60 ₺'ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 60.897.048,86 ₺'si yıl içinde 10 adet yatırım projesi için harcanmış ve harcama oranı % 82 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bütçemize 4 adet taşıt konulmuş, yıl için söz konusu taşıtlar için Bakanlar Kurulu izni talep edilmiş ancak bahse konu izin çıkmadığından anılan taşıtlar alınamamıştır. Diğer taraftan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin uygulama eğitiminde kullanılmak üzere 2 adet uçak satın alınmıştır.

2016 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin ₺)						
Sektör Adı	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Eklenecek Ödenek	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Projenin Durumu
EĞİTİM SEKTÖRÜ	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	98	70	168	166	Tamamlandı
	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	16.652	10.730	27.382	26.718	Devam Ediyor
	Muhtelif İşler (GAP)	6.000	6.588	12.589	11.674	Tamamlandı
	Kampüs Altyapısı (GAP)	3.000	1.700	4.700	4.347	Devam Ediyor
	Yayın Alımı (GAP)	1.750	0	1.750	1.146	Tamamlandı
SPOR SEKTÖRÜ	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	2.000	1.200	3.200	2.573	Devam Ediyor
SAĞLIK	Muhtelif İşler	1.000	1.755	2.755	2.436	Tamamlandı

SEKTÖRÜ	Döner Sermaye (*)	2.500	0	2.500	0,00	
	Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m2)	3.000	0	3.000	0	Devam Ediyor
	Döner Sermaye (*)	4.000	0	4.000	0	
D. K. H. SEKTÖRÜ	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	6.434	5.393	11.827	11.827	Tamamlandı
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	10	0	10	10	Devam Ediyor
TOPLAM		46.444	27.436	73.881	60.987	

(*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.

Tablo 5: 2016 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı

2016 Yılı Yatırım Projelerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödeneklerin Dağılımı ve Harcama Durumu (Bin ₺)							
EKO KOD	AÇIKLAMA	2016 Yılı Bütçe Ödeneği	Eklenen	Düşülen	2016 Yılı Toplam Ödeneği	Yıl Sonu Harcama	Harcama Oranı (%)
06.1	Mamul Mal Alımları	11.582	9.303	-	20.886	19.113	91
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.000	-	-	1.000	1.000	100
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	100	98	-	198	189	95
06.5	Gayri Menkul Ser. Ürt. Gid.	24.760	13.700	-	38.460	33.815	88
06.7	Gayri Menkul Büyük Onr. Gid.	2.192	4.335	-	6.527	6.470	99
06.9	Diğer Sermaye Giderleri	310	-	-	310	310	100
TOPLAM		39.944	27.436	-	67.380	60.897	90
Döner Sermaye Ödeneği		6.500	-	-	6.500	-	-
GENEL TOPLAM		46.444	27.436	-	73.881	60.897	82

Tablo 6: 2016 Yılı Yatırım Projelerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödeneklerin Dağılımı ve Harcama Durumu

2016 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin ₺)

Sektör Adı	Proje Sayısı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
Eğitim	5	27.500	46.589	44.051	94
Spor	1	2.000	3.200	2.573	80
Sağlık (*)	2	10.500	12.255	2.436	20
D.K.H	2	6.444	11.837	11.837	100
TOPLAM	10	46.444	73.881	60.897	82

(*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.

Tablo 7: 2016 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı

2016 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı (Bin ₺)

Sektör Adı	Proje Sayısı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
Devam Eden Projeler	5	28.662	42.293	33.648	80
Tamamlanan Projeler	5	17.782	31.588	27.249	86
TOPLAM	10	46.444	73.881	60.897	82

(*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.

Tablo 8: 2016 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı

5.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- ❖ Yatırım tavanlarının belirlenmesi sürecinde, yatırımcı kuruluşlar ile Kalkınma ve Maliye Bakanlıklarının daha fazla görüşme yaparak sürdürülebilir yatırım tavanlarının ortaya çıkması sağlanacak bu yolla hem yıl içinde yatırımların aksamadan yürütülmesi sağlanacak hem de yıl içinde oluşacak yedek ödenek talepleri de en aza indirilebilecektir.
- ❖ Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve mevsimsel şartlar Maliye Bakanlığınca göz önüne alınır ve buna göre ödenek verilirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir.
- ❖ Ayrıntılı Finans Programının sadece ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde hazırlanması 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine uygun olacaktır.

- ❖ Ödenek tavanları belirlenmesi sürecinde objektif kriter belirlenerek, bu kriterlerin bütçe hazırlayan kurumlara duyurulması halinde daha reel duruma uygun bütçeler ortaya çıkacaktır.

6. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI

Üniversitemiz 2016 Yılı Yatırım Programında 10 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Bunların altısı eğitim, ikisi sağlık, ikisi de diğer kamu hizmetleri sektöründe yer almaktadır. Aşağıda bu projelerin yıl içindeki uygulamaları belirtilmiştir.

6.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ

6.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2016H032330	
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Yeni yapılacak inşaatların projelendirme, etüd v.b işlemlerin yapılması.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Etüd Proje ve Müşavirlik	
Başlama-Bitiş Tarihi	2016- 2016	
Projenin Yılı Ödeneği	98.000,00	168.000,00
Yapılan Harcama (₺)	166.380,00	

Bu proje kapsamında; 2016 Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 98.000,00 ₺ ödenek verilmiş, anılan projeye likit karşılığı 70.000,00 ₺ ödenek eklenmiştir. Yapılan ekleme sonucu toplam ödenek 168.000 ₺ olmuştur. Bu ödenekten yılsonunda 166.380,00 ₺ harcanmıştır. Harcama oranı % 99 olmuştur.

Bu proje kapsamında; Nizip ve İslahiye kafeterya binası statik proje ve metrajı, çelik çatı sistemli kapalı spor salonu ve kreş anaokulu binasına ait statik, betonarme ve çelik projelerinin hesaplarının betonarme metrajlarının yapılması, Kütüphane binası uygulama projesi ödemesi, Nizip yerleşkesi kapalı spor salonu projelerinin hazırlanması işlerinin ödemeleri ve yeri değişen kreş ve anaokulu inşaatı için jeolojik ve jeostatik zemin etüdü yapılmıştır.

6.1.2. Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	1988H031310	
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Akademik ve idari birimlerin bina ihtiyaçlarını karşılamak	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Hukuk Fak.(10.618 m ²), Kreş (2.200 m ²) Mim.Fak. (11.825 m ²), Yemekhane Binası (2.000 m ²),	
Başlama-Bitiş Tarihi	1988 - 2018	
Projenin Yılı Ödeneği	16.652.000,00	27.382.000,00
Yapılan Harcama (₺)	26.717.968,59	

Bu proje kapsamında; 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımıdan 16.652.000,00 ₺ ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde likit karşılığı 10.730.000,00 ₺ ödenek eklenmiştir. Yapılan ekleme sonucu toplam ödenek 27.382.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten yılsonu itibariyle 26.717.968,59 ₺ harcama yapılmıştır. Harcama oranı % 97,5 olmuştur.

2016 yılında proje kapsamında; Hangar Binası için 1.677.937,09 ₺ Nizip ve İslahiye Yemekhane Binası 1.230.728,82 ₺ harcanarak söz konusu inşaatlar tamamlanmıştır. Ayrıca, Kongre ve Kültür Merkezi Yürüyen Merdiven Yapım İşleri için 895.620,00 ₺ harcanarak bahse konu inşaatlar tamamlanmıştır. Diğer taraftan, Mimarlık Fakültesi Bina İnşaatına 7.167.697,94 ₺ harcanmış olup inşaatın fiziki gerçekleşmesi % 79 oranında; Hukuk Fakültesi Bina İnşaatına 11.485.130,90 ₺ harcanmış olup inşaatın fiziki gerçekleşmesi % 75 ve Kreş ve Anaokulu Bina İnşaatına 693.565,02 ₺ harcanmış olup inşaatın fiziki gerçekleşmesi % 27 oranında tamamlanmıştır. Bu proje içerisinde tamamlanan ve devam eden inşaatlar aşağıda belirtilmiştir.

TAMAMLANAN İNŞAATLAR				
İnşaatın Adı	Toplam Maliyet	Kapalı Alan (m ²)	İnşaatın Başlangıç/Bitiş Tarihi	Tamamlanma Süresi (ay)
1-Hangar Binası	3.077.467,77	1.976	11.02.2015-15.06.2016	15
2- Nizip ve İslahiye Yemekhane Binası	1.230.728,85	1.000	07.03.2016-12.08.2016	5
3- Kongre ve Kültür Merkezi Yürüyen Merdiven Yapım İşi	895.620,00	-	18.02.2016-29.06.2016	4
TOPLAM	5.203.816,62	2.976		

Tablo 9: 2016 Yılı Tamamlanan İnşaatlar

HANGAR BİNASI	
İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	3.077.467,77 ₺
2015 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	1.399.530,68 ₺
2016 Yılı Harcaması	1.677.937,09 ₺
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	11.02.2015-15.06.2016
İnşaatın Kapalı Alanı	1.976 m ²
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%100
AÇIKLAMA	1 adet uçak Hangarı, 1 adet atölye, 1 adet simülör odası, 9 adet ofis, 3 adet derslik, 1 adet kütüphane ve 1 adet dinlenme odası bulunmaktadır.





NİZİP VE İSLAHİYE YEMEKHANE BİNASI

İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	1.230.728,85 ₺
2015 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	0
2016 Yılı Harcaması	1.230.728,85 ₺
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	07.03.2016-12.08.2016
İnşaatın Kapalı Alanı	1.000 m ²
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%100
AÇIKLAMA	Nizip ve İslahiye Kampüsüne 1' er adet yemekhane binası yapılmıştır.



KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ YÜRÜYEN MERDİVEN YAPIM İŞİ

İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	895.620,00 ₺
2015 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	0
2016 Yılı Harcaması	895.620,00 ₺
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	18.02.2016-29.06.2016
İnşaatın Kapalı Alanı	-
Fiziki Gerçekleşme Durumu	% 100
AÇIKLAMA	Proje bünyesinde; 2 adet inişli-çıkışlı yürüyen merdiven yapılmıştır.

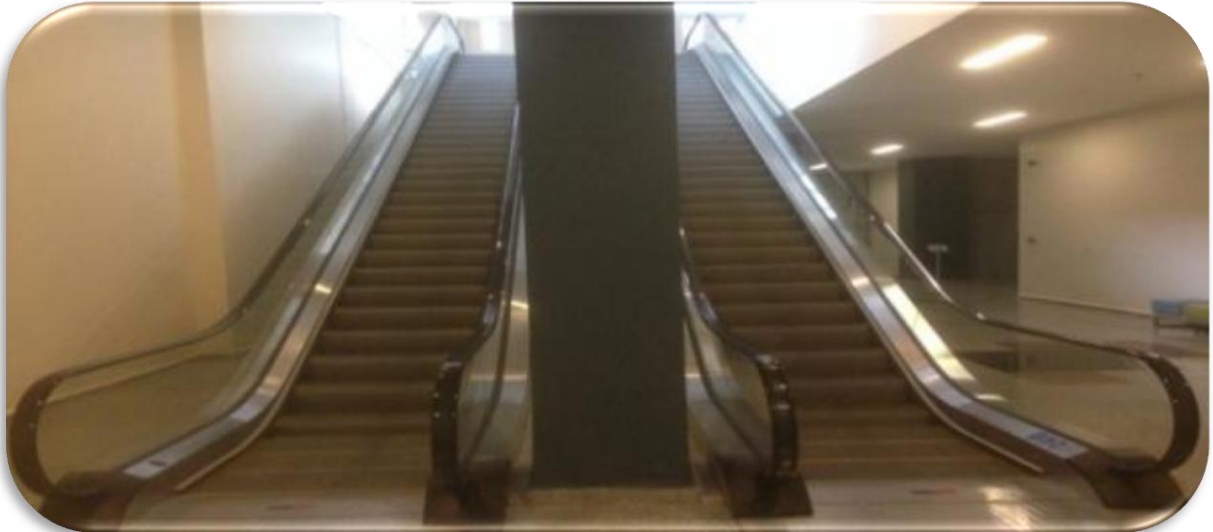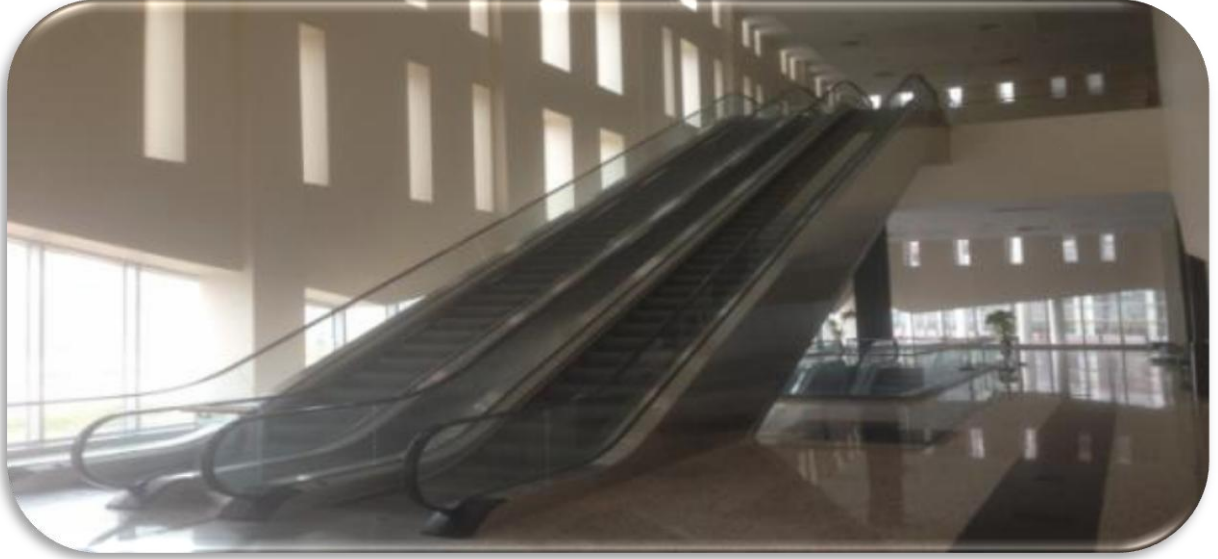

DEVAM EDEN İNŞAATLAR				
İnşaatın Adı	İhale Bedeli (KDV Dahil)	Kapalı Alan (m2)	İnşaatın Başlangıç/Bitiş Tarihi	İnşaatın Fiziki Gerçekleşmesi (%)
1- Hukuk Fakültesi Bina İnşaatı	15.244.420	12.760	18.12.2015-01.05.2017	75
2- Mimarlık Fakültesi Bina İnşaatı	10.356.860	11.359	05.08.2015-20.04.2017	79
3- Kreş ve Anaokulu Bina İnşaatı	2.584.082	2.428	13.07.2016-10.03.2017	27
TOPLAM	28.185.362	26.547		

Tablo 10: Devam Eden İnşaatlar

HUKUK FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATI

İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV. Dahil İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil Hariç)	15.244.420,00 ₺
2015 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	0
2016 Yılı Harcaması	11.485.130,90 ₺
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	18.12.2015-01.05.2017
İnşaatın Kapalı Alanı	12.760m ²
Fiziki Gerçekleşme Durumu	% 75
AÇIKLAMA	Proje bünyesinde; A blokta 6 adet amfi , 1 adet kafeterya, 1 adet mahkeme salonu, 6 adet derslik , 1 adet ofis , B blokta 62 adet ofis, teras ve dinlenme salonu , C blokta 3 adet okuma salonu, 3 adet kulüp odası, 1 adet kütüphane , 1 adet arşiv, 1 adet internet araştırma odası bulunmaktadır.



MİMARLIK FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATI

İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, Dahil İş Artışı ve Fiyat Farkı Hariç)	10.356.860 ₺
2015 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	1.039.776,96 ₺
2016 Yılı Harcaması	7.167.697,94 ₺
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	05.08.2015-20.04.2017
İnşaatın Kapalı Alanı	11.359 m ²
Fiziki Gerçekleşme Durumu	% 79
AÇIKLAMA	Proje bünyesinde; 1 adet çok amaçlı salon 63 adet ofis 3 adet amfi 1 adet toplantı salonu 8 adet derslik 21 adet stüdyo 6 adet atölye 5 adet depo bulunmaktadır.



KREŞ VE ANAOKULU BİNA İNŞAATI

İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, Dahil İş Artışı ve Fiyat Farkı Hariç)	2.584.082 ₺
2015 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	0
2016 Yılı Harcaması	693.565,02 ₺
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	13.07.2016-10.03.2017
İnşaatın Kapalı Alanı	2.428 m ²
Fiziki Gerçekleşme Durumu	% 27
AÇIKLAMA	1 adet jimnastik salonu, 1 adet çok amaçlı salon, 12 adet sınıf, 3 adet uyku odası, 1 adet oyun sınıfı, 3 adet ofis, 1 adet revir, yemekhane ve mutfaktan oluşmaktadır.



6.1.3. Kampüs Altyapısı (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	1991H030810	
Proje Adı	Kampus Alt yapısı (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversite alt yapısının iyileştirilmesi, yeni kurulan ve yapılan binalarda altyapı çalışmalarının ve tadilatlarının yapılması	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı	
Başlama-Bitiş Tarihi	1991 -2017	
Projenin Yılı Ödeneği	3.000.000,00	4.700.000,00
Yapılan Harcama (₺)	4.346.823,15	

Bu proje kapsamında; 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 3.000.000,00 ₺ ödenek verilmiş, anılan projeye likit karşılığı 1.700.000,00 ₺ ödenek eklenmiştir. Yapılan ekleme sonucu toplam ödenek 4.700.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten yılsonunda 4.346.823,15 ₺ harcanmış olup, harcama oranı % 92 olarak gerçekleşmiştir.

Bu Proje kapsamında devam eden Yol Kaldırım ve Çevre düzenleme işi, Makine Mühendisliği Bölümü binası ile Meslek Yüksekokulu arasındaki galeride bulunan kablo değişimi işi, Gıda Mühendisliği doğalgaz hattı, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokuluna telefon hattı işi, Rektörlük binasının VRF bakım ve onarımı, kanalizasyon tadilatı, Nizip Meslek Yüksekokulu trafo tadilatı, Üniversite paratoner değişimi, Yabancı Diller Yüksekokuluna telefon kablosu çekilmesi, Kampus peyzaj yapım işi bu proje kapsamında yapılmıştır.



6.1.4. Muhtelif İşler (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2016H032340	
Proje Adı	Muhtelif İşler (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversite içerisindeki eskiyen binaların yeniden onarılarak kullanıma müsait duruma getirilmesi amaçlanmaktadır.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, T-12 (1 adet), T-2 (1 adet), T-5 (1 adet)	
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016	
Projenin Yılı Ödeneği	6.000.000,00	12.588.500,00
Yapılan Harcama (₺)	11.673.838,86	

Bu proje kapsamında; 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 6.000.000,00 ₺ ödenek verilmiş, anılan toplu projeye likit karşılığı 6.588.500,00 ₺ ödenek eklenmiştir. Yapılan ekleme sonucu toplam ödenek 12.588.500,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten yılsonunda 11.673.838,86 ₺ harcanmış olup, harcama oranı % 93 olarak gerçekleşmiştir.

6.1.4.1. Makine ve Teçhizat, Bilgisayar, Donanım ve Taşıt Alımları:

Projeye 2016 Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 4.000.000,00 ₺ ödenek verilmiş, anılan alt projelere yıl içinde likit karşılığı ödenek kaydıyla 3.598.500,00 ₺ ödenek eklenmiştir. Ödenek eklenerek toplam ödenek 7.598.500,00 ₺ olmuştur. 2016 yılsonu itibariyle bu ödeneğin 6.827.880,23 ₺ harcanmıştır. Harcama oranı % 90 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan harcamalar aşağıda ayrıntılı şekilde belirtilmiştir.

❖ Makine-Teçhizat Alımları:

2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından makine teçhizat alımları için 1.915.000,00 ₺ ödenek verilmiş, anılan alt projeye yıl içinde likit karşılığı ödenek kaydıyla 3.350.000 ₺ eklenerek; toplam ödenek 5.265.000,00 ₺ olmuştur. 2016 yılsonu itibariyle bu ödeneğin 4.836.127,75 ₺'si harcanmıştır. Harcama oranı % 92 olarak gerçekleşmiştir.

❖ Bilgisayar ve Yazılım Alımları:

2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından bilgisayar ve yazılım alımları için 1.000.000,00 ₺ ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde likit karşılığı 248.500,00 ₺ ödenek eklenerek; toplam ödenek 1.248.500,00 ₺ olmuştur. 2016 yılsonu itibariyle bu ödeneğin 1.225.463,63 ₺ harcanmış olup, harcama oranı % 98 olarak gerçekleşmiştir.

❖ Donanım Alımları:

2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından donanım alımları için 1.000.000,00 ₺ ödenek verilmiş, anılan alt projeye yıl içinde 90.000 ₺ likit karşılığı ödenek eklenerek; toplam ödenek 1.090.000,00 ₺ olmuştur 2016 yılsonu itibariyle bu ödeneğin 766.288,85 ₺ harcanmış olup, harcama oranı % 70 olarak gerçekleşmiştir.

❖ Taşıtlı Alımı:

2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından taşıtlı alımları için 85.000,00 ₺ ödenek verilmiş, anılan alt projeye yıl içinde herhangi bir ödenek eklenmemiştir. Yıl içinde taşıtlı alımı için Bakanlar Kurulu izni alınamadığından herhangi bir harcama yapılmamıştır.

BİLGİSAYAR VE YAZILIM ALIMLARI			MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI		
Sıra No	BİRİMLER	Harcanan Bütçe (₺)	Sıra No	BİRİMLER	Harcanan Bütçe (₺)
1	Rektörlük	861,40	1	Rektörlük	27.812,60
2	Fen Edebiyat Fakültesi	55.837,60	2	Fen Edebiyat Fakültesi	9.721,30
3	Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi	56.781,60	3	Diş Hekimliği Fakültesi	105.265,54
4	Makine Mühendisliği	3.245,00	4	Güzel Sanatlar Fakültesi	92.539,06
5	İnşaat Mühendisliği	6.811,04	5	Tıp Fakültesi	27.022,00
6	Teknik Bilimler ve Meslek Yüksekokulu	9.393,39	6	Sağlık Bilimleri Fakültesi	10.289,60
7	Araban Meslek Yüksekokulu	2.690,40	7	İlahiyat Fakültesi	116.525,00
8	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.398,30	8	Mimarlık Fakültesi	119.480,90
9	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	51.600,00	9	İletişim Fakültesi	7.316,00
10	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	11.204,10	10	Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakül.	2.295.930,59
11	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	38.586,00	11	Makine Mühendisliği	63.530,02
12	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	56.310,00	12	Gıda Mühendisliği	1.202.780,56
13	Matbaa ve Basım İşleri Müdürlüğü	5.015,00	13	İnşaat Mühendisliği	48.630,95
14	Evrak Arşiv İşletme Müdürlüğü	74.820,00	14	Tekstil Mühendisliği	65.096,53
15	Üniversite Geneli(Merkez Ambarı)	850.909,80	15	Gaziantep Sağlık Hizmetleri MYO	507,40
			16	Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu	152.412,99
			17	İslahiye Meslek Yüksekokulu	21.181,00
			18	Nurdağı Meslek Yüksekokulu	499,99
			19	Araban Meslek Yüksekokulu	60.902,00
			20	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	99.511,90
			21	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	26.001,30
TOPLAM		1.255.463,63			

22	Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	36.580,00
23	Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı	21.977,50
24	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1.439,60
25	Matbaa ve Basım İşleri Müdürlüğü	12.875,00
26	Deney Hayvanları Araştırma Merkezi	171.100,00
27	Üniversite Geneli (Merkez Ambarı)	39.198,42
TOPLAM		4.836.127,75

DONANIM ALIMLARI		
Sıra No	BİRİMLER	Harcanan Bütçe (₺)
1	Rektörlük	3.386,88
2	Eğitim Fakültesi	21.476,00
3	Dış Hekimliği Fakültesi	566,40
4	İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	3.268,60
5	Nizip Eğitim Fakültesi	1.062,00
6	Mimarlık Fakültesi	283,20
7	Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi	75.514,41
8	Gıda Mühendisliği	457.634,08
9	Elektrik Elektronik Mühendisliği	6.065,28
10	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü	18.632,20
11	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	259,20
12	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	12.921,00
13	Matbaa ve Basım İşleri Müdürlüğü	1.416,00
14	Deney Hayvanları Araştırma Merkezi	60.671,60
15	Üniversite Geneli(Merkez Ambarı)	40.828,00
16	Diğer (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından çeşitli birimlere alınan)	62.304,00
TOPLAM		766.288,85

Tablo 11: Muhtelif İşler Kapsamında Harcama Birimlerine Alınan Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Yazılım ile Donanım Alımları

6.1.4.2. Bina Büyük Onarımları:

2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımıyla bina büyük onarımları için 2.000.000,00 ₺ ödenek verilmiş, anılan alt projeye yıl içinde likit karşılığı ödenek kaydıyla 2.900.000,00 ₺ eklenerek; toplam ödenek 4.900.000,00 ₺ olmuştur. 2016 yılsonu itibarıyla bu ödeneğin 4.845.958,63 ₺ harcanmış olup harcama oranı % 99 olarak gerçekleşmiştir.

Bina tadilat ve onarımları kapsamında; Teknik ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri, Fizik Mühendisliği ve 75.Yıl Merkezi Derslik, Isı Santrali ve Tesis İşletme Müdürlüğü, Nizip Meslek Yüksekokulu, 15 Temmuz Yerleşkesi Tıp Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, İlahiyat Fakültesi binalarında tadilat bakım ve onarımlar yapılmıştır. Bu projeden bina tadilat ve onarımları ihalesi yapılmış ve Kdv. dahil 3.165.239,44 ₺ bedelle sözleşmeye bağlanmış ve yılsonu itibarıyla bahse konu iş tamamlanmıştır.



6.1.5. Yayın Alımı (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2016H032350	
Proje Adı	Yayın Alımı (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversitemizin her tür ve ortamdaki yayın ihtiyacının karşılanması.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Basın Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016	
Projenin Yılı Ödeneği	1.750.000,00	1.750.000,00
Yapılan Harcama (₺)	1.145.601,25	

Bu proje kapsamında; 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımıdan 1.750.000,00 ₺ ödenek verilmiş, yıl içinde herhangi bir ekleme yapılmamıştır. Bu ödenekten yılsonunda 1.145.601,25 ₺ harcanmıştır. Harcanan ödenek ile; 27 adet veri tabanı ödemesi, 844 adet Türkçe, 114 adet yabancı dilde olmak üzere toplam 988 adet basılı yayın ve 137 adet DVD (Bluray 3D) alımı yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemizin satın aldığı ve abone olduğu veri tabanlarına ilişkin bilgiler aşağıda tablolaştırılmıştır.

SATIN ALINAN VE ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI

SIRA NO	VERİ TABANI ADI	KONUSU	HARCAMA BEDELİ (₺)
1	American Pyhsics Society	Mühendislik	7.082,25
2	ASTM	Mühendislik	26.375,65
3	ArtStor	Sosyal Bilimler	3.372,46
4	BeckOnline	Hukuk	18.908,32
5	British Standart Online Library	Mühendislik	59.549,26
6	Cambridge University Press	Sosyal Bilimler	11.444,92
7	Clinical Key	Tıp	62.939,61
8	The Cochrane Library	Tıp	17.006,83
9	Dentistry & Oral Sciences Source	Diş Hekimliği	20.931,18
10	Dervent Innovation Index	Mühendislik	9.693,91
11	Ebrary	Genel (E-kitap)	22.664,82
12	EndNote	Makale yazım	6.102,21
13	Emerald 120+ Engineering	Sosyal Bilimler, Mühendislik	42.751,25
14	Hiperkitap	Genel (e-kitap)	25.243,70
15	HukukTürk	Sosyal Bilimler	1.805,00

16	İİF Dergisi	Sosyal Bilimler	3.101,61
17	Institute of Physics (IOP)	Mühendislik	36.534,56
18	JSTOR (10 Paket)	Sosyal Bilimler	21.595,43
19	McGraw Hill Access Engineering	Mühendislik (e-kitap)	15.721,64
20	McGraw Hill Access Medicine, Pediatrics	Tıp (e-kitap)	52.114,42
21	Oxford Online Journals	Sosyal Bilimler	31.043,19
22	Proquest Central	Genel	95.117,13
23	Proquest Tez	Genel	59.534,52
24	Reaxys	Kimya	39.371,58
25	ScinceDirect e-books	Genel (E-kitap)	146.605,00
26	Summon	Keşif Aracı (Arama)	26.330,00
27	Swisslex	Hukuk	4.102,14
28	Turnitin	İntihal Engelleme	9.676,92
29	Uptodate	Tıp	37.709,09
30	Visible Body	Tıp	14.887,87
31	Wiley Interscience	Mühendislik	90.359,16
GENEL TOPLAM			1.019.675,63

Tablo 12: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları

2014-2016 YILLARI ARASI TOPLAM KÜTÜPHANE KAYNAKLARI									
	2014 Yılı			2015			2016		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	99.125	129.512	228.637	104.009	144.672	248.681	132.565	145.880	278.445
Sürekli Yayın Aboneliği	48	48.289	48.337	43	53.785	53.828	47	56.435	56.482
Tez	1.741	3.803.673	3.805.414	1.981	3.960.848	3.962.829	2.223	4.145.699	4.147.922
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	-	35	35	-	41*	41*	-	41*	41*
Standartlar	17.113	64.125	81.238	17.113	66.903	84.016	17.113	159.632	176.745
DVD-VCD	1.982	-	1.982	2.190	-	2.190	2.324	-	2.324
TOPLAM	120.009	4.045.634	4.165.643	125.336	4.226.208	4.351.544	154.272	4.507.646	4.661.918

(*)11 adet veri tabanı ULAKBİM/EKUAL kapsamında üniversitemizin erişimine açıktır.

Tablo 13: 2014-2016 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları

6.2 EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

6.2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2016H051040	
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim - Beden Eğitimi ve Spor	
Proje Amacı	Üniversitemiz öğrenci ve personelinin ihtiyaç duyduğu spor alanlarının yapılması	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Spor Kompleksi	
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2018	
Projenin Yılı Ödeneği	2.000.000,00	3.200.000,00
Yapılan Harcama (₺)	2.573.514,25	

Bu proje kapsamında; 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 2.000.000,00 ₺ ödenek verilmiştir. Yıl içinde likit karşılığı ödenekten 1.200.000,00 ₺ ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 3.200.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten yılsonunda 2.573.514,25 ₺ harcanmıştır. Açık ve kapalı spor tesisleri projesi kapsamında; Su Sporları Merkezi inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır.

SU SPORLARI MERKEZİ EĞİTİM BİNASI	
İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	3.311.051,55 ₺
2015 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	737.537,30 ₺
2016 Yılı Harcaması	2.573.514,25 ₺
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	17.11.2014-29.07.2016
İnşaatın Kapalı Alanı	1.450 m ²
Fiziki Gerçekleşme Durumu	% 100
AÇIKLAMA	1 adet seminer odası 1 adet yemekhane ve mutfak 15 adet sporcu ve antrenör odası 1 adet su sporları izleme terası bulunmaktadır.



6.3. SAĞLIK SEKTÖRÜ

6.3.1. Muhtelif İşler (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2016I000210	
Proje Adı	Muhtelif işler	
Sektör/ Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Hastanenin büyük onarım, makine-teçhizat ile taşıt alım ihtiyacını karşılamak	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Büyük Onarım, Makine-Teçhizat, T-15(2 adet)	
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016	
Projenin Yılı Ödeneği	3.500.000,00 (2.500.000,00 Döner Sermaye)	5.254.750,00
Yapılan Harcama (₺)	2.435.608,16	

Proje kapsamında; 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımıdan 1.000.000,00 ₺ ödenek hastaneye makine teçhizat ve tıbbi cihaz alımı, büyük onarım ve taşıt alımı amacıyla verilmiştir. Yıl içinde likit karşılığı olarak 1.754.750,00 ₺ ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 2.754.750,00 ₺ olmuştur. Ayrıca kaynağı döner sermayeden olmak üzere 2.500.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, ancak yıl içinde döner sermaye kaynağından konulan ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır.

6.3.1.1. Makine Teçhizat, Büyük Onarım ve Taşıt Alımları (Özel Bütçe):

Üniversitemizin 2016 Yılı Yatırım Programına; hastanenin makine, teçhizat, tıbbi cihaz aile taşıt alımları ile bina büyük onarımları için 1.000.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde bu ödeneye likit karşılığı olarak 1.754.750,00 ₺ ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 2.754.750,00 ₺ olup, 2.435.608,16 ₺ harcanmıştır.

❖ Makine-Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Alımları:

Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine makine teçhizat alımları için 500.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup bu ödeneye yıl içinde likit karşılığı olarak 320.000,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 820.000,00 ₺'ye ulaşmıştır. Bu ödenekten makine, teçhizat ve tıbbi cihaz alımları için 811.551.70,00 ₺ harcama yapılmış olup harcama oranı % 99 olarak gerçekleşmiştir.

2016 YILINDA HASTANEMİZE ALINAN MAKİNE, TEÇHİZAT VE TIBBİ CİHAZLARIN DAĞILIMI TABLOSU		
Sıra No	Bölüm/Birim Adı	Harcama (₺)
1	Hastane Geneli	200.564,74
2	Çocuk Hastalıkları	2.160,00
3	Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon	33.662,00
4	Ameliyathane	28.793,50
5	Üroloji	124.146,00
6	Anestezi	84.607,23
7	Sterilizasyon	7.689,60
8	Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı	39.020,40
9	Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı	2.499,12
10	Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi	256.113,91
11	Acil Tıp	2.106,00
12	Bilgi İşlem	30.189,20
TOPLAM		811.551,70

Tablo 14: 2016 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu

❖ Büyük Onarım:

Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine makine-teçhizat alımları için 192.000,00 ₺ ödenek konulmuştur. Yıl içinde likit karşılığı olarak

1.434.750,00 ₺ ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 1.626.750,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten makine, teçhizat ve tıbbi cihaz alımları için 1.624.056,00 ₺ harcama yapılmış olup, harcama oranı % 100' dür.

✓ **Taşıt Alımı:**

Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine 2 adet T15 Ambulans (Tıbbi Donanımlı) alımı için 308.000,00 ₺ ödenek konulmuştur. Yıl içinde Bakanlar Kurulu izni alınamadığından ambulans alımı kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

6.3.1.2. Makine, Teçhizat, Taşıt ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye):

Üniversitemizin 2016 Yılı Yatırım Programına; hastanenin büyük onarımlarında kullanılmak üzere kaynağı döner sermayeden olmak üzere 2.500.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, yılsonu itibarıyla bu ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır.

6.3.2. Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m²)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2014I000260	
Proje Adı	Çocuk Hastanesi (GAP) (250 Ytk. 30.440 m ²)	
Sektör/ Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Hasta yoğunluğu nedeni ile daha geniş yerde daha kaliteli hizmet vermek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Hastane İnşaatı (30.440 m ²), (250 yatak), Makine-Teçhizat	
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2018	
Projenin Yılı Ödeneği	3.000.000,00 (4.000.000,00 Döner Sermaye)	7.000.000,00
Yapılan Harcama (₺)	0,00	

Bu proje kapsamında; 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımıyla 3.000.000,00 ₺ ödenek verilmiştir. Ayrıca bu projeye kaynağı döner sermayeden olmak üzere 4.000.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup toplam ödenek 7.000.000,00 ₺' ye ulaşmıştır. 2016 yılı Ocak ayında Çocuk Hastanesi inşaat ihalesi yapılmış olup ancak bina inşaatına başlanmadığından proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

6.4. Diğer Kamu Hizmetleri

6.4.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2016K120340	
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	
Sektör/ Alt Sektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma	
Proje Amacı	Bilimsel Araştırma Projelerini Desteklemek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Proje Desteği	
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2016	
Projenin Yılı Ödeneği	6.434.000,00	11.827.315,00
Yapılan Harcama (₺)	11.827.315,00	

Bu proje kapsamında; 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile bütçeye 6.434.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde gelir fazlası olarak 5.393.315,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 11.827.315,00 ₺' ye ulaşmıştır. Söz konusu ödenek ile 236 projeye destek verilmiş olup, bu projelerin 88 adedi yıl içinde tamamlanmıştır. Anılan ödeneğin tamamı yılsonu itibariyle özel hesaba aktarılmıştır. Özel hesaptan yatırım ödeneği kapsamında 6.605.227,50 ₺ harcanmıştır.

Projeler	Önceki Yıldan Devreden Proje Sayısı	2016 Yılı İçinde Eklenen Proje Sayısı	Toplam Proje Sayısı	2016 Yılı Projelere Ayrılan Toplam Ödenek (₺)	2016 Yılı Toplam Harcama (₺)	Yıl İçinde Tamamlanan Proje Sayısı	Tamamlanan Projeler İçin Yapılan Harcama (₺)
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	67	81	236	11.827.314,60	6.605.227,50	88	858.753,10
Genel Toplam	67	81	236	11.827.314,60	6.605.227,50	88	858.753,10

Tablo 15: 2016 Yılı İtibariyle BAP Kapsamında Yürütülen Projeler

2016 YILINDA KABUL EDİLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN BİRİMLERE VE TÜRLERE GÖRE DAĞILIMI

BÖLÜMÜ	Kapsamlı Araştırma Projeleri	Altyapı Araştırma Projeleri	Öğretim Elemanlarına Bilimsel Nitelik Geliştirme Projeleri	Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projeleri	Doktora Tezi	Uzmanlık Tezi	Destek (₺)	Toplam
Tıp Fakültesi	2	4	-	20	2	18	1.664.850,00	46
İkt. İdr. Bilim. Fakültesi				1			4.602,00	1
Mühendislik Fak.		1		9	5		242.166,06	15
Rektörlük Makamı			1				3.000.000,00	1
Fen Edebiyat Fakültesi				6	5		79.847,31	11
Diş Hekimliği Fakültesi					1	2	29.569,00	3
Eğitim Fakültesi				1	1		14.000,00	2
Beden Eğitimi MYO.				1			4.999,00	1
Gaziantep Teknik Bilimler MYO.		1					60.000,00	1
TOPLAM	2	6	1	38	14	20	5.100.033,53	81

Tablo 16: 2016 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Arş. Projelerinin Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı

6.4.2. Merkezi Araştırma Laboratuvarı

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2010K121510	
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	
Sektör/ Alt Sektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma	
Proje Amacı		
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat(6.314)	
Başlama-Bitiş Tarihi	2010-2016	
Projenin Yılı Ödeneği	10.000,00	10.000,00
Yapılan Harcama (₺)	10.000,00	

Bu proje kapsamında; 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile 10.000,00 ₺ ödenek verilmiş olup, anılan ödeneğin tamamı yılsonu itibariyle özel hesaba aktarılmıştır. Özel hesaptan bu proje için yılsonu itibariyle yatırım ödeneği kapsamında 1.023.191,01 ₺ harcama yapılmıştır. 2016 yılında proje kapsamında; makine-teçhizat alımı için 345.179,52 ₺;

Merkezi Araştırma Laboratuar Bina inşaatı için 678.011,49 ₺ harcama yapılmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuar Bina inşaatı tamamlanmıştır.



7. EKLER

7.1. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (YILSONU)

Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar (Özel Bütçe+Döner Sermaye)

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödeneği			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Eğitim	6	0	302.110	0	0	258.925	0	0	29.500	0	0	49.789	0	0	46.624
Sağlık	2	0	70.500	0	0	0	0	0	10.500	0	0	12.255	0	0	2.436
D.K.H	2	0	20.723	0	0	14.279	0	0	6.444	0	0	11.837	0	0	11.837
Toplam	10	0	393.333	0	0	273.204	0	0	46.444	0	0	73.881	0	0	60.897



Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar (Özel Bütçe)

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödeneği			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Eğitim	6	0	302.110	0	0	258.925	0	0	29.500	0	0	49.789	0	0	46.624
Sağlık	2	0	70.500	0	0	0	0	0	4.000	0	0	5.755	0	0	2.436
D.K.H	2	0	20.723	0	0	14.279	0	0	6.444	0	0	11.837	0	0	11.837
Toplam	10	0	393.333	0	0	273.204	0	0	39.944	0	0	67.381	0	0	60.897

Bütçe Türü: Döner Sermaye

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödeneği			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Sağlık	2	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500	0	0	6.500	0	0	0
Toplam	3	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500	0	0	6.500	0	0	0



Bütçe Türü: Hibe

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödeneği			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Eğitim	1	0	0	0	0	0	0	0	123	0	0	123	0	0	0
Toplam	1	0	0	0	0	0	0	0	123	0	0	123	0	0	0



7.2. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI HARCAMALARI YILSONU GERÇEKLEŞME RAPORU

Sektör Adı: Eğitim

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2015 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
267219	441,	1988H031310	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Gaziantep	0,	235.000,	209.259,	0,	0,	27.382,		0,	0,	0,	26.718,
254241	441,	1991H030810	Kampüs Altyapısı (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Gaziantep	0,	53.000,	49.666,	0,	0,	4.700,		0,	0,	0,	4.347
249218	441,	2016H051040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Gaziantep	0,	6.000,	0,	0,	0,	3.200,		0,	0,	0,	2.573,
244013	441,	2016H032330	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Gaziantep	0,	98,	0,	0,	0,	168,		0,	0,	0,	166
247350	441,	2016H032340	Muhtelif İşler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Gaziantep	0,	6.262,	0,	0,	0,	12.588,		0,	0,	0,	11.674
244165	441,	2016H032350	Yayın Alımı (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Gaziantep	0,	1.750,	0,	0,	0,	1.750,		0,	0,	0,	1.146
TOPLAM							0,	302.110,	258.925,	0,	0,	49.789,		0,	0,	0,	46.624,



Sektör Adı: Sağlık

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2015 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
263846	441,	2014I000260	Çocuk Hastanesi (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Gaziantep	0,	63.000,	0,	0,	0,	3.000		0,	0,	0,	0,
263843	441,	2014I000260	Çocuk Hastanesi (GAP)	DÖNER SERMAYE	2018	Gaziantep	0,	4.000,	0,	0,	0,	4.000,		0,	0,	0,	0,
263950	441,	2016I000210	Muhtelif işler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Gaziantep	0,	1.000,	0,	0,	0,	2.755,		0,	0,	0,	2.436
263953	441,	2016I000210	Muhtelif işler (GAP)	DÖNER SERMAYE	2016	Gaziantep	0,	2.500,	0,	0,	0,	2.500,		0,	0,	0,	0,
TOPLAM							0,	70.500,	0,	0,	0,	12.255,		0,	0,	0,	2.436,

Sektör Adı: DKH

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2015 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
246922	441,	2010K121510	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2016	Gaziantep	0,	14.289,	14.279,	0,	0,	10,		0,	0,	0,	10
251236	441,	2016K120340	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2016	Gaziantep	0,	6.434,	0,	0,	0,	11.827		0,	0,	0,	11.827
TOPLAM							0,	20.723,	14.279,	0,	0,	11.837		0,	0,	0,	11.837
