



**T.C.  
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**

**2018 YILI YATIRIM PROGRAMI  
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**



**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  
Şubat - 2019**




**T.C**

**GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**

**2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE  
DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Şubat-2019**

## ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

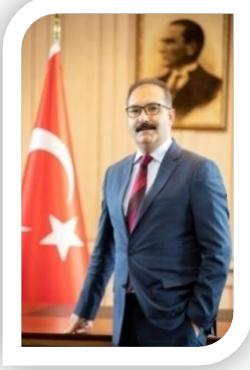

Gaziantep Üniversitesi, 4 bin 200'ü dünyanın 107 ülkesinden olmak üzere, yaklaşık 52 bin öğrencili büyük bir ailedir. Öte yandan İngilizce, Türkçe ve Arapça eğitim veren Türkiye'deki tek üniversitedir. Aynı zamanda bilim insanlarımızın, geleceğimizin nesli olan çocuklarımızın etik sınırlar içerisinde, ahlaki değerlere bağlı, inançlı, manevi değerleri özümsemiş gençleri topluma kazandırma hedefine hizmet etmektedir.

Üniversitemiz, sadece şehrimizde değil bölgemizde ve coğrafyamızda önemli, lider konumunda olan öncü bir üniversite konumundadır. Hedeflerine emin adımlarla yürüyen Üniversitemizin 2018 yılı yatırım programında; eğitim sektöründe 5, sağlık sektöründe 2, spor sektöründe 1, diğer kamu hizmetleri sektöründe ise 2 olmak üzere toplam 10 adet yatırım projesi yer almaktadır. Anılan yatırım projelerine merkezi yönetim bütçesinden 63.030.000,00 ₺, döner sermaye bütçesinden 4.000.000,00 ₺ olmak üzere toplam 67.030.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde bu projelere likit kaynaklarımızdan 20.728.000,00 ₺, gelir fazlası olarak da 207.875,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 87.965.875,00 ₺'ye ulaşmıştır. 2018 yılı sonu itibariyle bu ödeneğin 70.191.275,82 ₺'si harcanmıştır. Bu kapsamda Üniversitemizin; Taşınır Ambarı, Ek Laboratuvar Binası ve 250 Yataklı Çocuk Hastanesi inşaatları devam etmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25. maddesi gereği Üniversitemiz yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmek üzere 2018 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Ali GÜR  
Rektör

## İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ.....	iii
İÇİNDEKİLER .....	iv
ŞEKİLLER TABLOSU .....	vi
GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
1. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri.....	2
2. Yatırımların Finansman Kaynakları .....	4
3. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi .....	4
4. 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı .....	6
5. 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	7
5.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu .....	7
5.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar/Öneriler.....	9
6. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	10
6.2.EĞİTİM SEKTÖRÜ .....	10
6.2.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP) .....	10
6.2.3. Kampüs Altyapısı (GAP).....	14
6.2.4. Muhtelif İşler (GAP).....	16
6.2.3.1. Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Donanım Alımlarına İlişkin Tablolar.....	16
6.2.3.2. Bina Büyük Onarımları Kapsamında Yapılan İşler .....	18
6.2.5. Yayın Alımı (GAP).....	19
6.3 EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ .....	21
6.3.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP).....	21
6.4. SAĞLIK SEKTÖRÜ.....	22
6.4.1. Muhtelif İşler (GAP).....	22

6.4.1.1.	Makine Teçhizat ve Büyük Onarım (Özel Bütçe): .....	22
6.4.1.2.	Makine, Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye): ....	25
6.4.2.	Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m <sup>2</sup> ) .....	25
6.5.	Diğer Kamu Hizmetleri.....	26
6.5.1.	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri .....	26
6.5.2.	Merkezi Araştırma Laboratuvarı .....	28
7.	EKLER.....	29
7.1.	GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (YILSONU).....	29
7.2.	GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI HARCAMALARI YILSONU GERÇEKLEŞME RAPORU .....	31

## ŞEKİLLER TABLOSU

Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler.....	3
Tablo 2: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı.....	4
Tablo 3: Tamamlanan İnşaatlar .....	6
Tablo 4: Devam Eden İnşaatlar .....	7
Tablo 5: 2018 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı .....	8
Tablo 6: 2018 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı .....	8
Tablo 7: 2018 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı .....	9
Tablo 8: 2018 Yılı Tamamlanan İnşaatlar .....	11
Tablo 9: Muhtelif İşler Kapsamında Harcama Birimlerine Alınan Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Yazılım ile Donanım Alımları.....	18
Tablo 10: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları .....	20
Tablo 11: 2016-2018 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları .....	21
Tablo 12: 2018 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu.....	24
Tablo 13: 2018 Yılı İtibariyle BAP Kapsamında Yürütülen Projeler .....	26
Tablo 14: 2018 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Arş. Projelerinin Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı .....	27



## GENEL DEĞERLENDİRME

Üniversitemizin 2015-2019 dönemi stratejik planında; kurumsal misyon, vizyon amaç ve hedefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

### MİSYONUMUZ

Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli insan yetiştiren; bireylere, topluma ve tüm kurum-kuruluşlara eğitim, bilim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında hizmet üreten değişime açık bir üniversite.

### VİZYONUMUZ

Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde uluslararası rekabet kabiliyeti yüksek bir dünya üniversitesi olmak.

## 1. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedefler aşağıda sıralanmıştır. 2018 yılı yatırımlarına da bu amaç ve hedefler doğrultusunda harcama yapılmıştır.

Stratejik Amaç-1 Eğitim Öğretim Kalitesini Yükseltmek	
Hedef-1	Nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine zemin hazırlamak ve üniversitemizin saygınlığını arttırmak için, üniversitenin tanıtımının etkin ve olumlu yönde planlanıp uygulanmasını sağlamak,
Hedef-2	Nitelikli öğretim elemanı sayısını arttırmak,
Hedef-3	Yabancı dil eğitiminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması,
Hedef-4	Disiplinlerarası etkileşimi arttırarak eğitimde sinerji oluşturmak,
Hedef-5	Eğitimde uluslararası işbirliğinin arttırılması,
Hedef-6	E-öğrenim programının yaygınlaştırılması,
Hedef-7	Doktora ve Tıpta Uzmanlık sınavlarında ön sıralarda tercih edilen üniversite olmak için bu öğrencilere bir dönem yurtdışında eğitim imkanı sağlamak,
Hedef-8	Kapalı devre radyo televizyon yayın kalitesinin arttırılması,
Hedef-9	Kitap, elektronik kitap, süreli yayın, veri tabanları ile görsel ve işitsel materyal (DVD, VCD vb.) sayısının arttırılması,
Hedef-10	Ders dışı eğitim ve sertifika programlarının yaygınlaştırılması,
Hedef-11	Uygulama odaklı eğitim modellerinin yaygınlaştırılması,
Hedef-12	Üniversite Eğitim-Araştırma-Hizmet süreçlerinde ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması,
Stratejik Amaç-2 Bilimsel Araştırmaların Nicelik ve Niteliğini Arttırmak	
Hedef-1	Ulusal ve uluslar arası proje yürütme ve ortak olma girişimlerinin teşvik edilmesi,
Hedef-2	Bilimsel yayın sayısının ve kalitesinin arttırılması ile üniversitenin Türkiye' deki diğer üniversiteler arasında bilimsel yayın sıralamasındaki konumunun iyileştirilmesi,
Hedef-3	Üniversitede ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantıların teşvik edilmesi,
Hedef-4	Sanayi ve kamu kuruluşlarıncı desteklenen proje ve tez çalışmalarının arttırılması,
Hedef-5	Bilimsel araştırma projelerinin teşvik edilmesi,
Hedef-6	Patent ve faydalı model sayısının arttırılması,
Stratejik Amaç-3 Toplumun Sunulan Hizmetleri Geliştirmek	
Hedef-1	Araştırma ve Uygulama Hastanesinin verdiği hizmetlerin geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması
Hedef-2	Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde Onkoloji, Kardiyoloji Enstitüleri kurulması, ayrıca çalışmasına başlanmış olan yanık tedavi merkezinin kurulması,
Hedef-3	Yurtdışına açılmak konusundaki çalışmalara ivme kazandırmak, özellikle komşu ülkelerden hastalara sağlık hizmeti verecek ilimizde sağlık turizminin geliştirilmesi,
Hedef-4	Üniversitenin tanıtım materyallerinin çeşitliliğinin ve sayısının arttırılması, ayrıca görsel, işitsel ve e-haber olarak olumlu haber sayısının arttırılması,



Hedef-5	Ulusal ve uluslar arası sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin arttırılması,
Hedef-6	E-öğrenme sisteminin topluma hizmet verebilecek şekilde oluşturulması,
<b>Stratejik Amaç-4 Üniversitemiz Yerleşkelerinin Fiziksel Alan ve Altyapılarını Geliştirmek</b>	
Hedef-1	Üniversitemizin bina inşaatları ile altyapı ve yenileme çalışmalarının yapılması,
Hedef-2	Çocuk Hastanesinin kurulması,
Hedef-3	Bilimsel Teknolojik Araştırma Merkezi (GÜBTAUM) kurulması,
Hedef-4	Üniversitemiz personel ve öğrencilerin sportif faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli spor alanlarının oluşturulması,
Hedef-5	Kampüste Atlı Yaşam Projesini faaliyete geçirerek atların ve faytonların bulunduğu doğal bir kampüs oluşturmak,
<b>Stratejik Amaç-5 Öğrencilerin Sosyal-Kültürel ve Akademik Gelişimlerini Arttırmak</b>	
Hedef-1	Öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini etkili ve kapsamlı hale getirmek,
Hedef-2	Öğrencilerin beslenme, ulaşım ve güvenlik gibi konularda yaşam koşullarını iyileştirmek,
Hedef-3	Öğrencilere yönelik düzenlenen kültürel ve sosyal (Tiyatro, sinema vb.) etkinliklerin arttırılması,
Hedef-4	Maddi imkânları kısıtlı olan öğrencilere destek olunması amacıyla kısmi zamanlı olarak çalıştırılmaları,
Hedef-5	Öğrencilerin sosyal donanımlarının arttırılarak, sosyal projelere katılımının sağlanması,
Hedef-6	Engelli öğrenci şartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması,
Hedef-7	Yabancı uyruklu öğrencilerin iletişim ve uyum sorunlarının giderilmesi amacıyla Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisinin kurulması,
Hedef-8	Öğrencilerin ihtiyaçlarını daha modern ortamda hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla öğrenci yaşam merkezlerinin kurulmasının sağlanması,
Hedef-9	Toplumsal Duyarlılık Projelerine katılımın yaygınlaştırılması,
<b>Stratejik Amaç-6 Kurumsallaşmanın Güçlendirilmesini Sağlamak</b>	
Hedef-1	İnsan kaynakları yönetiminin hayata geçirilmesi ile işgücü planlaması yapılarak hizmetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesinin sağlanması,
Hedef-2	Hizmet alanlarının memnuniyetinin arttırılması,
Hedef-3	Hizmet verenlerin memnuniyetinin arttırılması,
Hedef-4	Akademik ve idari personele hizmet alanları ile ilgili eğitim verilerek; Üniversitemizin kalitesini arttırma, küresel rekabet, sosyal değişime meydan okuma ve teknolojik ilerlemenin iş tasarımıındaki değişimle birleştirmesini sağlamak,
Hedef-5	Tüm personelin bilgiye ve bilgilendirmeye erişimini kolaylaştırmak,
Hedef-6	Personelin ödüllendirilmesi için objektif bir değerlendirme sistemi kurmak ve uygulamak,
Hedef-7	İç kontrol sisteminin kurulmasının sağlanması,
Hedef-8	Üniversitenin kurumsal ve idari süreçlerinin iyileştirilmesi,

**Tablo 1:** Stratejik Amaç ve Hedefler

## 2. Yatırımların Finansman Kaynakları

2018 yılı yatırım programında bulunan 10 adet yatırım projesi için; 2018 yılı Bütçe Kanunu ile 63.030.000,00 ₺ döner sermaye bütçesinden ise 4.000.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, toplam yatırım ödeneğimiz 67.030.000,00 ₺ olmuştur. Yıl içinde likit karşılığı 20.728.000,00 ₺ ve gelir fazlası 207.875,00 ₺ olmak üzere toplam 20.935.875,00 ₺ ödenek eklenmiş olup, 2018 yılı sonu itibariyle toplam ödenek 87.965.875,00 ₺'ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 70.191.275,82 ₺'si harcanmış, harcama oranı ise % 80 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemize verilen 67.030.000,00 ₺'lik başlangıç yatırım ödeneğinin 54.480.000,00 ₺' si hazine yardımı, 8.550.000 ₺' si öz gelir ve 4.000.000 ₺' si döner sermaye ödeneğinden oluşmaktadır. 2018 yıl sonu itibariyle hazine yardımı, öz gelir, likit kaynaklar ve döner sermaye ödeneklerinin dağılımı ve harcamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı (Bin ₺)				
Finans Kaynağı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı (%)
Hazine Yardımı	54.480	54.480	61.988	82
Likit Kaynaklar	0	20.936		
Öz Gelir	8.550	8.550	8.203	96
<b>Bütçe Toplamı</b>	<b>63.030</b>	<b>83.966</b>	<b>70.191</b>	<b>84</b>
Döner Sermaye	4.000	4.000	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>67.030</b>	<b>87.966</b>	<b>70.191</b>	<b>80</b>

Tablo 2: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı

## 3. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi

Gaziantep Üniversitesinin temeli, 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümüne dayanmaktadır. 27 Haziran 1987 yılında, 3389 sayılı yasa ile bugünkü statüsüne kavuşan Üniversitemiz zaman içerisinde hızla büyüyerek bugün itibariyle; 16 Fakülte, 4 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 5 Enstitü, 26 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 5 Rektörlüğe Bağlı Birim, 1.591 akademik, 1.469 idari ve 51.478 öğrencisi ile sadece bölgenin değil ülkemizin sayılı üniversiteleri arasına girmiş bulunmaktadır. Gaziantep Üniversitesinin toplam yüzölçümü 3.450.158,68 m<sup>2</sup>, toplam kapalı alanı ise 480.993 m<sup>2</sup>'dir. Üniversitemizin toplam 8 adet yerleşkesi bulunmaktadır. Merkez kampüste 88 adet lojman bulunmakta olup bu lojmanların 8 tanesi dubleks, 16 tanesi 2+1, geriye kalan 64 tanesi ise 3+1'dir.



Üniversitemiz sağlık hizmetlerini Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi aracılığıyla sunmaktadır. Hastanemiz alanında Türkiye'nin en iyi araştırma ve uygulama hastanelerinden biri olup; şehrimizin ve bölgemizin ve hatta

komşu ülkelerin sağlık sorunlarına çözüm üretmektedir. 1.061 yatak kapasiteli hastanemizde günlük ortalama 2.000 civarında poliklinik hizmeti verilmekte, yılda 34.000'in üzerinde de ameliyat yapılmaktadır.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde bulunan Gün Hastanesi; gününbirlik tedavi edilebilecek hastaların daha hızlı ve seri bir şekilde işlemlerinin yapılmasını sağlamak amaçlı kurulan gün hastanesi de bölgede ilk olma özelliği taşımaktadır. Kendi içinde ameliyathaneleri ve konforlu klinik imkânlarını mevcuttur.



Güneydoğunun ilk kanser hastanesi olan Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Gaziantep'te hayırseverimizin büyük katkılarıyla 2006 yılında yapılmıştır. 102 yatak kapasiteli olan Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi; en modern ve en gelişmiş radyoterapi ve kemoterapi cihazlarıyla, her türlü kanserin teşhis ve tedavi uygulamasını yapabilecek donanıma sahiptir. Hastaların tanı tedavi sürecinin hızlı olabilmesi amacıyla bünyesinde laboratuvar hizmeti veren

hastanemiz sadece Gaziantep ve çevre illerin değil komşu ülkelerden gelen hastaların da umut ışığı olmuştur.



Diş Hekimliği Fakültesi, 31.10.2006 tarihinde 26332 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kurulmuştur. 2008 yılının Nisan ayında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi

binasında eğitim-öğretim ve tedavi hizmetine başlamıştır. Kasım 2012 itibariyle de 16.370 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip yeni binasına taşınan Diş Hekimliği Fakültemiz burada hizmet vermeye başlamıştır. Fakültemiz; Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Periodontoloji, Pedodonti, Endodonti, Diş Hastalıkları ve Tedavisi ile Ağız, Diş ve Çene Radyoloji Anabilim Dallarında ilimiz ve çevre illerden gelen hastalara hizmet vermektedir.

#### 4. 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemizde 2018 yılında ısı galerileri tadilat ve onarım işi, Nurdağı ihata duvarı ve tel çit yapımı işi, acil beceri ve simülasyon laboratuvarı tadilatı işi, bina aydınlatma yapım işi, asansör tadilatları yapım işi ve bina tadilat ve onarımları yapım işleri tamamlanmıştır. Bununla birlikte; meydan düzenlemesi yapım işi, Maveria Kültür ve Kongre Merkezi tadilatı, Uzaktan Eğitim Merkezi tadilatı, Diş Hekimliği su deposu inşaatı ve Sporium Halı Saha yapım işlerine ve kapalı alanı 5.040 m<sup>2</sup> olan Tıp Fakültesi Ambar Binası, 30.440 m<sup>2</sup> olan 250 Yataklı Çocuk Hastanesi ve 400 m<sup>2</sup> olan Ek Laboratuvar Binası İnşaatlarına devam edilmektedir.

Yatırım projeleri kapsamında 2018 yılında tamamlanan ve devam eden inşaatlar aşağıda gösterilmiştir.

TAMAMLANAN İNŞAATLAR VE İŞLER				
İnşaatın/İşin Adı	Toplam Maliyeti (₺)	Kapalı alanı (m <sup>2</sup> )	İnşaatın Başlangıç/Bitiş Tarihi	Tamamlanma Süresi (ay)
1-Isı Galerileri Tadilat ve Onarımı İşİ	853.952,95		09.02.2018-23.07.2018	6
2-Nurdağı İhata Duvarı ve Tel Çit Yapımı İşİ	321.121,67		02.07.2018-24.10.2018	4
3-Acil Beceri ve Simülasyon Laboratuvarı Tadilatı İşİ	614.329,42		31.08.2018-14.10.2018	2
4-Bina Aydınlatma Yapım İşİ	1.014.438,50		24.09.2018-05.10.2018	1
5-Asansör Tadilatları Yapım İşİ	965.287,20		20.08.2018-20.11.2018	3
6-Bina Tadilat ve Onarımları Yapım İşİ	6.476.769,58		19.06.2018-19.12.2018	7
7-Makine-Teçhizat Büyük Onarımları İşİ	9.876.000,00		01.01.2018-31.12.2018	12
<b>TOPLAM</b>	<b>19.156.612,12</b>			

Tablo 3: Tamamlanan İnşaatlar ve İşler

DEVAM EDEN İNŞAATLAR VE İŞLER				
İnşaataın Adı	İhale Bedeli (KDV Dâhil )	Kapalı alanı (m2)	İnşaataın Başlangıç/Bitiş Tarihi	Tamamlanma Oranı (%)
1-Tıp Fakültesi Ambar Binası İnşaataı	5.898.324,40	5.040	09.01.2018-16.01.2019	28
2- 250 Yataklı Çocuk Hastanesi Bina İnşaataı	61.865.000	30.440	10.07.2017-20.07.2019	59
3-Ek Laboratuvar Binası İnşaataı	1.436.190,98	400	24.10.2018-20.02.2019	11
4-Meydan Düzenlenmesi Yapım İşi	5.408.549,84		10.07.2018-07.11.2018	98
5-Mavera Kültür ve Kongre Merkezi Tadilatı	2.298.640,00		25.09.2018-23.03.2019	20
6-Uzaktan Eğitim Merkezi Tadilatı	1.372.340,00		19.10.2018-18.01.2019	46
7-Dış Hekimliği Su Deposu İnşaataı	396.012,58		07.11.2018-07.01.2019	78
8-Sporium Halı Saha Yapım İşi	587.994,94		21.09.2018-21.12.2018	98
<b>TOPLAM</b>	<b>79.263.052,74</b>	<b>35.880</b>		

Tablo 4:Devam Eden İnşaataılar ve İşler

## 5. 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları

### 5.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım projelerinin harcamaları için bütçeden 63.030.000,00 ₺ ve döner sermaye bütçesinde ise 4.000.000,00 ₺ ödenek verilerek toplam ödenek 67.030.000,00 ₺ olmuştur. Yıl içinde bu ödeneğe 20.935.875,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 87.965.875,00 ₺ ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 70.191.275,82 ₺' si yıl içinde 10 adet yatırım projesi için harcanmış ve harcama oranı % 80 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında bütçemize 1 adet T-15 Tıbbi Donanımlı Ambulans alımı için Cumhurbaşkanlığından gerekli izinler alınmış, ancak ödenek yetersizliğinden dolayı alım yapılamamıştır.

### 2018 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin ₺)

Sektör Adı	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Eklenecek Ödenek	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Projenin Durumu
EĞİTİM SEKTÖRÜ	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	200	0	200	108	Tamamlandı
	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	7.400	-5.400	2.000	1.778	Tamamlandı
	Muhtelif İşler (GAP)	12.400	9.215	21.615	18.764	Tamamlandı
	Kampüs Altyapısı (GAP)	3.500	6.400	9.900	6.766	Devam Ediyor
	Yayın Alımı (GAP)	1.500	220	1.720	1.720	Tamamlandı
SPOR SEKTÖRÜ	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	6.800	0	6.800	213	Devam Ediyor
SAĞLIK SEKTÖRÜ	Muhtelif İşler	8.000	2.051	10.051	9.866	Tamamlandı
	Döner Sermaye (*)	4.000	0	4.000	0,00	
	Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m2)	15.000	8.450	23.450	22.746	Devam Ediyor
	Döner Sermaye (*)	0	0	0	0	
D.K.H. SEKTÖRÜ	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	7.230	0	7.230	7.230	Tamamlandı
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.000	0	1.000	1.000	Tamamlandı
<b>TOPLAM</b>		<b>67.030</b>	<b>20.936</b>	<b>87.966</b>	<b>70.191</b>	

(\*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.

**Tablo 5:** 2018 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı

### 2018 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin ₺)

Sektör Adı	Proje Sayısı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
Eğitim	5	25.000	35.435	29.136	82
Spor	1	6.800	6.800	213	3
Sağlık (*)	2	27.000	37.501	32.612	87
D.K.H	2	8.230	8.230	8.230	100
<b>TOPLAM</b>	<b>10</b>	<b>67.030</b>	<b>87.966</b>	<b>70.191</b>	<b>80</b>

(\*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.

**Tablo 6:** 2018 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı



## 2018 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı (Bin ₺)

Sektör Adı	Proje Sayısı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
Devam Eden Projeler	3	25.300	40.150	29.725	74
Tamamlanan Projeler	7	41.730	47.816	40.466	85
<b>TOPLAM</b>	<b>10</b>	<b>67.030</b>	<b>87.966</b>	<b>70.191</b>	<b>80</b>

(\* Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.

**Tablo 7:** 2018 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı

## 2018 Yılı Yatırım Projelerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödeneklerin Dağılımı ve Harcama Durumu (Bin ₺)

EKO KOD	AÇIKLAMA	2018 Yılı Bütçe Ödeneği	Eklenen	Düşülen	2018 Yılı Toplam Ödeneği	Yıl Sonu Harcama	Harcama Oranı (%)
06.1	Mamul Mal Alımları	17.405	2.690	0	20.095	19.910	99
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.150	0	0	1.150	1.150	100
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	200	0	0	200	59	30
06.5	Gayri Menkul Ser. Ürt. Gid.	38.980	9.450	6.080	42.350	31.611	75
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0	135	0	135	127	94
06.7	Gayri Menkul Büyük Onr. Gid.	4.945	14.741	0	19.686	16.984	86
06.9	Diğer Sermaye Giderleri	350	0	0	350	350	100
<b>TOPLAM</b>		<b>63.030</b>	<b>27.016</b>	<b>6.080</b>	<b>83.966</b>	<b>70.191</b>	<b>84</b>
<b>Döner Sermaye Ödeneği</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>67.030</b>	<b>27.016</b>	<b>6.080</b>	<b>87.966</b>	<b>70.191</b>	<b>80</b>

### 5.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar/Öneriler

- ❖ Yatırım tavanlarının belirlenmesi sürecinde, yatırımcı kuruluşlar ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile daha fazla görüşme yapılarak sürdürülebilir yatırım tavanlarının ortaya çıkması sağlanabilir. Bu yolla hem yıl içinde yatırımların aksamadan yürütülmesi sağlanacak hem de yıl içinde oluşacak yedek ödenek talepleri de en aza indirilebilecektir.
- ❖ Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve mevsimsel şartlar Strateji ve Bütçe Başkanlığınca göz önüne alınır ve buna göre ödenek oranı belirlenirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir.

- ❖ Ayrıntılı Finans Programının sadece ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde hazırlanması 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine uygun olacaktır.
- ❖ Ödenek tavanları belirlenmesi sürecinde objektif kriter belirlenerek, bu kriterlerin bütçe hazırlayan kurumlara duyurulması halinde daha reel duruma uygun bütçeler ortaya çıkacaktır.
- ❖ Kurumların, öz gelirlerini yatırım bütçesine tam olarak yansıtma imkanı sağlanmalıdır.

## 6. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

Üniversitemiz 2018 Yılı Yatırım Programında 10 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Bunların altısı eğitim, ikisi sağlık, ikisi de diğer kamu hizmetleri sektöründe yer almaktadır. Aşağıda bu projelerin yıl içindeki uygulamaları belirtilmiştir.

### 6.2.EĞİTİM SEKTÖRÜ

#### 6.2.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2018H030790	
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	İnşaat ve ihale aşaması için hazırlık yapılması ve projelendirme işlerinin yapılması.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Etüt-Proje ve Müşavirlik	
Başlama-Bitiş Tarihi	2018- 2018	
Projenin Yılı Ödeneği	200.000	200.000
Yapılan Harcama (₺)	108.442,00	

Bu proje kapsamında; 2018 Bütçe Kanunu ile hazine yardımıdan 200.000,00 ₺ ödenek verilmiş ve yıl içerisinde herhangi bir ekleme yapılmamıştır. Bu ödenekten 2018 yılı sonunda 108.442,00 ₺ harcanmış ve harcama oranı % 54 olmuştur.

Proje kapsamında; deprem performans analizi ve imar planı hazırlama işi ve Yüksekokul mekanlarının envanter sınıflandırılması işleri yaptırılmıştır.



## 6.2.2. Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	1988H031310	
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Her yıl yeni açılan akademik birimlerin bina ihtiyaçlarını karşılamak ve kapasitesi yetiştirmeyen binalara ek bina yapımını sağlamak	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Tıp Fakültesi Ambar Binası (5040 m <sup>2</sup> ), Ek Laboratuvar Binası (400 m <sup>2</sup> )	
Başlama-Bitiş Tarihi	1988 - 2018	
Projenin Yılı Ödeneği	7.400.000	2.000.000
Yapılan Harcama (₺)	1.778.155,58	

Bu proje kapsamında; 2018 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 7.400.000,00 ₺ ödenek verilmiş olup anılan ödenekten 5.400.000,00 ₺ ödenek merkezi kampüs projesine aktarılmıştır. Geriye kalan 2.000.000,00 ₺'lik ödenekten 2018 yılı sonu itibarıyla 1.778.155,58 ₺ harcama yapılmış ve harcama oranı % 89 olmuştur. Proje kapsamında; Tıp Fakültesi Ambar Binası İnşaatı %28, 250 Yataklı Çocuk Hastanesi Bina İnşaatı %59, Ek Laboratuvar Binası ise %11 oranında tamamlanmıştır.

DEVAM EDEN İNŞAATLAR				
İnşaatın Adı	Toplam Maliyet	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )	İnşaatın Başlangıç/Bitiş Tarihi	Fiziki Gerçekleşme (%)
1-Tıp Fakültesi Ambar Binası	5.898.324	5.040 m <sup>2</sup>	09.01.2018-16.01.2019	28
2- 250 Yataklı Çocuk Hastanesi Bina İnşaatı	61.865.000	30.440	10.07.2017-20.07.2019	59
3-Ek Laboratuvar Binası İnşaatı	1.436.190,98	400 m <sup>2</sup>	24.10.2018-20.02.2019	11
<b>TOPLAM</b>	<b>69.199.514,98</b>	<b>35.880</b>		

Tablo 8: 2018 Yılı Devam Eden İnşaatlar

## Tıp Fakültesi Ambar Binası İnşaatı

İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	5.898.324,00 ₺
2018 Yılı Harcaması	1.615.338,80 ₺
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	09.01.2018-16.01.2019
İnşaatın Kapalı Alanı	5.040m <sup>2</sup>
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%28
<b>AÇIKLAMA</b>	Bina; bodrum, zemin, birinci ve ikinci kattan oluşmaktadır. Bodrum katta; arşiv, depo, teknik oda, mescit, Zemin katta; 8 adet ofis, 2 adet temizlik odası bay-bayan wc, Birinci Katta; 8 adet ofis, bay-bayan wc, İkinci Katta ise; 8 adet ofis ve bay-bayan wc bulunmaktadır.



## 250 Yataklı Çocuk Hastanesi Bina İnşaatı

İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	61.865.000,00 ₺
2017 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	5.941.333,02 ₺
2018 Yılı Harcaması	22.745.709,50 ₺
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	10.07.2017-20.07.2019
İnşaatın Kapalı Alanı	30.440 m <sup>2</sup>
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%59
<b>AÇIKLAMA</b>	Daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek ve çocuk hastalara daha geniş yerde kaliteli sağlık hizmeti vermek amacıyla 30.440m2 bir alanda çocuk hastanesi yapımı hedeflenmiş ve inşaat başlanmıştır. Projenin %58.80 tamamlanmış ve halen inşaat devam etmektedir.



Ek Laboratuvar Bina İnşaatı	
İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	1.436.190,98 ₺
2018 Yılı Harcaması	1.436.190,98 ₺
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	24.10.2018-20.02.2019
İnşaatın Kapalı Alanı	400 m <sup>2</sup>
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%11
<b>AÇIKLAMA</b>	Binada 5 adet laboratuvar bulunmaktadır.



### 6.2.3. Kampüs Altyapısı (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	1991H030810	
Proje Adı	Kampüs Alt yapısı (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversite alt yapısının iyileştirilmesi, yeni yapılan binalarda altyapı çalışmalarının yapılması	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Üniversitelerin altyapısının iyileştirilmesi, yeni kurulan ve yapılan binalarda altyapı çalışmalarının ve tadilatlarının yapılması	
Başlama-Bitiş Tarihi	1991 -2020	
Projenin Yılı Ödeneği	3.500.000,00	9.900.000
Yapılan Harcama (₺)	6.766.440,98	



Bu proje kapsamında; 2018 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 3.500.000,00 ₺ ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içerisinde Merkezi Derslik ve İdari Birimler projesinden 5.400.000,00 ₺ ödenek aktarma, ayrıca 1.000.000,00 ₺ likit karşılığı olmak üzere toplam 6.400.000,00 ₺ tutarında bir ekleme yapılmıştır. Bu ödenekten 2018 yılı sonunda 6.766.440,98 ₺ harcanmış olup, harcama oranı % 68 olarak gerçekleşmiştir.

Bu proje kapsamında; G.Ü ısı kazanlarının bakım ve onarımı, su kuyusu bakım ve onarımı ve brülör alımı, kampüs peyzaj düzenlemesi, Beden Eğitimi Spor Yük. klima sistemi tadilatı, kampüsün birçok yerine sulama sistemi ve fıskiye yaptırılması, Sporium çevresi sulama sistemi yapımı, ısı santraline filtrasyon sistemi ve kızgın su kazanlarının bakım ve onarımı, kampüs içerisinde bulunan parklarda pergule ve çöp kovalarının ahşaplarının yenilenmesi ve boyanması, kampüs içerisindeki ana su deposuna vana takılması ve membran değişimi, 15 Temmuz Yerleşkesinde bulunan sondaj kuyusu bakımı ve onarımı, Mavera Kongre ve Kültür Merkezine su deposu yapımı işlerine ait ödemeler bu projeden yapılmıştır. Ayrıca Meydan Düzenlemesi İhalesinin 1. ve 2. Hakedişi, ısı galeri tadilat ve onarım işinin son hakedişi, Nurdağı ihata duvarı ve tel çit yapımı işinin hakedişi, Dış Hekimliği su deposu yapım işinin 1. ve 2. hakediş ödemeleri yapılmıştır. Diğer taraftan Nurdağı Meslek Yüksekokulu Seralarından alınan çiçek fidelerinin ödemeleri de bu projeden yapılmıştır.



#### 6.2.4. Muhtelif İşler (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2018H030800	
Proje Adı	Muhtelif İşler ( GAP )	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversitenin makine-teçhizat, bilgi teknolojileri, bina onarım ve taşıt ihtiyacını temin etmek.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Taşıt: T-15 ( 1 adet)	
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018	
Projenin Yılı Ödeneği	12.400.000	21.614.875
Yapılan Harcama (₺)	18.764.123,48	

Bu proje kapsamında; 2018 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 12.400.000,00 ₺ ödenek verilmiş, anılan toplu projeye likit karşılığı 9.214.875,00 ₺ ödenek eklenmiştir. Yapılan ekleme sonucu toplam ödenek 21.614.875,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten yılsonunda 18.764.123,48 ₺ harcanmış olup, harcama oranı % 87 olarak gerçekleşmiştir. Proje ile; Makine teçhizat alımları için 2.568.789,75 ₺, donanım alımları için 2.489.096,28 ₺, bilgisayar ve yazılım alımları için 502.064,58 ₺, makine teçhizat büyük onarımları için 127.132,51 ₺. Bina büyük onarımları için 13.077.040,38 ₺ olmak üzere toplam 18.764.123,48 ₺ harcama yapılmıştır.

### 6.2.3.1. Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Donanım Alımlarına İlişkin Tablolar

DONANIM ALIMLARI		
Sıra No	BİRİMLER	Harcanan Bütçe
1	Rektörlük	389.518,58
2	Fen Edebiyat Fakültesi	28.739,72
3	Hukuk Fakültesi	218.978,58
4	Diş Hekimliği Fakültesi	32.761,52
5	Güzel Sanatlar Fakültesi	3.020,80
6	İlahiyat Fakültesi	392.306,52
7	Mimarlık Fakültesi	188.487,72
8	Makine Mühendisliği	4.779,00
9	Metaller ve Malzeme Mühendisliği Bölümü	44.547,50
10	Naci Topçuoğlu MYO	67.457,77
11	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	416.157,10
12	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	3.132,00
13	Uluğbey Yük.Tekn.Uyg.ve Araşt.Merk.Md.	89.333,74
14	Atatürk Kültür Merkezi	573.345,00
15	Üniversite Geneli( Merkez Ambarı )	36.530,73
<b>TOPLAM</b>		<b>2.489.096,28</b>

MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI		
Sıra No	BİRİMLER	Harcanan Bütçe
1	Rektörlük	73.505,60
2	Genel Sekreterlik	17.641,00
3	Fen Edebiyat Fakültesi	15.000,16
4	Hukuk Fakültesi	110.212,00
5	Diş Hekimliği Fakültesi	202.794,55
6	Tıp Fakültesi	61.154,92
7	İlahiyat Fakültesi	35.400,00
8	Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi	1.416,00
9	Metaller ve Malzeme Mühendisliği Bölümü	71.004,14
10	Oğuzeli MYO	61.992,48
11	İslâhiye MYO	16.200,00
12	Naci Topçuoğlu MYO	176.469,00
13	Araban MYO	28.500,66
14	Teknik Bil. Meslek Yüksekokulu	4.956,00
15	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	6.832,20
16	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	627.250,24
17	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	20.709,00
18	Matbaa ve Basım İşleri Müdürlüğü	18.880,00
19	Uluğbey Yük.Tekn. Uyg.ve Araşt .Merk. Md.	364.742,59
20	Atatürk Kültür Merkezi	85.142,28
21	Mavera Kongre ve Sanat Merkezi	120.205,60
22	Seyirtepe Eğitim Uygulama Çalışma Merkezi	1.800,00
23	Üniversite Geneli( Merkez Ambarı )	245.882,33
24	Naci Topçuoğlu MYO.	201.099
<b>TOPLAM</b>		<b>2.568.789,75</b>

BİLGİSAYAR VE YAZILIM ALIMLARI		
Sıra No	BİRİMLER	Harcanan Bütçe
1	Rektörlük	21.653,00
2	Eğitim Bilimleri Enstitüsü	20.532,00
3	Naci Topçuoğlu MYO.	8.968,00
4	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	55.849,40
5	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	248.685,00
6	Evrak Arşiv İşletme Müdürlüğü	13.434,84
7	Üniversite Geneli(Merkez Ambarı)	132.942,34
<b>TOPLAM</b>		<b>502.064,58</b>

**Tablo 9:** Muhtelif İşler Kapsamında Harcama Birimlerine Alınan Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Yazılım ile Donanım Alımları

#### 6.2.3.2. Bina Büyük Onarımları Kapsamında Yapılan İşler:

Bu alt proje kapsamında; eşanjör malzemesi alımı, çarşı kompleksi ve Naci Topçuoğlu MYO. tadilatı, Hastane önü ATM değişimi, asansör malzemesi alımı, telefon santrali tamir ve bakımı, A.K.M tadilatı, Seyirtepe Tesisleri tadilatı, Rektörlük konutu tadilatı, Kamera Bakım Sözleşmesi 1-2-3 ödemesi, lojmanlarda rüzgarlık ve çevre düzenlemesi yapılması, Rektörlük otoparkı çatı yapımı, Tıp Fakültesi simülasyon laboratuvarı tadilatı, kamera ve güç kaynağı bakım ve onarımı, Rektörlük lojmanı elektrik tesisatı montajı, Rektörlük otopark düzenlemesi ve devam eden bina tadilat ve onarımları ihalesinin 1-2-3-4 hakediş bedeli, acil beceri ve simülasyon laboratuvarı ihalesinin hakediş ödemesi, asansör tadilatı ihalesinin 1-2 hakediş ödemesi, bina aydınlatma işi ihalesinin hakediş ödemesi, Uzaktan Eğitim Merkezi tadilatı ihalesinin 1-2 hakediş ödemesi, Mavera Kültür ve Kongre Merkezi tadilatı ihalesinin 1-2 hakediş ödemeleri, Yabancı Diller Yüksekokulu data sistemi, ana besleme hattı yapılması ve telefon tesisatı tadilatı, İlahiyat Fakültesi çatısında bulunan olukların tadilatı, Sağlık Bilimleri MYO.'na klima sistemi yapılması, Cenani Konağı mutfak klima ve sergi salonu tadilatı, Naci Topçuoğlu MYO. klima onarımı, personel yemekhanesine cam takılması işleri yaptırılmıştır.





### 6.2.5. Yayın Alımı (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2018H030810	
Proje Adı	Yayın Alımı (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversitemizdeki akademik personel ve öğrencilerimizin dünyadaki bilimsel gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yayınları takip edebilmesi ve çalışmalarında kullanacakları her türlü ortamdaki bilgiye erişmeleri için gerekli yayınların (basılı ve elektronik ortamda) sağlanmasıdır.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Yayın Alımı	
Başlama-Bitiş Tarihi	01.01.2018-31.12.2018	
Projenin Yılı Ödeneği	1.500.000	1.720.000
Yapılan Harcama (₺)	1.719.453,05	

Bu proje kapsamında; 2018 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 1.500.000,00 ₺ ödenek verilmiş, yıl içinde likit karşılığı olarak 220.000,00 ₺ tutarında ekleme işlemi yapılarak toplam ödenek 1.720.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten 2018 yılı sonunda

1.719.453,05 ₺ harcanmış olup, harcama oranı %99 olarak gerçekleşmiştir. Harcanan ödenek ile; 27 adet veri tabanı ödemesi, 1.005 adet Türkçe, 62 adet Yabancı dilde olmak üzere toplam 1.067 adet basılı yayın, 89 adet DVD (Bluray-3D) alımı yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemizin satın aldığı ve abone olduğu veri tabanlarına ilişkin bilgiler aşağıda tablolandırılmıştır.

SATIN ALINAN VE ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI			
SIRA NO	VERİ TABANI ADI	KONUSU	HARCAMA BEDELİ
1	American Pyhsics Society	Fen Bilimleri	28.077,65
2	ASTM	Fen Bilimleri	65.171,26
3	ArtStor	Sosyal Bilimler	12.068,34
4	BeckOnline	Sosyal Bilimler	50.222,25
5	British Standart Online Library	Genel	93.447,20
6	Cambridge University Press	Sosyal Bilimler	34.983,46
7	Clinical Key	Tıp	127.949,43
8	The Cochrane Library	Tıp	17.096,88
9	Dentistry& Oral Sciences Source	Tıp	53.609,18
10	Derwent Innovation İndex	Fen Bilimleri	25.872,15
11	Ebrary (Prorequest)	Genel (e-kitap)	53.154,36
12	Elsevier e-book	Genel ( e kitap)	276.242,40
13	HukukTürk	Sosyal Bilimler	2.361,38
14	İdealonline	Genel	10.100,00
15	Institute of Physics (IOP)	Fen Bilimleri	75.354,46
16	Journal Citation Report	Sosyal Bilimler	39.569,38
17	McGraw Hill Access Engineering	Fen Bilimleri (e-kitap)	32.191,24
18	McGraw Hill Access Medicine	Tıp (e-kitap)	77.009,32
19	Oxford English Dictionary	Sosyal Bilimler	19.980,20
20	Oxford Online Jurnals	Genel	77.426,22
21	Passport GM	Sosyal Bilimler	53.164,38
22	Primal Pictures	Tıp	38.453,23
23	Proquest Central	Genel	183.197,84
24	Reaxys	Fen Bilimleri	73.113,35
25	SOBİAD	Sosyal Bilimler	9.350,00
26	Summon	Keşif Aracı (Arama)	40.522,73
27	Uptodate	Tıp	98.429,55
<b>GENEL TOPLAM (₺)</b>			<b>1.668.117,84</b>

Tablo 10: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları

## 2016-2018 YILLARI ARASI TOPLAM KÜTÜPHANE KAYNAKLARI

	2016			2017			2018		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	132.565	145.880	278.445	136.956	147.416	284.372	138.918	179.604	318.522
Dergi Aboneliği	47	56.435	56.482	53	59.672	59.725	49	66.818	66.867
Tez	2.223	4.145.699	4.147.922	2.478	4.581.911	4.584.389	2.782	4.774.783	4.777.565
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	-	41*	41*	-	45*	45*		42*	42*
Standartlar	17.113	159.632	176.745	17.719	170.163	187.882	17.719	180.306	198.025
DVD-VCD (Bluray-3D)	2.324	-	2.324	2.436	-	2.436	2.525	-	2.525
<b>TOPLAM</b>	<b>154.272</b>	<b>4.507.646</b>	<b>4.661.918</b>	<b>159.642</b>	<b>4.959.162</b>	<b>5.118.804</b>	<b>161.993</b>	<b>5.201.511</b>	<b>5.363.504</b>

(\*)15 adet veri tabanı ULAKBİM/EKUAL kapsamında üniversitemizin erişimine açıktır.

Tablo 11: 2016-2018 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları

## 6.3 EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

### 6.3.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2016H051040	
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ( GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim - Beden Eğitimi ve Spor	
Proje Amacı	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerine eğitim amaçlı kullanılmak ve spor faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Spor Salonu (3.400 m <sup>2</sup> )	
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2020	
Projenin Yılı Ödeneği	6.800.000	6.800.000,00
Yapılan Harcama (₺)	212.678,96	

Bu proje kapsamında; 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 6.800.000,00 ₺ ödenek verilmiş olup yıl içerisinde herhangi bir ekleme işlemi yapılmamıştır. Proje kapsamında üniversitemizin taşra kampüslerinde 2 adet Kapalı Spor Salonu yapılması planlanmış ancak yıl içerisinde yapılan değerlendirmeler neticesinde bu alanlara birer kapalı halı saha yapılmasına karar verilmiştir. Bu projeden 2018 yılı sonunda toplam 212.678,96 ₺ harcama yapılarak harcama oranı %1 olarak

gerçekleşmiştir. Bu proje kapsamında; Sporium halı saha yapımı ihalesinin 1 nolu hakediş ödemesi yapılmıştır.

## 6.4. SAĞLIK SEKTÖRÜ

### 6.4.1. Muhtelif İşler (GAP)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2018I000270	
Proje Adı	Muhtelif işler (Makine Teçhizat Büyük Onarımlar)	
Sektör/ Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Sağlık Alanında İyileştirme	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Büyük Onarım	
Başlama-Bitiş Tarihi	01.01.2018-31.12.2018	
Projenin Yılı Ödeneği	8.000.000 (4.000.000,00 Döner Sermaye)	10.051.000
Yapılan Harcama (₺)	9.866.272,27	

Proje kapsamında; 2018 Yılı Bütçe Kanunu ile hastaneye makine teçhizat alımları için 5.000.000 ₺, büyük onarımları için 2.825.000,00 ₺ ve taşıt alımları için 175.000,00 ₺ olmak üzere toplam 8.000.000 ₺ ödenek verilmiştir. Yıl içinde likit karşılığı olarak 2.051.000,00 ₺ ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 10.051.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten 2018 yılı sonunda 9.866.272,27 ₺ harcama yapılmış olup, harcama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca kaynağı döner sermayeden olmak üzere projeye yatırım programıyla 4.000.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde döner sermaye kaynağından herhangi bir harcama yapılmamıştır.

#### 6.4.1.1. Makine Teçhizat ve Büyük Onarım (Özel Bütçe):

Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programına; hastanenin makine teçhizat alımları, taşıt alımları ile bina büyük onarımları için 8.000.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde bu ödeneye likit karşılığı olarak 2.051.000,00 ₺ ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 10.051.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten 2018 yılı sonu itibarıyla 9.866.272,27 ₺ tutarında harcama yapılmış ve harcama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir.

#### ❖ Makine-Teçhizat Alımları:

Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine makine teçhizat alımları için 5.000.000,00 ₺, taşıt alımları için ise 175.000,00 ₺ konulmuş olup, bu ödeneye yıl içinde likit karşılığı olarak 960.000,00 ₺ ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 6.135.000,00 ₺'ye ulaşmıştır. Bu ödenekten 2018 yılı sonu itibarıyla 5.959.526,71

₺ tutarında harcama yapılmış olup, harcama oranı % 97 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 2018 yılında bütçemize 1 adet T-15 Tam Donanımlı Ambulans konulmuş olup, bunun için 175.000,00 ₺ ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığından gerekli izinler alınmış, ancak ödenek yetersizliğinden dolayı ambulansın alımı yapılamamıştır.

Yıl içinde hastane birimlerine alınan makine teçhizatın dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2018 YILINDA HASTANEMİZE ALINAN MAKİNE, TEÇHİZAT VE TIBBİ CİHAZLARIN DAĞILIMI TABLOSU		
Sıra No	Bölüm/Birim Adı	Harcama (₺)
1	Hastane Geneli (Çeşitli kliniklere alınanlar)	1.645.789,01
2	Nöroloji AD.(Nöroloji Yoğun Bakım Dahil)	118.900,25
3	Kulak Burun Boğaz AD.	271.987,20
4	Yemekhane	44.220,50
5	Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.	144.722,72
6	Onkoloji Hastanesi	93.088,84
7	Ameliyathane	976.166,43
8	Göz Hastalıkları AD.	180.630,00
9	Çocuk Sağlığı Hastalıkları AD.	186.142,31
10	Göğüs Hastalıkları AD.	157.680,00
11	Plastik Cerrahisi AD.	35.100,00
12	Biyokimya AD.	5.507,00
13	Göğüs Cerrahisi AD.	11.800,00
14	Mikrobiyoloji AD.	90.351,20
15	Ortopedi ve Travmatoloji AD.	161.784,00
16	Üroloji AD.	10.692,00
17	Biyomedikal Birimi	35.990,00
18	Acil Tıp AD.	125.154,10
19	Çamaşırhane	267.860,00
20	Adli Tıp	61.223,43
21	Yenidoğan	61.770,76
22	Patoloji AD.	95.012,05
23	Bilgi İşlem Ünitesi	42.013,07
24	Yoğun Bakımlar	80.004,00
25	Gün Hastanesi	12.980,00
26	Radyoloji AD.	224.686,40
27	Kalp Damar Cerrahisi AD.	73.256,40
28	Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD.	147.295,80
29	Güvenlik Birimi	17.700,00
30	Ücretli Vezneler	21.870,12
31	Nefroloji AD.	245.589,91
32	Padoloji	13.950,00
33	Genel Cerrahi AD.	32.130,00
34	Endoskopi Ünitesi	76.593,60




35	Kemik İliği Nakli Ünitesi	34.041,60
36	Palyatif Ünitesi	76.593,60
37	Organ Nakli	79.250,41
<b>TOPLAM (₺)</b>		<b>5.959.526,71</b>

Tablo 12: 2018 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu

#### ❖ Büyük Onarımlar:

Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine büyük onarımlar için 2.825.000,00 ₺ ödenek konulmuştur. Yıl içinde likit karşılığı olarak 1.091.000,00 ₺ ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 3.916.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten büyük onarımlar için 3.906.745,56 ₺ tutarında harcama yapılmış olup, harcama oranı % 99 olarak gerçekleşmiştir. Alt proje kapsamında; Onkoloji Hastanesi Tadilat İşİ, Hastane Buhar Kazanı ve Soğutma Grupları İhalesi ile Hastane Genel Tadilat ve Onarım İhalesi yapılmıştır. Ayrıca doğrudan temin alımı ile eski Acil Kantin Tadilat İşİ, Hava kanalı ve Soğutma Grubu Bypass Hattı, Ameliyathane, Patoloji A.D., Genetik Lab., Adli Tıp A.D., Hemodiyaliz Ünitesi, Yemekhane, Acil Servis ve Otopark Çatıları Tadilatı, Adli Tıp Lab. Tezgah, Dolap yapımı, Ameliyathaneye Hepa Filtre ve Soğutma Grubu Kaide İşleri yaptırılmıştır.

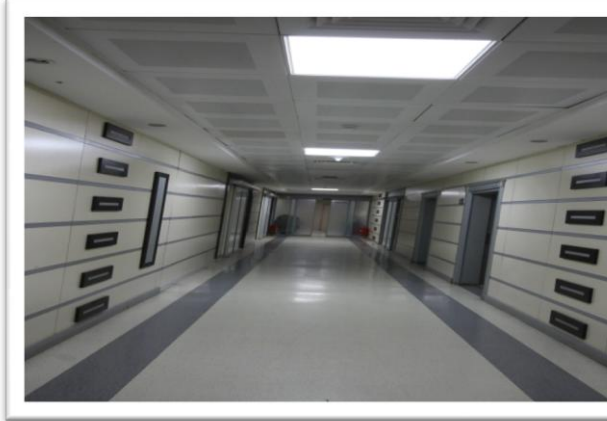


#### 6.4.1.2. Makine, Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye):

Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programına; hastanenin büyük onarımlarında kullanılmak üzere kaynağı döner sermayeden olmak üzere 4.000.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, döner sermayenin içinde bulunduğu durum nedeniyle yılsonu itibariyle bu ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır.

#### 6.4.2. Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m<sup>2</sup>)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2014I000260	
Proje Adı	Çocuk Hastanesi (GAP) (250 Ytk.30.440m <sup>2</sup> )	
Sektör/ Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Hasta yoğunluğu nedeni ile daha geniş yerde daha kaliteli hizmet vermek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Hastane İnşaatı (30.440 m <sup>2</sup> ), (250 yatak)	
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2019	
Projenin Yılı Ödeneği	15.000.000	23.450.000
Yapılan Harcama (₺)	22.745.709,50	

Bu proje kapsamında; 2018 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 15.000.000,00 ₺ ödenek konulmuştur. Bütçeye konulan ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle likit karşılığı kaynaklardan yıl içinde projeye 8.450.000,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 23.450.000,00 ₺'ye ulaşmıştır. 2017 yılı ortalarında inşaat çalışmalarına başlanan Çocuk Hastanesinde 2018 yılı sonu itibariyle %59 fiziki gerçekleştirme sağlanmış ve proje kapsamında bütçeden 22.745.709,50 ₺ harcama yapılmıştır.

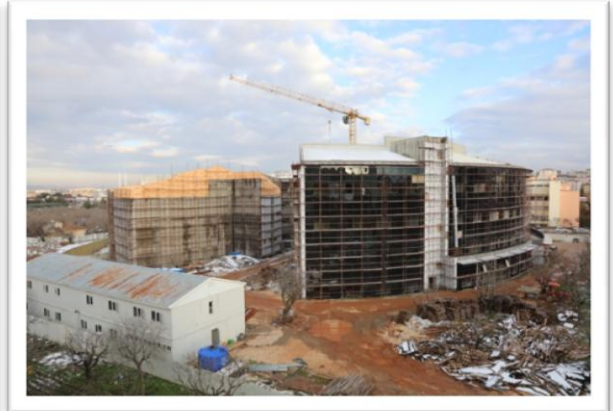

## 6.5. Diğer Kamu Hizmetleri

### 6.5.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2018K120320	
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	
Sektör/ Alt Sektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma	
Proje Amacı	Bilimsel Araştırma Projelerini Desteklemek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Proje Desteği	
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018	
Projenin Yıllı Ödeneği	7.230.000	7.230.000
Yapılan Harcama (₺)	Bütçe Harcaması: 7.230.000,00 Özel Hesap Harcaması: 5.468.240,22	

Bu proje kapsamında; 2018 Yılı Bütçe Kanunu ile bütçeye 7.230.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde herhangi bir ekleme işlemi yapılmamıştır. Söz konusu ödenek ile 132'si yıl içinde eklenen projelerle birlikte toplam 198 adet bilimsel araştırma projesine destek verilmiş olup, bu projelerin 100 adedi yıl içinde tamamlanmıştır. Anılan ödeneğin tamamı 2018 yılı sonu itibariyle özel hesaba aktarılmıştır. Özel hesaptan bilimsel araştırma projelerinin yatırım harcamaları için 1.515.371,69 ₺ harcama yapılmıştır.

Projeler	Önceki Yılda Devreden Proje Sayısı	2018 Yılı İçinde Eklenen Proje Sayısı	Toplam Proje Sayısı	Yıl İçinde Tamamlanan Proje Sayısı
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	66	132	198	100
Genel Toplam	66	132	198	100

Tablo 13: 2018 Yılı İtibariyle BAP Kapsamında Yürütülen Projeler



**2018 YILINDA KABUL EDİLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN  
BİRİMLERE VE TÜRLERE GÖRE DAĞILIMI**

BÖLÜMÜ	Kapsamlı Araştırma Projeleri	Altyapı Araştırma Projeleri	Destek Projeleri	Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projeleri	Doktora Tezi	Uzmanlık Tezi	İKA Projesi	Destek	Toplam
Tıp Fakültesi	6	14	2	13	6	12		23.861.735,00	53
İ.İ.B.F				1	2			25.215,02	3
Mühendislik Fakültesi	2	8		15	4			1.906.343,24	29
Rektörlük Makamı		1						1.911.600,00	1
Fen Edebiyat Fakültesi		1	1	21	4			344.345,06	27
Diş Hekimliği Fakültesi		2				4		686.105,28	6
Eğitim Fakültesi	1				2			55.248,88	3
Beden Eğitimi MYO				1				5.670,00	1
Gaz.Tekn.Bil.MYO				1				9.998,50	1
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak.		1		1				186.060,24	2
İlahiyat Fakültesi		1						244.257,64	1
İletişim Fakültesi		1						794.039,16	1
Sağlık Bilimleri Fakültesi				1				368,16	1
Sağlık Bilimleri Enstitüsü				1				9.985,30	1
Sağlık Hizmetleri MYO	1							7.585,60	1
Naci Topçuoğlu MYO							1	558.850,00	1
<b>TOPLAM</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>55</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>30.607.407,08</b>	<b>132</b>

**Tablo 14:** 2018 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Arş. Projelerinin Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı

## 6.5.2. Merkezi Araştırma Laboratuvarı

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2010K121510	
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	
Sektör/ Alt Sektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma	
Proje Amacı	Bilimsel Araştırma Projelerini Desteklemek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	İleri Araştırma	
Başlama-Bitiş Tarihi	2010-2018	
Projenin Yılı Ödeneği	1.000.000	1.000.000
Yapılan Harcama (₺)	Bütçe Harcaması:1.000.000 Özel Hesap Harcaması:875,00	

Bu proje kapsamında; 2018 Yılı Bütçe Kanunu ile 1.000.000 TL ödenek verilmiş olup, söz konusu ödeneğin tamamı proje özel hesabına aktarılmıştır. Proje özel hesabından 875 ₺ harcanmış ancak projeye ilişkin makine teçhizat alımlarının ihalesi tamamlanmış ve sözleşme imzalanmıştır. Makine teçhizatların teslim edilmesiyle birlikte proje tamamlanacaktır.





## 7. EKLER

### 7.1. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (YILSONU)

Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar (Özel Bütçe+Döner Sermaye)

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödeneği			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Eğitim	6	0	103.533	0	0	65.733	0	0	31.800	0	0	42.235	0	0	29.349
Sağlık	2	0	77.865	0	0	10.000	0	0	27.000	0	0	37.501	0	0	32.612
D.K.H	2	0	25.788	0	0	17.558	0	0	8.230	0	0	8.230	0	0	8.230
<b>Toplam</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>207.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.191</b>

**Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar (Özel Bütçe)**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödeneği			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Eğitim	6	0	103.533	0	0	65.733	0	0	31.800	0	0	42.235	0	0	29.349
Sağlık	2	0	73.865	0	0	10.000	0	0	23.000	0	0	33.501	0	0	32.612
D.K.H	2	0	25.788	0	0	17.558	0	0	8.230	0	0	8.230	0	0	8.230
<b>Toplam</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>203.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.191</b>

**Bütçe Türü: Döner Sermaye**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödeneği			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Sağlık	1	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7.2. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI HARCAMALARI YILSONU GERÇEKLEŞME RAPORU

### Sektör Adı: Eğitim

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2017 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma/Tenkis Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
308934	441,	1988H031310	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Gaziantep	0,	11.000,	3.600,	0,	0,	7.400,	-	5.400,	0,	0,	1.778,
308867	441,	1991H030810	Kampüs Altyapısı (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Gaziantep	0,	68.633,	61.133,	0,	0,	3.500,	+	6.400,	0,	0,	6.767,
309030	441,	2016H051040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Gaziantep	0,	9.800,	1.000,	0,	0,	6.800,		0,	0,	0,	213,
308819	441,	2018H030790	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Gaziantep	0,	200,	0,	0,	0,	200,		0,	0,	0,	108,
309045	441,	2018H030800	Muhtelif İşler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Gaziantep	0,	12.400,	0,	0,	0,	12.400,	+	9.215,	0,	0,	18.764
313774	441,	2018H030810	Yayın Alımı (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Gaziantep	0,	1.500,	0,	0,	0,	1.500,	+	220,	0,	0,	1.719,
<b>TOPLAM</b>							<b>0,</b>	<b>103.533,</b>	<b>65.733,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>31.800</b>		<b>10.435,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>29.349</b>

### Sektör Adı: Sağlık

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2017 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma/Tenkis Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
299770	441,	2014I000260	Çocuk Hastanesi (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Gaziantep	0,	61.865,	10.000	0,	0,	15.000,	+	8.450,	0,	0,	22.746,
299812	441,	2014I000260	Çocuk Hastanesi (GAP)	DÖNER SERMAYE	2019	Gaziantep	0,	0,	0,	0,	0,	0,		0,	0,	0,	0,
317813	441,	2018I000270	Muhtelif işler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Gaziantep	0,	12.000,	0,	0,	0,	8.000,	+	2.051	0,	0,	9.866,
317816	441,	2018I000270	Muhtelif işler (GAP)	DÖNER SERMAYE	2018	Gaziantep	0,	4.000,	0,	0,	0,	4.000,		0,	0,	0,	0,
<b>TOPLAM</b>							<b>0,</b>	<b>77.865,</b>	<b>10.000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>27.000,</b>		<b>10.501,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>32.612,</b>

**Sektör Adı: D.K.H.**

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2017 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt (15)	Harcam a Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkayna k (17)	Harcama Toplam (18)
301058	441,	2010K121510	Merkezi Araştırma Laboratuvarı (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Gaziantep	0,	18.558,	17.558,	0,	0,	1.000		0,	0,	0,	1.000,
301363	441,	2018K120320	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Gaziantep	0,	7.230,	0,	0,	0,	7.230		0,	0,	0,	7.230,
TOPLAM							0,	25.788,	17.558,	0,	0,	8.230,		0	0,	0,	8.230,
