



T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Strateji Geliştirme Başkanlığı
Ocak-2022




T.C
GAZIANTEP ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU

Ocak-2022

1. ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

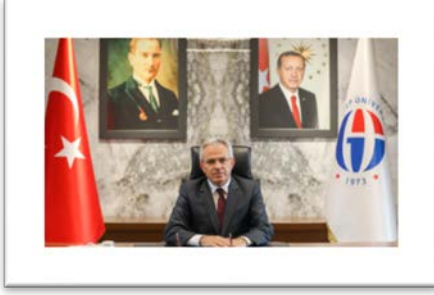

Gaziantep Üniversitesi; Türkçe, İngilizce ve Arapça eğitim veren Ülkemizdeki tek üniversitedir. 107 ülkeden 6.500'ün üzerinde yabancı uyruklu öğrencisi ile çok renkli, çok kültürlü, çok dilli ve huzurlu bir üniversitedir. Son yıllarda hızla büyüyerek, 20 fakülte, 2 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 28 araştırma ve uygulama merkezi, 1.779 seçkin akademik personeli ve 1.656 idari personeli ile 48.689 öğrenci sayısı ile ülkemizin önde gelen üniversitelerinden birisi olmuştur.

Gaziantep Üniversitesi olarak temel prensibimiz; akılcılık, adalet, liyâkat, erdem ve ahlâk ile yoğurulmuş bilim aşığı genç nesiller yetiştirmektir. Bu amaçla, bizim bizden başka dostumuzun olmadığını, ancak ve ancak çok çalışarak, gençliğimizin potansiyelini keşfedip imkân üreterek, daima daha ileriye hedefleyerek ve yıkarak değil inşa ederek muasır medeniyet seviyesine yükseleceğimize inanıyorum. Üniversitemiz bu prensipler doğrultusunda, bir tarafta ülkemizdeki gençlere yükseköğretim hizmeti verirken diğer taraftan Yüksek Öğretim Kurulu, Suriye'deki Yüksek Öğrenim konusunda Üniversitemizi koordinatör üniversite olarak belirlemiştir. Bu kapsamda; Suriye'de Cerablus Meslek Yüksekokulu, El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez İslami İlimler Fakültesi ve Afrin Eğitim Fakültesi eğitim öğretime devam etmektedirler. Suriye'de açılan bu okullarımızda hâlihazırda yaklaşık 1.000 üzerinde öğrenci öğrenim görmektedir.

Üniversitemizin yatırım projeleri yukarıda bahsedilen prensipler doğrultusunda uygulanmaktadır. Üniversitemizin 2021 yılı yatırım programında; eğitim sektöründe 5, sağlık sektöründe 3 ve diğer kamu hizmetleri sektöründe 2 olmak üzere toplam 10 adet yatırım projesi yer almaktadır. Söz konusu yatırım projelerine merkezi yönetim bütçesinden 55.395.000,00 ₺ döner sermaye bütçesinden 1.100.000,00 ₺ olmak üzere toplam 56.495.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde bu projelere gelir fazlası karşılığı ve likit kaynaklarımızdan toplam 27.388.000,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 83.883.000,00 ₺'ye ulaşmıştır. 2021 yılı sonu itibarıyla bu ödenğin 74.363.669,59 ₺'si harcanmıştır. İnşaatı devam eden 250 Yataklı Çocuk Hastanesi inşaatı tamamlanarak hizmete alınmıştır. Üniversitemizde bulunan bir binamızın onarımı yapılarak Böbrek Nakli Merkezi olarak tamamlanmıştır. Ayrıca Üniversitemizin ana kapısı yeniden düzenlenmiş ve buna ilave olarak Üniversitemizin ulaşımını rahatlatarak yeni kapılar açılmış ve bu kapılara Gaziantep'imizin kahramanları olan Şahinbey, Şehitkâmil ve Karayılanın adları verilmiştir. Diğer taraftan, Tıp Fakültesi Taşınır Ambarı inşaatlarının 2022 yılında tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25. maddesi gereği Üniversitemiz yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmek üzere 2021 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN
Rektör

2. İÇİNDEKİLER

1.	ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ.....	iii
2.	İÇİNDEKİLER	iv
3.	ŞEKİLLER TABLOSU	v
4.	GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
4.1.	Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri.....	2
4.2.	Yatırımların Finansman Kaynakları	3
4.3.	Kuruluşun Mevcut Kapasitesi.....	3
4.4.	2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	6
5.	2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	7
5.1.	Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	7
5.2.	Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar/Öneriler.....	8
6.	2021 YILI PROJE UYGULAMALARI	9
6.1.	EĞİTİM SEKTÖRÜ	9
6.1.1.	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi.....	9
6.1.2.	Derslik ve Merkezi Birimler.....	10
6.1.3.	Kampüs Altyapısı	12
6.1.4.	Muhtelif İşler	13
6.1.4.1.	Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Donanım Alımlarına İlişkin Tablolar.....	14
6.1.4.2.	Bina Büyük Onarımları Kapsamında Yapılan İşler:	15
6.1.5.	Yayın Alımı	16
6.2.	SAĞLIK SEKTÖRÜ	18
6.2.1.	Muhtelif İşler	18
6.2.1.1.	Makine Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Özel Bütçe):.....	18
6.2.1.2.	Makine, Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye):.....	20
6.2.2.	Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m ²)	20
6.2.2.1.	Çocuk Hastanesi İnşaatı	20
6.2.2.2.	Çocuk Hastanesi Makine Teçhizat.....	21
6.3.	DİĞER KAMU HİZMETLERİ.....	21
6.3.1.	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri.....	21
6.3.2.	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	23
7.	EKLER.....	24
7.1.	2021 Yılı Kamu Yatırımları Özeti (Yılsonu).....	24
7.2.	2021 Yılı Harcamaları Yılsonu Gerçekleşme Raporu	26

3. ŐEKİLLER TABLOSU

Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler.....	2
Tablo 2: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı	3
Tablo 3: Tamamlanan İnşaatlar ve İşler	6
Tablo 4: Devam Eden İnşaatlar ve İşler	6
Tablo 5: 2021 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı.....	7
Tablo 6: 2021 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı.....	8
Tablo 7: 2021 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı	8
Tablo 8: Muhtelif İşler Kapsamında Alınan Makine.-Teçhizat, Bilgisayar ve Yazılım ile Donanım Alımları	14
Tablo 9: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları	17
Tablo 10: 2019-2021 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları.....	17
Tablo 11: 2021 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu.....	19
Tablo 12: 2021 Yılı İtibariyle BAP Kapsamında Yürütölen Projeler	22
Tablo 13: 2021 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Arş. Projelerinin Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı.....	22



4. GENEL DEĞERLENDİRME

Üniversitemizin 2020-2024 dönemi stratejik planında; kurumsal misyon, vizyon amaç ve hedefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

MİSYONUMUZ

Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli insan yetiştiren; bireylere, topluma ve tüm kurum-kuruluşlara eğitim, bilim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında hizmet üreten değişime açık bir üniversite.

VİZYONUMUZ

Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde uluslararası rekabet kabiliyeti yüksek bir dünya üniversitesi olmak.

4.1. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemizin 2020-2024 dönemi Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedefler aşağıda sıralanmıştır. 2021 yılı yatırımlarına da bu amaç ve hedefler doğrultusunda harcama yapılmıştır.

Stratejik Amaç-1 Ulusal ve Uluslararası Alanda Etkin, Saygın, Girişimci ve Yenilikçi Bir Araştırma Üniversitesi Olmak	
Hedef-1	Bilimsel araştırmaları nicelik ve nitelik olarak arttırmak,
Hedef-2	Üniversitenin ulusal ve uluslararası tanınırlığını ve başarı endekslerindeki düzeyini artırmak,
Hedef-3	Araştırma materyalleri ve fiziki altyapısının güçlendirilmesi,
Hedef-4	Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların üniversitemizde yapılmasının teşvik edilmesi,
Stratejik Amaç-2 Sağlık alanında bölgesel referans merkezi olmak	
Hedef-1	Yurt içi ve yurt dışı sağlık turizminin geliştirilmesi,
Hedef-2	Hastanelerin fiziki ve teknolojik alt yapısının güçlendirilmesi,
Stratejik Amaç-3 Etkin ve sürdürülebilir üniversite Sanayi işbirliğinin sağlanması	
Hedef-1	AR-GE işbirliklerini arttırmak
Hedef-2	Teknoloji Transfer Ofisi (TARGET TTO) ile TEKNOPARK'ın etkinliğinin geliştirilmesi,
Stratejik Amaç-4 Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli eğitim yapmak	
Hedef-1	Nitelikli öğretim elemanı sayısını artırmak,
Hedef-2	Üniversitenin tanıtımı yapılarak nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine zemin hazırlamak,
Hedef-3	İhtiyaç duyulan eğitim, sportif ve sosyal binalarının yapılması, mevcut binaların yenilenmesi ve kampüs altyapısının iyileştirilmesi,
Hedef-4	Eğitim materyalleri alt yapısını güçlendirmek,
Hedef-5	Ders dışı eğitim ve sertifika programlarının yaygınlaştırılması,
Hedef-6	Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere katılımının artırılması,
Stratejik Amaç-5 Kurumsallaşma ve Kurum Kültürünün Güçlendirilmesi	
Hedef-1	Kurum iş ve hizmet kalitesinin artırılması,
Hedef-2	Kurumsal aidiyetin artırılmasına yönelik eğitim ve sosyal faaliyetleri arttırmak,

Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler

4.2. Yatırımların Finansman Kaynakları

2021 yılı yatırım programında bulunan 10 adet yatırım projesi için; 2021 yılı Bütçe Kanunu ile 55.395.000,00 ₺, döner sermaye bütçesinden ise 1.100.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, toplam yatırım ödeneğimiz 56.495.000,00 ₺ olmuştur. Yıl içinde likit karşılığı 19.200.000,00 ₺, gelir fazlası 8.188.000,00 ₺, olmak üzere toplam 27.388.000,00 ₺ ödenek eklenmiş olup, 2021 yılı sonu itibariyle toplam ödenek 83.883.000,00 ₺'ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 74.363.669,59 ₺'si harcanmış, harcama oranı ise %89 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemize verilen 56.495.000,00 ₺'lik başlangıç yatırım ödeneğinin 48.360.000,00 ₺' si hazine yardımı, 7.035.000,00 ₺' si öz gelir ve 1.100.000 ₺' si döner sermaye ödeneğinden oluşmaktadır. 2021 yılsonu itibariyle hazine yardımı, öz gelir, likit kaynaklar ile döner sermaye ödeneklerinin dağılımı ve harcamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı (Bin ₺)				
Finans Kaynağı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı (%)
Hazine Yardımı	48.360	48.360	59.545	88
Likit Kaynaklar	0	19.200		
Öz Gelir ve Gelir Fazlası	7.035	15.223	14.819	97
Bütçe Toplamı	55.395	82.783	74.364	90
Döner Sermaye	1.100	1.100	0	0
GENEL TOPLAM	56.495	83.883	74.364	89

Tablo 2: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı

4.3. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi

Gaziantep Üniversitesinin temeli, 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümüne dayanmaktadır. 27 Haziran 1987 yılında, 3389 sayılı yasa ile bugünkü statüsüne kavuşan üniversitemiz zaman içerisinde hızla büyüyerek bugün itibariyle; 20 Fakülte, 2 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 5 Enstitü, 28 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 5 Rektörlüğe Bağlı Birim, 1.779 akademik personel, 1.656 idari personel, 1.772 sürekli işçi ve 48.689 öğrencisi ile sadece bölgemizin değil ülkemizin sayılı üniversiteleri arasına girmiş bulunmaktadır. Gaziantep Üniversitesinin toplam yüzölçümü 2.982.236,94 m², toplam kapalı alanı ise 481.041m²'dir. Üniversitemizin toplam 8 adet yerleşkesi bulunmaktadır. Merkez kampüste 88 adet lojman bulunmakta olup bu lojmanların 8 tanesi dubleks, 16 tanesi 2+1, geriye kalan 64 tanesi ise 3+1'dir.



Üniversitemiz sağlık hizmetlerini Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi aracılığıyla sunmaktadır. Üniversite hastanemiz özellikle çevre illerden ve komşu ülkeler Irak, Suriye yoğun taleple karşılaşmakta olup, hakem hastane olarak bölgenin tek hastanesi konumundadır. 2.000 yılında kampüs içinde yer alan bina hizmete alınmış ve geçen yıllar içinde fiziki kapasite sürekli gelişmiştir. İhtiyaçların şekil ve boyut değiştirmesi ile sürekli yenilenme devam etmektedir. 1.026 yatak kapasiteli hastanelerimizde günlük ortalama 2.000'in üzerinde poliklinik hizmeti verilmekte, yılda 37.500'in üzerinde de ameliyat yapılmaktadır. Ayrıca inşaatı devam eden 250 yatak kapasiteli Çocuk Hastanesi tamamlanmış olup, bölgemiz açısından önemli bir ihtiyaç giderilmiştir.

Hastanemiz bünyesinde; 90 poliklinik, 44 klinik, Diyaliz ünitesi, Taş Kırma Ünitesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, Merkez Laboratuvarı, Kan Bankası, Dâhili ve Cerrahi Yoğun Bakım Üniteleri, Doku Tipleme, Genetik ve Hücre Kültür Laboratuvarı, Padoloji, Androloji ve İnfertilite Laboratuvarı hizmetleri verilmektedir.

Üniversitemiz Hastanesi, tıp alanında Türkiye'nin en iyi araştırma ve uygulama hastanelerinden biridir. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile şehrimizin ve bölgemizin ve hatta komşu ülkelerin sağlık sorunlarına çözüm üretilmektedir. Hastanenin organ nakli konusunda nakil istatistikleri incelendiğinde dünya ölçeğinde bir konuma yerleşmiş olduğu görülecektir. Organ Nakli Merkezinde canlıdan ve kadavradan nakiller yapılmaktadır. Ayrıca 2021 yılında üniversitemizde mevcut bir binanın onarımı yapılarak böbrek nakli merkezine dönüştürülmüş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışı yapılmıştır.



Türk Kanser Vakfı Gaziantep Şubasının öncülüğü ile temeli 1999 yılında atılan hastane, bir bölge hastanesi konumunda olup, 24 bin metrekare alan üzerinde 10 bin metrekare kapalı alanlı ve 5 katlı inşa edilmiş, 102 yatak kapasitelidir ve modern cihazlarla donatılmıştır. Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi binasının büyük bir bölümünü Gaziantepli hayırsever kişi ve kuruluşların aynı ve nakdi katkılarıyla yapılmıştır. Onkoloji Hastanesi; en modern ve en gelişmiş radyoterapi ve kemoterapi cihazlarıyla, her türlü kanserin teşhis ve tedavi uygulamasını yapabilecek donanıma sahiptir. Alanında uzman hekimlerimiz tarafından muayeneleri yapılan hastalarımızın mümkün olan en çok yararı elde edebilecekleri tedavi süreci belirlenmektedir. Hastaların tanı tedavi

sürecinin hızlı olabilmesi amacıyla bünyesinde laboratuvar hizmeti veren hastanemiz sadece Gaziantep ve çevre illere değil komşu ülkelerden gelen hastalarında umut ışığı olmuştur.



Üniversitemizde diş sağlığı hizmetleri Diş Hekimliği tarafından verilmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi, 31.10.2006 tarihinde 26332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuştur. 2008 yılının Nisan ayında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi binasında eğitim-öğretim ve tedavi hizmetine başlamıştır. Kasım 2012 tarihi itibarıyla de 16.370 m² kapalı alana sahip yeni binasına taşınan



Diş Hekimliği Fakültemiz burada hizmet vermeye başlamıştır. Fakültemiz; Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Periodontoloji, Pedodonti, Endodonti, Diş Hastalıkları ve Tedavisi ile Ağız, Diş ve Çene Radyoloji Anabilim Dallarında ilimiz ve çevre illerden gelen hastalara hizmet vermektedir. Ayrıca tescilli alınmış olan Genel Anestezi Ameliyathanesi kısa vadede hizmete açılması planlanmaktadır. Genel Anestezi Ameliyathanesi Faaliyete geçtiğinde Güneydoğu bölgesine ve Sağlık turizmi kapsamında komşu ülkelere de hizmet verecektir. Son olarak Diş Hekimliği Fakültemizin; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri standardına göre Ocak 2020’de eğitim ve



hastane kapsamında belgelendirilmesi tamamlanmıştır. Fakültemiz; TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi, Eğitim-öğretim hizmetleri ve ağız diş sağlığı hizmetleri sunumu ve 2020 yılında Mekânda Erişim konusunda yapılan düzenlemelerle Turuncu Bayrak almaya hak kazanmıştır.

4.4. 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemizde 2021 yılında; Eşanjör Tadilat ve Onarımlarının yaptırılması, Isı Galerisi Tadilat ve Onarımlarının yaptırılması, Diş Hekimliği Fakültesi Binası Çatı Tadilatının yapılması, Öğrenci Kafeteryası ve Çevre Düzenlemesi yapılması, Bina Tadilat ve Onarımlarının yapılması işleri yaptırılmıştır. Ayrıca kapalı alanı 30.440 m² olan 250 Yataklı Çocuk Hastanesi binası tamamlanarak, hizmete açılmıştır. Kapalı alanı 5.040 m² olan Tıp Fakültesi Ambar Binası İkmal İnşaatının 2022 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Yatırım projeleri kapsamında 2021 yılında tamamlanan işler ile devam eden inşaatlar aşağıda gösterilmiştir.

İnşaatın/İşin Adı	İşin Toplam Maliyeti	İşin Başlangıç/Bitiş Tarihi	Tamamlanma Süresi (Ay)
1-Eşanjör Tadilat ve Onarımları	632.844,62	11.11.2020-08.03.2021	4
2-Isı Galerisi Tadilat ve Onarımları	2.939.025,36	11.05.2021-12.10.2021	5
3-Diş Hekimliği Fakültesi Binası Çatı Tadilatının yapılması	1.465.002,11	01.02.2021-.30.07.2021	6
4-Öğrenci Kafeteryası ve Çevre Düzenlemesi yapılması	1.152.624,00	05.04.2021-02.09.2021	5
5-Bina Tadilat ve Onarımlarının yapılması	4.130.927,06	28.05.2021-23.11.2021	6
6. 250 Yataklı Çocuk Hastanesi Binası	62.722.467,28	10.07.2017-30.03.2021	45
TOPLAM	73.042.890,43		

Tablo 3: Tamamlanan İnşaatlar ve İşler

DEVAM EDEN İNŞAATLAR VE İŞLER				
İnşaatın Adı	İhale Bedeli (KDV Dâhil)	Kapalı alanı (m2)	İnşaatın Başlangıç/Bitiş Tarihi	Tamamlanma Oranı (%)
1-Tıp Fakültesi Ambar Binası İkmal İnşaatı	7.038.700,00	5.040	19.03.2021-12.04.2022	14
TOPLAM	7.038.700,00	5.040		

Tablo 4:Devam Eden İnşaatlar ve İşler

5. 2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

5.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım projelerinin harcamaları için bütçeden 55.395.000,00 ₺ ve döner sermaye bütçesinde ise 1.100.000,00 ₺ ödenek verilerek toplam ödenek 56.495.000,00 ₺ olmuştur. Yıl içinde bu ödeneye 27.388.000,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 83.883.000,00 ₺' ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 74.363.669,59 ₺' si yıl içinde 10 adet yatırım projesi için harcanmış ve harcama oranı % 89 olarak gerçekleşmiştir.

2021 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin ₺)							
Sektör Adı	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Projenin Durumu
Eğitim Sektörü	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	500	0	0	500	500	Tamamlandı
	Derslik ve Merkezi Birimler	1	3.721	0	3.722	916	Devam Ediyor
	Muhtelif İşler	13.199	10.142	932	22.408	22.268	Tamamlandı
	Kampüs Altyapısı	4.000	100	0	4.100	4.089	Devam Ediyor
	Yayın Alımı	2.200	252	0	2.452	2.449	Tamamlandı
Sağlık Sektörü	Muhtelif İşler	19.099	131	0	19.230	14.068	Tamamlandı
	Döner Sermaye (*)	1.100	0	0	1.100	0	
	Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m2)	1	6.316	0	6.317	5.739	İnşaat Tamamlandı Mak.Teçh.
	Çocuk Hastanesi Makine Teçhizat	11.000	0	131	10.869	10.868	Devam Ediyor.
	Acil Travma ve Yanık Hastanesi (Etüt-Proje)	1.000	0	0	1.000	189	Tamamlandı
D.K.H. Sektörü	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	5.493	7.790	0	13.283	13.275	Tamamlandı
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2	0	0	2	2	Devam Ediyor
TOPLAM		56.495	28.452	1.063	83.883	74.363	
(*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.							

Tablo 5: 2021 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı

2021 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin ₺)					
Sektör Adı	Proje Sayısı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
Eğitim	5	19.900	33.182	30.223	91
Sağlık (*)	3	31.100	37.416	30.864	82
D.K.H	2	5.495	13.285	13.277	99
TOPLAM	10	56.495	83.883	74.363	89
(*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.					

Tablo 6: 2021 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı

2021 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı (Bin ₺)					
Sektör Adı	Proje Sayısı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
Tamamlanan Projeler	4	41.492	65.190	58.488	90
Devam Eden Projeler	6	15.003	18.693	15.875	85
TOPLAM	10	56.495	83.883	74.363	89
(*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.					

Tablo 7: 2021 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı

2021 Yılı Yatırım Projelerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödeneklerin Dağılımı ve Harcama Durumu (Bin ₺)							
EKO KOD	AÇIKLAMA	Başlangıç Ödeneği	Eklene	Düşülen	Toplam Ödeneği	Yıl Sonu Harcama	Harcama Oranı (%)
06.1	Mamul Mal Alımları	32.995	14.900	1.360	46.535	46.440	100
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	700	0	332	368	366	99
06.5	Gayri Menkul Ser. Ürt. Gid.	9.502	10.138	4.001	15.639	11.432	73
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	300	364	42	622	618	99
06.7	Gayri Menkul Büyük Onr. Gid.	11.898	7.756	35	19.619	15.507	79
TOPLAM		55.395	33.158	5.770	82.783	74.363	90
Döner Sermaye Ödeneği		1.100	0	0	1.100	0	0
GENEL TOPLAM		56.495	33.158	5.770	83.883	74.363	89

5.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar/Öneriler

- ❖ Yatırım tavanlarının belirlenmesi sürecinde, yatırımcı kuruluşlar ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile daha fazla görüşme yapılarak sürdürülebilir yatırım tavanlarının ortaya çıkması sağlanabilir. Bu yolla hem yıl içinde yatırımların aksamadan yürütülmesi

sağlanacak hem de yıl içinde oluşacak yedek ödenek talepleri de en aza indirilebilecektir.

- ❖ Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve mevsimsel şartlar Strateji ve Bütçe Başkanlığınca göz önüne alınır ve buna göre ödenek oranı belirlenirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir.
- ❖ Ayrıntılı Finans Programının sadece ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde hazırlanması 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine uygun olacaktır.
- ❖ Ödenek tavanları belirlenmesi sürecinde objektif kıstas belirlenerek, bu kriterlerin bütçe hazırlayan kurumlara duyurulması halinde daha reel duruma uygun bütçeler ortaya çıkacaktır.
- ❖ Kurumların, öz gelirlerini yatırım bütçesine tam olarak yansıtma imkânı sağlanmalıdır.

6. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI

Üniversitemiz 2021 Yılı Yatırım Programında 10 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Bunların beşi eğitim, üçü sağlık, ikisi de diğer kamu hizmetleri sektöründe yer almaktadır. Aşağıda bu projelerin yıl içindeki uygulamaları belirtilmiştir.

6.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ

6.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2021H03-167426	
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	İnşaat ve ihale aşaması için hazırlık yapılması ve projelendirme işlerinin yapılması.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Etüd-Proje ve Müşavirlik	
Başlama-Bitiş Tarihi	2021- 2021	
Projenin Yılı Ödeneği	500.000	500.000
Yapılan Harcama (₺)	500.000,00	

Bu proje kapsamında; 2021 Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 500.000,00 ₺ ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin tamamı harcanmış olup, projenin harcama oranı % 100 olmuştur.

Bu proje kapsamında; Spor Köyü jeolojik ve jeoteknik zemin etüdü hazırlanması, Merkezi Kütüphane Binası için jeolojik-jeoteknik zemin etüt raporu hazırlanması ve Kütüphane mimari proje hazırlanması, İmar uygulaması hazırlanması, Kütüphane Binası Statik projesi, Kütüphane Binası mekanik tesisat projesi, Acil Travma ve Yanık Ünitesi Mekanik Tesisat projesi işleri yaptırılmıştır.

6.1.2. Derslik ve Merkezi Birimler

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	1988H03-146	
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Her yıl yeni açılan akademik birimlerin bina ihtiyaçlarını karşılamak ve kapasitesi yetişmeyen binalara ek bina yapımını sağlamak	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Eğitim (5.040 m ²)	
Başlama-Bitiş Tarihi	1988 - 2021	
Projenin Yılı Ödeneği	1.000	3.722.000
Yapılan Harcama (₺)	915.717,65	

Bu proje kapsamında; 2021 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 1.000,00 ₺ ödenek verilmiş olup, projeye yıl içerisinde 3.721.000,00 ₺ eklenerek toplam ödenek 3.722.000,00 ₺ olmuştur. Söz konusu ödenekten 2021 yılı sonu itibariyle 915.717,65 ₺ harcama yapılmış ve harcama oranı % 25 olmuştur. Proje kapsamında; Tıp Fakültesi Ambar Binası İkmal İnşaatı %14 oranında tamamlanmıştır. İnşaatın 2022 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Tıp Fakültesi Ambar Binası İkmal İnşaatı

İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dâhil)	7.038.700,00
2021 Yılı Harcaması	915.717,65
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	19.03.2021-12.04.2022
İnşaatın Kapalı Alanı	5.040m ²
Fiziki Gerçekleşme Durumu	% 14
AÇIKLAMA	Bina; bodrum, zemin, birinci ve ikinci kattan oluşmaktadır. Bodrum katta; arşiv olarak planlanan kısımda tomoterapi ve radyoterapi ünitesi yapılması planlanmaktadır. Bununla ilgili olarak ihale süreci devam etmektedir. Zemin katta; 8 adet ofis, 2 adet temizlik odası bay-bayan wc, Birinci Katta; 8 adet ofis, bay-bayan wc, İkinci Katta ise; 8 adet ofis ve bay-bayan wc bulunmaktadır.



6.1.3. Kampüs Altyapısı

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2020H03-150666	
Proje Adı	Kampüs Alt yapısı (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversite alt yapısının iyileştirilmesi, yeni yapılan binalarda altyapı çalışmalarının yapılması	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2021	
Projenin Yılı Ödeneği	4.000.000	4.100.000
Yapılan Harcama (₺)	4.089.134,78	

Bu proje için 2021 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 4.000.000,00 ₺, ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içerisinde toplam 100.000,00 ₺, tutarında bir ekleme yapılmış olup, toplam ödenek 4.100.000,00 ₺, olmuştur. Bu ödenekten 2021 yılı sonunda 4.089.134,78 ₺ harcama yapılmış, harcama oranı ise % 99 olmuştur.

Bu proje kapsamında; Eşanjör Tadilatları ve Onarımları işinin 1 nolu ve kesin hakediş ödemesi, Isı Galerisi Tadilat ve Onarımları işinin 1, 2, 3 ve 4 nolu kesin hakediş ödemesi yapılmıştır. Ayrıca, kampüs içerisinde dikilmek üzere mevsimlik çiçek alımı ve dikimi işi, muhtelif yerlerde peyzaj çalışması yapılması, Isı santrali kızgın su sirkülasyon pompası alımı ve montajı işleri doğrudan temin usulüyle yaptırılmıştır. Son olarak, Üniversitemizin ulaşımının daha da rahatlatılması amacıyla mevcut ana kapı yeniden düzenlenmiş ve buna ilave olarak yeni kapılar açılmış ve bu kapılara Gaziantep'imizin kahramanları olan Şahinbey, Şehitkâmil ve Karayılanın adları verilmiştir.



6.1.4. Muhtelif İşler

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2021H03-167459	
Proje Adı	Muhtelif İşler (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversitenin makine-teçhizat, bilgi teknolojileri, bina onarım ve taşıt ihtiyacını temin etmek.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021	
Projenin Yılı Ödeneği	13.199.000	22.408.000
Yapılan Harcama (₺)	22.268.416,51	

Bu proje kapsamında; 2021 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 13.199.000 ₺ ödenek verilmiş, anılan toplu projeye likit karşılığı 8.811.000 ₺, gelir fazlası karşılığı olarak ise 398.000 ₺ ödenek eklenmiştir. Yapılan eklemeler sonucu toplam ödenek 22.408.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten yılsonunda 22.268.416,51 ₺ harcanmış olup, harcama oranı % 99 olarak gerçekleşmiştir. Proje ile; Makine teçhizat ve donanım alımları için 7.430.477,37 ₺, Bilgisayar ve Yazılım alımları için 3.654.682,36 ₺, Makine Teçhizat Büyük Onarımları için 618.288,9 ₺, Bina büyük onarımları için 10.564.967,88 ₺ olmak üzere toplam 22.268.416,51 ₺ harcama yapılmıştır. Proje Kapsamında yapılan harcamalar ile akademik ve idari birimlerin makine teçhizat, donanım, bilgisayar ve yazılım ihtiyaçları büyük oranda karşılanmıştır. Diğer taraftan, proje kapsamında Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Uçuş Akademisine bir adet uçak alınmıştır.



6.1.4.1. Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Donanım Alımlarına İlişkin Tablolar

MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI		
Sıra No	BİRİMLER	Harcanan Bütçe
1	Rektörlük	2.180,64
2	Organ Nakli	1.612.170,69
3	İktisadi İdari Bilimler Fakültesi	77.398,01
4	Diş Hekimliği Fakültesi	248.864,44
5	Basın Yayın Halkla İlişkiler	76.003,80
6	Nizip Eğitim Fakültesi	1.739,99
7	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	6.344,68
8	Fırat Kalkanı Okulları	22.451,86
9	Oğuzeli MYO	18.880,00
10	Spor bilimleri Fakültesi	17.000,00
11	Elbab İİBF	16.000,00
12	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	14.565,00
13	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	9.676,80
14	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	124.498,00
15	İslahiye İİBF	6.640,01
16	Sağlık Hiz. MYO	4.800,24
17	Teknik Bil. MYO	4.130,00
18	Biyoloji Bölümü	27.435,00
19	Üniversite Geneli(Merkez Ambarı)	635427,68
20	Naci Topçuoğlu MYO.	448.400,00
21	Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi	3.384.000,00
TOPLAM		6.758.606,84

BİLGİSAYAR VE YAZILIM ALIMLARI		
Sıra No	BİRİMLER	Harcanan Bütçe
1	Üniversite Geneli (Merkez Ambarı)	1.857.317,19
2	İktisadi İdari Bilimler Fakültesi	25.200,08
3	İdari ve Mali İşler Daire başkanlığı	63.519,40
4	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	901.100,18
5	Matbaa ve Basım İşleri Müdürlüğü	39.129,74
6	Evrak Arşiv İşletme Müdürlüğü	10.651,84
7	Organ Nakli	640.976,35
8	Öğrenci İşleri Daire başkanlığı	52.500,00
9	Uzaktan Eğt. UygulamaAtaş. Merk.Md.	64.287,58
TOPLAM		3.654.682,36

DONANIM ALIMLARI		
Sıra No	BİRİMLER	Harcanan Bütçe
1	Üniversite Geneli (Merkez Ambarı)	440.817,80
2	İdari ve Mali İşler Daire başkanlığı	1.360,80
3	Organ Nakli	75.602,38
4	Rektörlük	58.896,18
5	Biyoloji	24.669,36
6	Afrin Eğitim Fakültesi	23.004,00
7	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	4.860,00
8	Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	42.660,00
TOPLAM		671.870,52

Tablo 8: Muhtelif İşler Kapsamında Alınan Makine.-Teçhizat, Bilgisayar ve Yazılım ile Donanım Alımları

6.1.4.2. Bina Büyük Onarımları Kapsamında Yapılan İşler:

Bu proje kapsamında; Merkezi Derslik ve Amfi binası 7 nolu ve kesin hakediş ödemesi, Dış Hekimliği Fakülte Binası Çatı Tadilatı işinin 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu kesin hakediş ödemesi, Öğrenci Kafeteryası ve Çevre Düzenlemesi işinin 1, 2 ve 3 nolu kesin hakediş ödemesi, Bina Tadilat ve Onarımları işi 1,2, 3, 4 ve 5 nolu kesin hakediş ödemesi, Mavera Kültür ve Kongre Merkezi Tadilatı işinin ödenmeyen 5 nolu hakedişi ve gecikme faizi ödemesi yapılmıştır . Ayrıca doğrudan temin usulü ile; Dış Hekimliği Fakültesi binası deprem analizi, Sağlık Hizmetleri MYO binası asansör tadilatı, Engelli ulaşılabilirlik çalışması ve arşiv yapılması işi, Makine Mühendisliği idari binası bodrum kat tadilatı, 49 adet asansörün ikinci 6 aylık bakımı, Rektörlük klima, dış ünite değişimi ve Park Bahçeler birimi kombi değişimi, Atatürk Kültür Merkezi klima onarımı, Tıp Fakültesi binası deprem performans analizi, Asansörlere yedek parça alımı, Kampüs içerisinde muhtelif onarımlar, Misafirhanenin bir kısmının Toplum Sağlığı Merkezine dönüştürülmesi işleri doğrudan temin usulüyle yaptırılmıştır Ayrıca ; G.Ü. Merkez Kampüsü Prime Mall tarafı giriş çıkış kapılarının sökülmesi, Kampüs alanında arızalı telefon kablolarının değiştirilmesi, muhtelif yerlerde boya yapılması ve kapı açılması, Seyirtepe tesislerine Atatürk silüeti alımı, Arızalı telefon kablolarının değişimi, İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi klima sisteminin bakımı, Biyoloji bölümüne laboratuvar yapılması, kampüs içinde muhtelif yerlerde çatı onarımı yapılması, Naci Topçuoğlu MYO'na laboratuvar yapılması, Sağlık Hizmetleri MYO LPG tesisatı tadilatı, Merkez kampüs Şahinbey kapısı yapılması, Biyoloji bölümüne laboratuvar ve bölme duvar yapılması, kampüs içerisinde muhtelif onarımlar, Temel Tıp Bilimleri ve Tıp Fakültesi Dekanlık binasının boya işlerinin yapılması, Nizip Eğitim Fakültesi su deposunun tadilatı, Taşıt İşletme Müdürlüğünde ve 83 nolu lojmanda tadilat yapılması, 81 nolu lojmanın tadilatı, Pis su hatlarının tadilatları ve onarımları, Turizm Fakültesi boya işlerinin yapılması ve 88 nolu lojmanın tadilatı, Çocuk Hastanesi çevresi için aydınlatma armatürleri alımı işleri yaptırılmıştır. Tüm bu işler için 10.564.966,80 ₺ harcama yapılmıştır.



6.1.5. Yayın Alımı

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2021H03-167424	
Proje Adı	Yayın Alımı (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversitemizdeki akademik personel ve öğrencilerimizin dünyadaki bilimsel gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yayınları takip edebilmesi ve çalışmalarında kullanacakları her türlü ortamdaki bilgiye erişmeleri için gerekli yayınların (basılı ve elektronik ortamda) sağlanmasıdır.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021	
Projenin Yılı Ödeneği	2.200.000,00	2.452.000,00
Yapılan Harcama (₺)	2.449.303,69	

Bu proje kapsamında; 2021 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 2.200.000,00 ₺ ödenek verilmiş ve yıl içinde 252.000,00 ₺ ekleme işlemi yapılmıştır. Bu ödenekten 2021 yılı sonunda 2.449.303,69 ₺ harcanmış olup, harcama oranı %99 olarak gerçekleşmiştir. Harcanan ödenek ile 18 adet veri tabanı ödemesi, 594 adet Yabancı dilde e-kitap alımı yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemizin satın aldığı ve abone olduğu veri tabanlarına ilişkin bilgiler aşağıda tablolandırılmıştır.

SATIN ALINAN VE ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI			
SIRA NO	VERİ TABANI ADI	KONUSU	HARCAMA BEDELİ
1	American Pyhsical Society	Fen Bilimleri	62.758,88
2	ASTM	Fen Bilimleri	118.089,25
3	Cambridge University Press	Sosyal Bilimler	63.459,37
4	Clinical Key	Tıp	291.570,11
5	İdealonline	Genel	26.016,99
6	Institute of Physics (IOP)	Fen Bilimleri	114.491,19
7	Journal Citation Report	Sosyal Bilimler	83.607,33
8	Lexpera	Sosyal Bilimler (Hukuk)	9.204,00
9	McGraw Hill Access Medicine	Tıp (e-kitap)	148.064,47

10	Oxford Online Journals	Genel	144.118,29
11	Passport GM	Sosyal Bilimler	155.045,66
12	Primal Pictures	Tıp	86.800,64
13	Proquest Central	Genel	441.235,79
14	Proquest e-book Central	Genel (e-kitap)	129.736,32
15	SOBİAD	Sosyal Bilimler	13.015,00
16	Summon	Keşif Aracı (Arama)	109.286,63
17	TSE Standart veri tabanı	Genel	75.600,00
18	Uptodate	Tıp	235.955,30
19	Springer e-book	Mühendislik	87.514,00
GENEL TOPLAM (₺)			2.449.303,69

Tablo 9: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları

2019-2021 YILLARI ARASI TOPLAM KÜTÜPHANE KAYNAKLARI									
	2019			2020			2021		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	130.053	213.491	343.544	135.405	249.860	385.265	138.647	267.071	405.718
Dergi Aboneliği	32	68.621	68.653	32	71.667	71.699	18	75.493	75.511
Tez	3.182	4.943.032	4.941.214	3.278	5.116.539	5.119.817	3.922	5.338.828	5.342.750
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	-	42	42	-	39	39	-	35	35*
Standartlar	17.719	18.392	36.091	17.719	18.603	36.322	17.719	61.482	79.201
DVD-VCD (Bluray-3D)	2.525	-	2.525	2.525	-	2.525	2.525	-	2.525
TOPLAM	153.511	5.243.516	5.397.027	158.998	5.456.669	5.613.103	162.831	5.742.907	5.903.213

Tablo 10: 2019-2021 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları

(*)15 adet veri tabanı ULAKBİM/EKUAL kapsamında üniversitemizin erişimine açık olup, 2 adet veri tabanının ödemesi 2020 yılında tamamlanmış olup 2021 yılında erişimleri devam etmiştir

6.2. SAĞLIK SEKTÖRÜ

6.2.1. Muhtelif İşler

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2021100-155529	
Proje Adı	Muhtelif işler (Makine Teçhizat Büyük Onarımlar)	
Sektör/ Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Sağlık Alanında İyileştirme	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Büyük Onarım, Makine-Teçhizat	
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021	
Projenin Yılı Ödeneği	19.099.000 (1.000.000,00 Döner Sermaye)	19.230.000
Yapılan Harcama (₺)	14.068.206,10	

Proje kapsamında; 2021 Yılı Bütçe Kanunu ile hastaneye makine teçhizat alımları için 8.999.000,00₺, büyük onarımlar için 10.100.000 olmak üzere toplam 17.999.000,00 ₺ ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde bu projeye ödenek aktarma yoluyla 131.000 ₺ ödenek eklmiş ve yıl sonu itibariyle toplam ödenek 18.130.000,00 olmuştur. Bu ödenekten 2021 yılı sonunda 14.068.206,10 ₺ harcama yapılmış olup, harcama oranı %73,16 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca kaynağı döner sermayeden olmak üzere projeye yatırım programıyla 1.100.000,00₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde döner sermaye kaynağından herhangi bir harcama yapılmamıştır.

6.2.1.1. Makine Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Özel Bütçe):

Üniversitemizin 2021 Yılı Yatırım Programına; hastanenin makine teçhizat alımları ile bina büyük onarımları için 17.999.000 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde bu ödeneye 131.000 ₺ ödenek ekleme işlemi yapılmış ve yıl sonu itibariyle toplam ödenek 18.130.000 ₺ ulaşmıştır. Bu ödenekten, 2021 yılı sonu itibariyle 14.068.206,10 ₺ tutarında harcama yapılmış ve harcama oranı %77,60 olarak gerçekleşmiştir.

❖ Makine-Teçhizat Alımları:

Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine makine teçhizat alımları için 8.999.000,00₺, ödenek konulmuştur. Bu ödeneye 131.000 ₺ ekleme yapılmış olup yılsonu itibariyle toplam ödenek 9.130.000,00 ₺ ulaşmıştır. Söz konusu ödenekten 2021 yılı sonu itibariyle 9.126.084.17 ₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.


Yıl içinde hastane birimlerine alınan makine teçhizatın dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2021 YILINDA HASTANEMİZE ALINAN MAKİNE, TEÇHİZAT VE TIBBİ CİHAZLARIN DAĞILIMI TABLOSU		
Sıra No	Bölüm/Birim Adı	Harcama (₺)
1	Hastane Geneli (Çeşitli kliniklere alınanlar)	4.089.469,83
2	Mikrobiyoloji A.D.	119.641,00
3	Çocuk Cerrahisi	285.066,00
4	Sterilizasyon Ünitesi	8.680,46
5	Ameliyathane	982.490,55
6	Gastroenteroloji AD.	330.400,00
7	Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.	29.700,00
8	Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi	142.560,00
9	Kalp Damar Cerrahisi AD.	1.204.956,00
12	Hematoloji AD.	291.319,20
13	Kardiyoloji A.D.	430.954,17
14	Ortopedi ve Travmatoloji AD.	421.200,00
15	KBB AD.	197.532,00
16	Acil Tıp AD.	297.000,00
17	Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cer. AD.	96.552,00
18	Fatura Birimi	18.151,52
22	Gün Hastanesi	40.120,00
23	Genel Cerrahi AD.	128.131,00
24	Döner Sermaye Ambarı	12.160,44
TOPLAM (₺)		9.126.084,17

Tablo 11: 2021 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu

❖ Büyük Onarımlar:

Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine büyük onarımlar için 9.000.000,00 ₺ ödenek konulmuştur. Bu ödenekten büyük onarımlar için 4.942.203 ₺ tutarında harcama yapılmış olup, harcama oranı %54,91 olarak gerçekleşmiştir. Alt proje kapsamında; Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi elektrik tesisatı yapımı ve Hastane genel tadilat ve onarım işi ihalelerine ilişkin harcamalar bu projeden yapılmıştır.

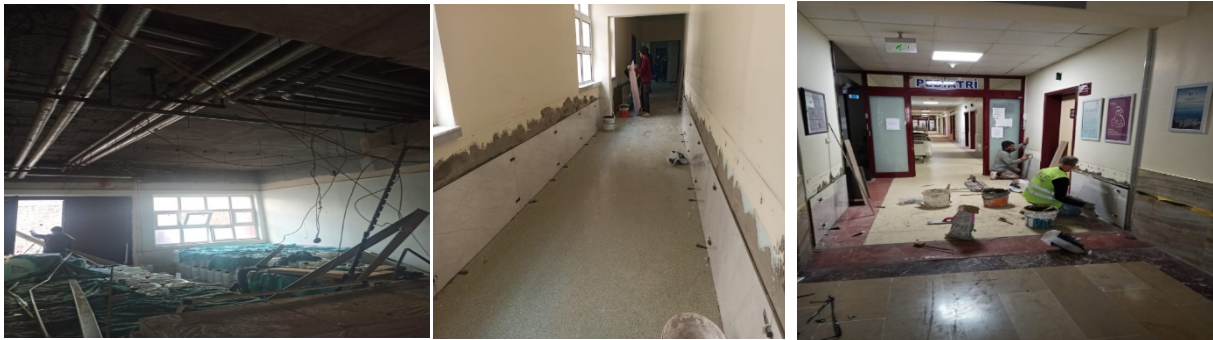

6.2.1.2. Makine, Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye):

Üniversitemizin 2021 Yılı Yatırım Programına; hastanenin büyük onarımlarında kullanılmak üzere kaynağı döner sermayeden olmak üzere 1.100.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup yılsonu itibariyle bu ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır.

6.2.2. Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m²)

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2014I00-2079	
Proje Adı	Çocuk Hastanesi (GAP) (250 Ytk.30.440m ²)	
Sektör/ Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Hasta yoğunluğu nedeni ile daha geniş yerde daha kaliteli hizmet vermek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Hastane İnşaatı (30.440 m ²), (250 yatak), Makine-Teçhizat	
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2021	
Projenin Yılı Ödeneği	11.001.000,00	17.186.000
Yapılan Harcama (₺)	16.607.090,86	

Bu proje kapsamında; 2021 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 11.001.000,00 ₺ ödenek konulmuş, yıl içerisinde likit kaynaklarımızdan 6.316.000,00 ₺ ödenek eklenmiş, 131.000 ₺ denek eklenmiş ve yılsonu itibariyle toplam ödenek 17.186.000 ₺ olmuştur. 2017 yılı ortalarında inşaat çalışmalarına başlanan Çocuk Hastanesinde 2021 yılı sonu itibariyle %100 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

6.2.2.1. Çocuk Hastanesi İnşaatı

250 Yataklı Çocuk Hastanesi Bina İnşaatı	
İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	62.722.467,28 ₺
2020 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	56.983.859,36 ₺
2021 Yılı Harcaması	5.738.607,92 ₺
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	10.07.2017-10.11.2021
İnşaatın Kapalı Alanı	30.440 m ²
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%100
Açıklama	Daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek ve çocuk hastalara daha geniş yerde kaliteli sağlık hizmeti vermek amacıyla 30.440 m ² bir alanda çocuk hastanesi yapımı hedeflenmiş ve

inşaat 2021 yılı sonunda tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Bu proje kapsamında; 2021 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 1.000,00 ₺ ödenek konulmuş, yıl içerisinde likit kaynaklarımızdan 6.316.000,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 6.317.000,00 ₺ olmuştur. Bu projeden 2021 yılında 5.738.607,92 ₺, toplamda ise 62.722.467,28 ₺ tutarında harcama yapılmış ve harcama oranı %91 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile Çocuk Hastanesi açılışı yapılmıştır.

6.2.2.2. Çocuk Hastanesi Makine Teçhizat

Bu proje kapsamında; 2021 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 11.000.000,00 ₺ ödenek konulmuş, Bu projeden 2021 yılı sonu itibariyle 10.868.482,94 ₺ tutarında bir harcama yapılmış ve harcama oranı %99,80 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan harcama ile yeni yapılan Çocuk Hastanesinin makine teçhizat ve donanım ihtiyacı önemli oranda tamamlanmıştır. 2022 yılında bu amaçla bütçeye konulan ödenek ile makine teçhizat ve donanım ihtiyacının tamamlanması planlanmaktadır.

6.3. DİĞER KAMU HİZMETLERİ

6.3.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2020K12-151083	
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	
Sektör/ Alt Sektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma	
Proje Amacı	Bilimsel Araştırma Projelerini Desteklemek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Proje Desteği	
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021	
Projenin Yılı Ödeneği	5.485.000,00	5.485.000,00
Yapılan Harcama (₺)	Bütçe Harcaması: 5.485.000,00 Özel Hesap Harcaması: 30.486.085,43	

Bu proje kapsamında; 2021 Yılı Bütçe Kanunu ile bütçeye 5.485.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, söz konusu ödeneğin tamamı 2021 yılı sonu itibariyle özel hesaba aktarılmıştır.

Özel hesaptan bilimsel araştırma projelerinin cari + yatırım harcamaları için 34.303.765,90 ₺ harcama yapılmış olup, bu tutarın 30.486.085,43 ₺'si yatırım harcamasına aittir.

Diğer taraftan; 2021 yılı içerisinde 127 adet bilimsel araştırma proje desteklenmiş olup bu projeler için 36.872.153,01 ₺ destek ayrılmıştır. 2020 yılından 99 adet proje 2021 yılına devrolmuştur. Ayrıca yıl içerisinde 144 adet proje sonuçlandırılmıştır.

Projeler	Önceki Yılda Devreden Proje Sayısı	2021Yılı İçinde Eklenen Proje Sayısı	Toplam Proje Sayısı	Yıl İçinde Tamamlanan Proje Sayısı
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	99	127	226	144
Genel Toplam	99	127	226	144

Tablo 12: 2021 Yılı İtibariyle BAP Kapsamında Yürütülen Projeler

2021 YILINDA KABUL EDİLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN BİRİMLERE VE TÜRLERE GÖRE DAĞILIMI										
Birimler	Kapsamlı	ÖKAP	Alt Yapı	Hızlı Destek	Destek	Uzmanlık Tezi	Yüksek Lisans	Doktora	GAP	Toplam
Diş Hekimliği Fakültesi	0	0	0	0	0	12	0	1	0	13
Eğitim Fakültesi	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Fen Bil. Enstitüsü	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Fen Edebiyat Fakültesi	1	0	0	0	0	0	11	7	0	19
Güzel San. Fakültesi	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
Hav. ve Uzay Bil. Fakültesi	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
İkt. ve İdari Bil. Fakültesi	0	0	3	0	0	0	0	2	0	5
İlahiyat Fakültesi	0	0	1	0	0	0	2	0	0	3
İletişim Fakültesi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mühendislik Fakültesi	1	2	1	0	0	0	7	4	0	15
Naci Top. MYO.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Rektörlük	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Sağlık Bil. Enstitüsü	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Sağlık Bil. Fakültesi	0	0	1	0	0	0	2	0	0	3
Spor Bil. Fakültesi	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Tıp Fakültesi	1	0	9	1	1	21	13	4	0	50
TOPLAM	4	2	19	2	1	33	47	18	1	127

Tablo 13: 2021 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Arş. Projelerinin Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı

6.3.2. Merkezi Arařtırma Laboratuvarı

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2010K12-1326	
Proje Adı	Merkezi Arařtırma Laboratuvarı	
Sektör/ Alt Sektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Arařtırma	
Proje Amacı	Bilimsel Arařtırma Projelerini Desteklemek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiđi	İnřaat (6.314 m2),Makine-Teçhizat, Teknolojik Arařtırma	
Başlama-Bitiř Tarihi	2010-2021	
Projenin Yılı Ödeneđi	2.000,00	2.000,00
Yapılan Harcama(₺)	Bütçe Harcaması:2.000,00 Özel Hesap Harcaması: 0,00	

Bu proje kapsamında; 2021 Yılı Bütçe Kanunu ile 2.000,00 ₺ ödenek verilmiş olup, söz konusu ödeneđin tamamı proje özel hesabına aktarılmıştır. Özel hesaba aktarılan tutarlardan herhangi bir harcama yapılmamıştır. Proje özel hesabındaki tutarların 2022 yılında harcanarak projenin tamamlanması hedeflenmektedir.



7. EKLER

7.1 2021 Yılı Kamu Yatırımları Özeti (Yılsonu)

Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar (Özel Bütçe+Döner Sermaye)

2021 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama			2021 Yılı Program Ödeneği			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Eğitim	5	0	43.178	0	0	4.745	0	0	19.900	0	0	33.182	0	0	30.222
Sağlık	3	0	118.987	0	0	81.571	0	0	31.100	0	0	37.416	0	0	30.864
D.K.H	2	0	40.589	0	0	27.304	0	0	5.495	0	0	13.285	0	0	13.277
Toplam	10	0	202.764	0	0	113.620	0	0	56.495	0	0	83.883	0	0	74.363

Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar (Özel Bütçe)

2021 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama			2021 Yılı Program Ödeneği			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Eğitim	5	0	43.178	0	0	4.745	0	0	19.900	0	0	33.182	0	0	30.222
Sağlık	3	0	117.887	0	0	81.571	0	0	30.000	0	0	36.316	0	0	30.864
D.K.H	2	0	40.589	0	0	27.304	0	0	5.495	0	0	13.285	0	0	13.277
Toplam	10	0	201.654	0	0	113.620	0	0	55.395	0	0	82.783	0	0	74.363

Bütçe Türü: Döner Sermaye

2021 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama			2021 Yılı Program Ödeneği			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Sağlık	1	0	1.100	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0
Toplam	1	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100	0	0	1.100	0	0	0

7.2 2021 Yılı Harcamaları Yılısonu Gerçekleşme Raporu

Sektör Adı: Eğitim

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2020 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	+ / -	Aktarma/ Tenkis Mikt.	Harcama Dış Kredi	Harcama Dış Özkaynak	Harcama Toplam
1	1988H03-146	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2022	Gaziantep	0,	9.138	1.615	0,	0,	1	+	3.721	0,	0,	916
2	2020H03-150666	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2022	Gaziantep	0,	8.630	3.130	0,	0,	4.000	+	100	0,	0,	4.089
3	2020H03-150615	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2021	Gaziantep	0,	500	0,	0,	0,	500,	+	0	0,	0,	500
4	2021H03-167459	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2021	Gaziantep	0,	22.408	0,	0,	0,	13.199	+	9.209	0,	0,	22.268
5	2021H03-167424	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2021	Gaziantep	0,	2.452	0	0	0	2.200	+	252	0	0	2.449
Toplam						0,	43.128	4.745	0,	0,	19.900	+	13.282	0,	0,	30.222

Sektör Adı: Sağlık

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2020 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	+ / -	Aktarma/ Tenkis Mikt.	Harcama Dış Kredi	Harcama Dış Özkaynak	Harcama Toplam
1	2014I0D-2079	Çocuk Hastanesi İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2021	Gaziantep	0,	81.388	75.071	0,	0,	1	+	6.316	0,	0,	5.739
		Çocuk Hastanesi (Makine Teçhizat)		2021	Gaziantep	0,	17.369	6.500	0,	0,	11.000	-	131	0,	0,	10.868
2	2021I00-155529	Muhtelif işler	ÖZEL BÜTÇE	2021	Gaziantep	0,	19.230	0,	0,	0,	19.099	+	131	0,	0,	14.068
			DÖNER SERMAYE	2021	Gaziantep	0	1.100	0	0	0	1.100	+	0	0	0	0
3	2021I00-155780	Acil Travma ve Yanık Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2021	Gaziantep	0	1.000	0	0	0	1.000	+	0	0	0	189
Toplam							118.987	81.571	0,	0,	31.100		6.316	0,	0,	30.864

Sektör Adı: D.K.H.

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2020 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	+ / -	Aktarma/Tenkis Mikt.	Harcama Dış Kredi	Harcama Dış Özkaynak	Harcama Toplam
1	2010K12-1326	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2021	Gaziantep	0	27.306,	27.304	0	0,	2	+	0	0	0,	2
2	2021K12-168777	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2021	Gaziantep	0	13.283	0	0,	0,	5.493	+	7.790	0,	0,	13.275
Toplam							40.589	4.989,	0,	0,	5.495,	0	7.790	0,	0,	13.277
