



T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Başkanlığı
Ocak-2023



T.C
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Ocak-2023

1. ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ



1973'den günümüze, şehirle bütünleşmiş ve şehrin gelişimine katkı sağlayan, hayatın içinde bir üniversite vizyonu ile hareket eden Gaziantep Üniversitesi; Türkçe, İngilizce ve Arapça eğitim veren Ülkemizdeki tek üniversitedir. 107 ülkeden 7.000'ün üzerinde yabancı uyruklu öğrencisi ile çok renkli, çok kültürlü, çok dilli ve huzurlu bir üniversitedir. Üniversitemiz bugün itibarıyla; 20 fakülte, 2 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 32 araştırma ve uygulama merkezi, 1.760 seçkin akademik personeli, 1.629 idari personeli, 1.772 sürekli işçi olmak üzere toplam 5.161 personel ile 51.687 öğrenci sayısı ile ülkemizin önde gelen üniversitelerinden birisi olmuştur.

Üniversitemizin 2022 yılı yatırım programında; eğitim sektöründe 5, sağlık sektöründe 3 ve diğer kamu hizmetleri sektöründe 2 olmak üzere toplam 10 adet yatırım projesi yer almaktadır. Söz konusu yatırım projelerine merkezi yönetim bütçesinden 52.094.000,00 ₺ döner sermaye bütçesinden 1.170.000,00 ₺ olmak üzere toplam 53.264.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde bu projelere gelir fazlası karşılığı, likit kaynaklarımızdan ve yedek ödenekten toplam 42.946.000,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 96.210.000,00 ₺'ye ulaşmıştır. 2022 yılı sonu itibarıyla bu ödeneğin toplam 68.276.039,71 ₺'si harcanmıştır. Tıp Fakültesi Taşınır Ambarı inşaatının ikmal inşaatı 17.700.000,00 ₺. bedel karşılığında ihale edilmiş ve inşaatın 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır. Diğer taraftan; 2022 yılı yatırım programında yer alan Acil Travma ve Yanık Hastanesi 284.970.000,00 ₺ bedel ile ihale edilmiştir. İnşaatın yer teslimi 29.11.2022 tarihinde yapılmış olup, yılsonuna kadar inşaat için 6.965.727,80 ₺ harcama yapılmıştır. Sözleşmeye göre inşaatın 28.11.2024 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25. maddesi gereği Üniversitemiz yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmek üzere 2022 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN

Rektör

2. İÇİNDEKİLER

1.	ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ.....	iii
2.	İÇİNDEKİLER.....	iv
3.	ŞEKİLLER TABLOSU	v
4.	GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
4.1.	Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	2
4.2.	Yatırımların Finansman Kaynakları	3
4.3.	Kuruluşun Mevcut Kapasitesi.....	3
4.4.	2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	5
5.	2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	6
5.1.	Genel Yatırım Uygulama Durumu	6
5.2.	Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar/Öneriler	7
6.	2022 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	8
6.1.	EĞİTİM SEKTÖRÜ	8
6.1.1.	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	8
6.1.2.	Derslik ve Merkezi Birimler.....	9
6.1.3.	Kampüs Altyapısı.....	10
6.1.4.	Muhtelif İşler.....	11
6.1.4.1.	Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Donanım Alımlarına İlişkin Tablolar.....	12
6.1.4.2.	Bina Büyük Onarımları Kapsamında Yapılan İşler:.....	13
6.1.5.	Yayın Alımı	13
6.2.	SAĞLIK SEKTÖRÜ.....	15
6.2.1.	Muhtelif İşler.....	15
6.2.1.1.	Makine Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Özel Bütçe):	15
6.2.1.2.	Makine, Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye):.....	16
6.2.2.	Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m ²)	17
6.2.2.1.	Çocuk Hastanesi Makine Teçhizat	17
6.2.3.	Acil Travma ve Yanık Hastanesi	17
6.2.3.1.	Acil Travma ve Yanık Hastanesi İnşaatı	18
6.3.	DİĞER KAMU HİZMETLERİ.....	18
6.3.1.	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri.....	18
6.3.2.	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	20
7.	EKLER.....	21
7.1	2022 Yılı Kamu Yatırımları Özeti (Yılsonu).....	21
7.2	2022 Yılı Harcamaları Yılsonu Gerçekleşme Raporu	23

3. ŐEKİLLER TABLOSU

Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler	2
Tablo 2: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı	3
Tablo 3: Tamamlanan İnşaatlar ve İşler	5
Tablo 4: Devam Eden İnşaatlar ve İşler	5
Tablo 5: 2022 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı	6
Tablo 6: 2022 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı	7
Tablo 7: 2022 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı	7
Tablo 8: Muhtelif İşler Proj. Makine.-Teçhizat, Bilgisayar ve Yazl. Donanım Alm. Tablosu	12
Tablo 9: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları	13
Tablo 10: 2020-2022 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları	14
Tablo 11: 2022 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Tablosu	16
Tablo 12: 2022 Yılı İtibariyle BAP Kapsamında Yürütölen Projeler	19
Tablo 13: 2022 Yılında Kabul Edilen Bil. Arş. Proj. Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı	19



4. GENEL DEĞERLENDİRME

Üniversitemizin 2020-2024 dönemi stratejik planında; kurumsal misyon, vizyon amaç ve hedefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

MİSYONUMUZ

Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli insan yetiştiren; bireylere, topluma ve tüm kurum-kuruluşlara eğitim, bilim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında hizmet üreten değişime açık bir üniversite.

VİZYONUMUZ

Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde uluslararası rekabet kabiliyeti yüksek bir dünya üniversitesi olmak.

4.1. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemizin 2020-2024 dönemi Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedefler aşağıda sıralanmıştır. 2022 yılı yatırımlarına da bu amaç ve hedefler doğrultusunda harcama yapılmıştır.

Stratejik Amaç-1 Ulusal ve Uluslararası Alanda Etkin, Saygın, Girişimci ve Yenilikçi Bir Araştırma Üniversitesi Olmak	
Hedef-1	Bilimsel araştırmaları nicelik ve nitelik olarak arttırmak,
Hedef-2	Üniversitenin ulusal ve uluslararası tanınırlığını ve başarı endekslerindeki düzeyini arttırmak,
Hedef-3	Araştırma materyalleri ve fiziki altyapısının güçlendirilmesi,
Hedef-4	Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların üniversitemizde yapılmasının teşvik edilmesi,
Stratejik Amaç-2 Sağlık alanında bölgesel referans merkezi olmak	
Hedef-1	Yurt içi ve yurt dışı sağlık turizminin geliştirilmesi,
Hedef-2	Hastanelerin fiziki ve teknolojik alt yapısının güçlendirilmesi,
Stratejik Amaç-3 Etkin ve sürdürülebilir üniversite Sanayi işbirliğinin sağlanması	
Hedef-1	AR-GE işbirliklerini arttırmak
Hedef-2	Teknoloji Transfer Ofisi (TARGET TTO) ile TEKNOPARK'ın etkinliğinin geliştirilmesi,
Stratejik Amaç-4 Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli eğitim yapmak	
Hedef-1	Nitelikli öğretim elemanı sayısını arttırmak,
Hedef-2	Üniversitenin tanıtımı yapılarak nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine zemin hazırlamak,
Hedef-3	İhtiyaç duyulan eğitim, sportif ve sosyal binalarının yapılması, mevcut binaların yenilenmesi ve kampüs altyapısının iyileştirilmesi,
Hedef-4	Eğitim materyalleri alt yapısını güçlendirmek,
Hedef-5	Ders dışı eğitim ve sertifika programlarının yaygınlaştırılması,
Hedef-6	Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere katılımının artırılması,
Stratejik Amaç-5 Kurumsallaşma ve Kurum Kültürünün Güçlendirilmesi	
Hedef-1	Kurum iş ve hizmet kalitesinin artırılması,
Hedef-2	Kurumsal aidiyetin artırılmasına yönelik eğitim ve sosyal faaliyetleri arttırmak,

Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler

4.2. Yatırımların Finansman Kaynakları

2022 yılı yatırım programında bulunan 10 adet yatırım projesi için; 2022 yılı Bütçe Kanunu ile 52.094.000,00 ₺, döner sermaye bütçesinden ise 1.170.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, toplam yatırım ödeneğimiz 53.264.000,00 ₺ olmuştur. Yıl içinde yedek ödenekten 17.314.000,00 ₺, likit karşılığı 10.362.000,00 ₺, gelir fazlası 15.270.000,00 ₺, olmak üzere toplam 42.946.000,00 ₺ ödenek eklenmiş olup, 2022 yılı sonu itibariyle toplam ödenek 96.210.000,00 ₺'ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 68.276.039,71 ₺'si harcanmış, harcama oranı ise %70,97 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemize verilen 53.264.000,00 ₺'lik başlangıç yatırım ödeneğinin 44.152.000,00 ₺' si hazine yardımı, 7.942.000,00 ₺' si öz gelir ve 1.170.000 ₺' si döner sermaye ödeneğinden oluşmaktadır. 2022 yılsonu itibariyle hazine yardımı, öz gelir, likit kaynaklar ile döner sermaye ödeneklerinin dağılımı ve harcamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı (Bin ₺)				
Finans Kaynağı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı (%)
Hazine Yardımı	44.152	61.466	45.204	63
Likit Kaynaklar Karşılığı Kaydedilen	0	10.362		
Öz Gelir ve Gelir Fazlası Karşılığı Kaydedilen	7.942	23.212	23.072	99
Bütçe Toplamı	52.094	95.040	68.276	72
Döner Sermaye	1.170	1.170	0	0
GENEL TOPLAM	53.264	96.210	68.276	71

Tablo 2: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı

4.3. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi

Gaziantep Üniversitesinin temeli, 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümüne dayanmaktadır. 27 Haziran 1987 yılında, 3389 sayılı yasa ile bugünkü statüsüne kavuşan üniversitemiz zaman içerisinde hızla büyüyerek bugün itibariyle; 20 Fakülte, 2 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 5 Enstitü, 32 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1.760 akademik personel, 1.629 idari personel, 1.772 sürekli işçi olmak üzere toplam 5.161 personel ve 51.687 öğrencisi ile sadece bölgemizin değil ülkemizin sayılı üniversiteleri arasına girmiş bulunmaktadır. Gaziantep Üniversitesinin toplam yüzölçümü 3.123.678,25 m², toplam kapalı alanı ise 517.931 m²'dir. Üniversitemizin toplam 8 adet yerleşkesi bulunmaktadır. Merkez kampüste 88 adet lojman bulunmakta olup bu lojmanların 8 tanesi dubleks, 16 tanesi 2+1, geriye kalan 64 tanesi ise 3+1'dir.



Sağlık açısından bakıldığında; Üniversite hastanemiz özellikle çevre illerden ve komşu ülkeler Irak, Suriye yoğun taleple karşılaşmakta olup, hakem hastane olarak bölgenin tek hastanesi konumundadır. 2.000 yılında kampüs içinde yer alan bina hizmete alınmış ve geçen yıllar içinde fiziki kapasite sürekli gelişmiştir. İhtiyaçların şekil ve boyut değiştirmesi ile sürekli yenilenme devam etmektedir. 1.026 yatak kapasiteli hastanelerimizde günlük ortalama 4.600'in üzerinde poliklinik

hizmeti verilmekte, yılda 50.000 üzerinde de ameliyat yapılmaktadır. Ayrıca 250 yatak kapasiteli Çocuk Hastanesi tamamlanmış, bölgemiz açısından önemli bir ihtiyaç giderilmiştir.

Hastanemiz bünyesinde; 110 poliklinik, 44 klinik, Diyaliz ünitesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, Merkez Laboratuvarı, Kan Bankası, Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Üniteleri, Doku Tipleme, Genetik ve Hücre Kültür Laboratuvarı, Patoloji, Androloji ve İnfertilite Laboratuvarı hizmetleri verilmektedir.

Üniversitemiz Hastanesi, tıp alanında Türkiye'nin en iyi araştırma ve uygulama hastanelerinden biridir. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile şehrimizin ve bölgemizin ve hatta komşu ülkelerin sağlık sorunlarına çözüm üretilmektedir. Hastanenin organ nakli konusunda nakil istatistikleri incelendiğinde dünya ölçeğinde bir konuma yerleşmiş olduğu görülecektir. Organ Nakli Merkezinde canlıdan ve kadavradan nakiller yapılmaktadır. Ayrıca 2021 yılında üniversitemizde mevcut bir binanın onarımı yapılarak böbrek nakli merkezine dönüştürülmüş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışı yapılmıştır.



Türk Kanser Vakfı Gaziantep Şubesinin öncülüğü ile temeli 1999 yılında atılan hastane, bir bölge hastanesi konumunda olup, 24 bin metrekare alan üzerinde 10 bin metrekare kapalı alanlı ve 5 katlı inşa edilmiş, 102 yatak kapasitelidir ve modern cihazlarla donatılmıştır. Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi binasının büyük bir bölümünü Gaziantepli hayırsever kişi ve kuruluşların aynı ve nakdi katkılarıyla yapılmıştır. Onkoloji Hastanesi; en modern ve en gelişmiş radyoterapi ve kemoterapi cihazlarıyla, her türlü kanserin

teşhis ve tedavi uygulamasını yapabilecek donanıma sahiptir. Alanında uzman hekimlerimiz tarafından muayeneleri yapılan hastalarımızın mümkün olan en çok yararı elde edebilecekleri tedavi süreci belirlenmektedir. Hastaların tanı tedavi sürecinin hızlı olabilmesi amacıyla bünyesinde laboratuvar hizmeti veren hastanemiz sadece Gaziantep ve çevre illere değil komşu ülkelerden gelen hastalarında umut ışığı olmuştur.



Üniversitemizde diş sağlığı hizmetleri Diş Hekimliği tarafından verilmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi, 31.10.2006 tarihinde 26332 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak kurulmuştur. 2008 yılının Nisan ayında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi binasında eğitim-öğretim ve tedavi hizmetine başlamıştır. Kasım 2012 tarihi itibarıyla de 16.370 m² kapalı alana sahip yeni binasına taşınan

Diş Hekimliği Fakültemiz burada hizmet vermeye başlamıştır. Fakültemiz; Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Periodontoloji, Pedodonti, Endodonti, Diş Hastalıkları ve Tedavisi ile Ağız, Diş ve Çene Radyoloji Anabilim Dallarında ilimiz ve çevre illerden gelen hastalara hizmet vermektedir. Ayrıca tescilli alınmış olan Genel Anestezi Ameliyathanesi hizmete açılmış olup, hizmete alınan Güneydoğu bölgesine ve Sağlık turizmi kapsamında komşu ülkelere de hizmet verecektir. Son olarak Diş Hekimliği Fakültemizin; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri standardına göre Ocak 2020'de eğitim ve hastane kapsamında belgelendirilmesi tamamlanmıştır. Fakültemiz; TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi, Eğitim-öğretim hizmetleri ve ağız diş sağlığı hizmetleri sunumu ve Mekânda Erişim konusunda yapılan düzenlemelerle Turuncu Bayrak almaya hak kazanmıştır.

4.4. 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2022 yılında Üniversitemizde; Çocuk Hastanesi Bağlantı yoluna istinat duvarı yaptırılması, 2022 yılı genel bina tadilat ve onarımları yaptırılması ve Araban MYO. Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılması işleri tamamlanmıştır. Ayrıca kapalı alanı 5.040 m² olan Tıp Fakültesi Ambar Binası ile kapalı alanı 24.850 m² olan Acil Travma ve Yanık Hastanesi işlerinin yapımına devam edilmekte olup, Tıp Fakültesi Ambar binasının 2023 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Turizm ve Otelcilik MYO tadilatları işinin ihalesi tamamlanmış, yer teslimi yapılmıştır.

Yatırım projeleri kapsamında 2022 yılında Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca tamamlanan işler ile devam eden inşaatlar aşağıda gösterilmiştir.

Tamamlanan İnşaatlar ve İşler			
İnşaatın/İşin Adı	İşin Toplam Maliyeti	İşin Başlangıç/Bitiş Tarihi	Tamamlanma Süresi (Ay)
1- Çocuk Hastanesi Bağlantı Yoluna İstinat Duvarı yapılması	1.789.512,26	21.07.2022 -22.09.2022	2 ay
2- 2022 Yılı Bina Tadilat ve Onarımları	2.969.980,99	18.03.2022 - 13.09.2022	6 ay
3- Araban MYO Doğalgaz Dönüşüm yapılması	460.480,89	25.10.2022 -28.11.2022	1 ay
TOPLAM	5.219.974,14		

Tablo 3: Tamamlanan İnşaatlar ve İşler

Devam Eden İnşaatlar ve İşler				
İnşaatın Adı	İhale Bedeli (KDV Dâhil)	Kapalı alanı (m ²)	İnşaatın Başlangıç/Bitiş Tarihi	Tamamlanma Oranı (%)
1-Tıp Fakültesi Ambar Binası İkmal İnşaatı	17.700.000,00	5.040	07.10.2022-4.04.2023	30
2- Acil Travma ve Yanık Hastanesi inşaatı	284.970.000,00	24.820	29.11.2022-28.11.2024	2
3-Turizm ve Otelcilik MYO. Tadilatları	1.301.365,11		23.12.2022-21.05.2023	0
TOPLAM	303.971.365,11	29.860		

Tablo 4:Devam Eden İnşaatlar ve İşler

5. 2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

5.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım projelerinin harcamaları için bütçeden 52.094.000,00 ₺ ve döner sermaye bütçesinde ise 1.170.000,00 ₺ ödenek verilerek toplam ödenek 53.264.000,00 ₺ olmuştur. Yıl içinde bu ödeneye 17.314.000,00 ₺ si yedek ödenekten olmak üzere toplam 42.946.000,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 96.210.000,00 ₺' ye ulaşmıştır. Anılan bu ödenenin 68.276.039,71 ₺' si yıl içinde 10 adet yatırım projesi için harcanmış ve harcama oranı % 71 olarak gerçekleşmiştir.

SEKTÖR ADI:	PROJE ADI	PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
EĞİTİM SEKTÖRÜ	Muhtelif İşler	8.002.000	8.000.000	12.604.000	12.429.532,28
	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	200.000	200.000	200.000	123.669,90
	Derslik ve Merkezi Birimler	10.173.885	3.100.000	4.615.000	4.614.641,90
	Kampüs Altyapısı	14.500.000	3.000.000	2.840.000	2.834.097,95
	Yayın Alımı	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.570.017,67
SAĞLIK SEKTÖRÜ	Muhtelif İşler	9.170.000	9.170.000	14.044.000	11.733.887,33
	Döner Sermaye	1.170.000	1.170.000	1.170.000	0
	Çocuk Hast. İnş. (250 Ytk. 30.440 m2)	97.938.000	0	0	0
	Çocuk Hast. Makine Teçhizatı	29.892.000	9.000.000	6.440.000	6.439.464,88
	Acil Travma ve Yanık Hastanesi (134 Ytk. 24.820 m2)	185.300.000	12.000.000	32.300.000	6.965.727,80
D.K.H	Rektörlük Bilimsel Araşt. Projeleri	6.192.000	6.192.000	20.565.000	20.565.000
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	32.325.000	2.000	2.000	0
TOPLAM		396.292.885	53.264.000	96.210.000	68.276.039,71

Tablo 5: 2022 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı

2022 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin ₺)					
Sektör Adı	Proje Sayısı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
Eğitim	5	16.900	22.859	22.572	99
Sağlık	3	30.170	52.784	25.139	48
D.K.H	2	6.194	20.567	20.565	100
TOPLAM	10	53.264	96.210	68.276	71
(*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.					

Tablo 6: 2022 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı

2022 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı (Bin ₺)					
Sektör Adı	Proje Sayısı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
Tamamlanan Projeler	7	18.100	56.455	53.862	95
Devam Eden Projeler	3	35.164	39.755	14.414	36
TOPLAM	10	53.264	96.210	68.276	71
(*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.					

Tablo 7: 2022 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı

5.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar/Öneriler

- ❖ Yatırım tavanlarının belirlenmesi sürecinde, yatırımcı kuruluşlar ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile daha fazla görüşme yapılarak sürdürülebilir yatırım tavanlarının ortaya çıkması sağlanabilir. Bu yolla hem yıl içinde yatırımların aksamadan yürütülmesi sağlanacak hem de yıl içinde oluşacak yedek ödenek talepleri de en aza indirilebilecektir.
- ❖ Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve mevsimsel şartlar Strateji ve Bütçe Başkanlığınca göz önüne alınır ve buna göre ödenek oranı belirlenirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir.
- ❖ Ayrıntılı Finans Programının sadece ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde hazırlanması 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine uygun olacaktır.
- ❖ Ödenek tavanları belirlenmesi sürecinde objektif kıstas belirlenerek, bu kriterlerin bütçe hazırlayan kurumlara duyurulması halinde daha reel duruma uygun bütçeler ortaya çıkacaktır.
- ❖ Kurumların, öz gelirlerini yatırım bütçesine tam olarak yansıtma imkânı sağlanmalıdır.

6. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI

Üniversitemiz 2022 Yılı Yatırım Programında 10 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Bunların beşi eğitim, üçü sağlık, ikisi de diğer kamu hizmetleri sektöründe yer almaktadır. Aşağıda bu projelerin yıl içindeki uygulamaları belirtilmiştir.

6.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ

6.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2022H03-186617	
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	İnşaat ve ihale aşaması için hazırlık yapılması ve projelendirme işlerinin yapılması.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Etüd-Proje ve Müşavirlik	
Başlama-Bitiş Tarihi	2022- 2022	
Projenin Yılı Ödeneği	200.000	200.000
Yapılan Harcama (₺)	123.669,90	

Bu proje kapsamında; 2022 Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 200.000,00 ₺ ödenek verilmiştir. Bu ödenekten 2022 yılı sonunda 123.669,90 ₺ harcama yapılmış ve harcama oranı % 62 olmuştur. Proje kapsamında; Kütüphane binası elektrik tesisat uygulama projesi, eski yurt binası deprem performans analizi, Hâlihazır harita yapımı ve ortofoto görüntü elde edilmesi işleri yaptırılmıştır.

6.1.2. Derslik ve Merkezi Birimler

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	1988H03-146	
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Her yıl yeni açılan akademik birimlerin bina ihtiyaçlarını karşılamak ve kapasitesi yetiştirmeyen binalara ek bina yapımını sağlamak	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Eğitim (5.040 m ²)	
Başlama-Bitiş Tarihi	1988 - 2023	
Projenin Yılı Ödeneği	3.100.000	4.615.000
Yapılan Harcama (₺)	4.614.641,90	

Bu proje kapsamında; 2022 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 3.100.000,00 ₺. ödenek verilmiş olup, yıl içinde aktarma ile 130.000,00 ₺. düşülmüş geriye 2.970.000,00 ₺. ödenek kalmıştır. Söz konusu projeye, yıl sonundaki hakkeşin ödenebilmesi için 1.645.000,00 ₺. ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 4.615.000,00 ₺ olmuştur. Söz konusu ödenekten 2022 yılı sonu itibariyle 4.614.641,90 ₺ harcama yapılmış ve harcama oranı % 100 olmuştur. Proje kapsamında; Tıp Fakültesi Ambar Binası İkmal İnşaatı fiziki inşaatı %30 oranında tamamlanmıştır. İnşaatın 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.

Tıp Fakültesi Ambar Binası İkmal İnşaatı	
İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dâhil)	17.700.000,00
2022 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	4.208.828,42
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	07.10.2022-04.04.2023
İnşaatın Kapalı Alanı	5.040m ²
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%30
AÇIKLAMA	Bina; bodrum, zemin, birinci ve ikinci kattan oluşmaktadır. Bodrum katta; arşiv, depo, teknik oda, mescit, Zemin katta; 8 adet ofis, 2 adet temizlik odası bay-bayan wc, Birinci Katta; 8 adet ofis, bay-bayan wc, İkinci Katta ise; 8 adet ofis ve bay-bayan wc bulunmaktadır.

6.1.3. Kampüs Altyapısı

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2020H03-150666	
Proje Adı	Kampüs Alt yapısı (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversite alt yapısının iyileştirilmesi, yeni yapılan binalarda altyapı çalışmalarının yapılması	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	
Başlama-Bitiş Tarihi	1991 -2022	
Projenin Yılı Ödeneği	3.000.000	2.840.000
Yapılan Harcama (₺)	2.834.097,95	

Bu proje kapsamında; 2022 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımıdan 3.000.000,00 ₺ ödenek verilmiş, anılan projeden yılsonunda 165.000,00 ₺ ödenek acil ihtiyaç bulunduğundan, Muhtelif işler projesine aktarılmıştır. Bu ödenekten 2022 yılı sonunda 2.834.097,95 ₺ harcanmış olup, harcama oranı % 100 olarak gerçekleşmiştir.

6.2.3.1. Kampüs Altyapısı Kapsamında Yapılan İşler

Bu proje kapsamında Araban MYO doğalgaz dönüşümü işi ihale usulüyle 460.480,89 ₺ karşılığında yaptırılmıştır. Ayrıca, Çocuk Hastanesi Bağlantı yoluna istinat duvarı yapılması işinin sadece 1 nolu hakediş ödemesi bu projeden yapılmış, kalan ödeme GÜSEM gelirlerinden karşılanmıştır.

Nizip yerleşkesini destekleyen trafoda bulunan arızalı akım düzenleyici trafonun değişimi, muhtelif yerlerde bulunan VRF klima sistemi bakım ve onarımı, Oğuzeli MYO yerleşkesinde sondaj dalgıç pompası değişimi, yeraltı kablo çekimi için malzeme alımı, Kampüs içerisinde çevre düzenlemesi yapılması, Isı Galerisi Tadilat ve Onarımları işi fiyat farkı ödemesi, muhtelif yerlerde pis su hattı tadilatı yapılması, anayol yurt arası ulaşım yolu yapımı, Eğitim Fakültesi C Blok VRF klima sistemi tamirata, Üniversitemiz ve taşra teşkilatında bulunan asansörlerin bakım sözleşmesi, Kampüs içerisinde kullanılmak üzere tıbbi ve aromatik bitki alımı, kampüs alanında bulunan mavera kuyusu ile makine kuyusunun aktif hale getirilmesi işi için malzeme alımı, Naci Topçuoğlu MYO ile Turizm Otelcilik MYO tadilatları, Kimya laboratuvarı merkezi klima sisteminin arızasının giderilmesi, Kampüs alanında sıfır atık alanı yapılması, Kampüs alanında yollara hız kesici kasis yapılması, Kampüs alanında kullanılmak üzere kilit alınması, Kampüs alanında konteyner için su basmanına malzeme alımı, Kültür ve Kongre Merkezi ana binasının hava soğutmalı vidalı kompresörlü soğutma grubunun yıllık bakımı, Kampüs alanında kullanılmak üzere boya alımı , Kampüs alanında kullanılmak üzere kaynak ve hırdavat malzemesi alımı, Mimarlık Fakültesi merkezi klima sistemi tamirata, Kampüs alanında bulunan hidrofor motorlarının ve atölye makinalarının bakım ve onarımı ile bobinaj sarımı, muhtelif yerlerde bulunan VRF klima sistemi tadilatı, İslahiye Kampüsü halı saha ve kafeterya tadilatı, Kampüs çevresi dikenli tel tadilatı, Muhtelif yerlerde

split ve salon klima tadilatı, Nizip MYO. split ve salon tipi klimaların arızalarının giderilmesi işleri doğrudan temin usulüyle toplam 1.581.318,75 ₺ karşılığında yaptırılmıştır.

6.1.4. Muhtelif İşler

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2022H03-186609	
Proje Adı	Muhtelif İşler	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversitenin makine-teçhizat, bilgi teknolojileri, bina onarım ve taşıt ihtiyacını temin etmek.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022	
Projenin Yılı Ödeneği	8.000.000	12.604.000
Yapılan Harcama	12.429.532,28	

Bu proje kapsamında; 2022 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 8.000.000,00 ₺ ödenek verilmiş, anılan toplu projeye; gelir fazlası karşılığı 897.000,00 ₺, likit karşılığı ise 3.707.000,00 ödenek eklenmiştir. Yapılan eklemeler sonucu toplam ödenek 12.604.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten yılsonu itibariyle 12.429.532,28 ₺ harcanmış olup, harcama oranı % 99 olarak gerçekleşmiştir. Proje ile; Makine teçhizat alımları için 1.796.061,90 ₺, Donanım alımları için 1.265.139,57 ₺, Bilgisayar ve Yazılım alımları için 4.667.300,65 ₺, Makine Teçhizat Büyük Onarımları için 771.030,16 ₺, Bina büyük onarımları için 3.930.000,00 ₺ harcama yapılmıştır. Proje Kapsamında yapılan harcamalar ile akademik ve idari birimlerin makine teçhizat, donanım, bilgisayar ve yazılım ihtiyaçları büyük oranda karşılanmıştır.

6.1.4.1. Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Donanım Alımlarına İlişkin Tablolar

BİLGİSAYAR VE YAZILIM ALIMLARI		
Sıra No	Alımın Yapıldığı Harcama Birimi	Harcanan Bütçe
1	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	19.912,50
2	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	65.000,00
3	Sağlık Bilimleri Fakültesi	5.900,00
4	Evrak Arşiv İşleri Müdürlüğü	19.877,10
5	Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu	490.680,00
6	Üniversite Geneli (Merkez Ambarı)	4.065.931,05
Toplam		4.667.300,65

MAKİNA TEÇHİZAT ALIMLARI		
Sıra No	Alımın Yapıldığı Harcama Birimi	Harcanan Bütçe
1	Rektörlük	121.752,40
2	Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi	12.039,20
3	Nurdağı MYO.	9.948,92
4	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	605.406,25
5	Uluğbey Yüksek Tek. Uygulama Ve Arş. Merkezi	165.200,00
6	Üniversite Geneli(Merkez Ambarı)	384.219,19
7	İslahiye MYO.	1.899,80
8	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire başkanlığı	120.950,00
9	Hukuk Fakültesi	92.630,00
10	Tıp Fakültesi	14.000,00
11	Spor Bilimleri Fakültesi	16.000,00
12	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	55.988,64
13	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	168.887,50
		27.140,00
Toplam		1.796.061,90

DONANIM ALIMLARI		
Sıra No	Alımın Yapıldığı Harcama Birimi	Harcanan Bütçe
1	Rektörlük	650,00
2	Üniversite Geneli (Merkez Ambarı)	1.191.926,53
3	Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi	12.955,68
4	Genel Sekreterlik	11.525,76
5	Nizip MYO.	48.081,60
Toplam		1.265.139,57

Tablo 8: Muhtelif İşler Kapsamında Alınan Makine.-Teçhizat, Bilgisayar ve Yazılım ile Donanım Alımları

6.1.4.2. Bina Büyük Onarımları Kapsamında Yapılan İşler:

Üniversitemizdeki bina ile makine teçhizatların bakım onarımları için bütçeye 4.198.000,00 ₺ ödenek konulmuş be ödeneğe yıl içinde 530.000,00 ₺ eklenerek toplam ödenek 4.728.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten yıl sonu itibariyle 4.701.030,16 ₺ harcama yapılmıştır. Bina büyük onarımları alt projesi kapsamında; 2022 yılında yapılan Bina Tadilat ve Onarımları İşine ait 2.969.980,99 ₺ hakkediş ödemesi yapılmıştır. Aynı alt projeden; 2021 yılı Bina Tadilat ve Onarımları işi ile 2021 Öğrenci Kafeteryası ve Çevre Düzenlemesi işlerinin fiyat farkı ödemesi yapılmıştır.

Diğer taraftan; Dış Hekimliği Fakültesi binası çatı oluklarına kompozit kaplama yapılması, 55 adet asansörün bakımı sırasında yıpranan parçaların değişimi, İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonu çatı tadilatı yapılması, Üniversitemiz santrali yıllık bakım sözleşmesi, Üniversitemiz araçlarına ve jeneratörlerine akü alımı, Üniversitemize ait iş makinasının tamirata, Kampüs içerisinde bulunan kaldırım tadilatlarında kullanılmak üzere çimento alımı, Kampüs alanında kullanılmak üzere fiske alımı, Üniversitemiz santralinde arızalı parçaların değişimi, Üniversitemiz araçlarına yedek parça alımı, Üniversitemize ait makam aracının bakım ve tamirata, Üniversitemiz araçlarına lastik alımı, Üniversitemize ait makam aracına bakım ve onarım yapılması, Üniversitemiz araçlarına malzeme alımı, Üniversitemiz araçlarına lastik alımı, atölyelerde kullanılmak üzere çelik hasır alımı, atölyelerde kullanılmak üzere mıcır alımı, Ana kampüs ve yerleşke kampüslerde bulunan asansörlerin periyodik bakımı ve malzeme alımı, Kampüs içerisinde bulunan jeneratörlere kışlık bakım ve malzeme alımı, Başkanlığımıza bağlı ısı merkezine malzeme alımı, Ana kampüsümüzden yerleşke kampüse taşınan makine atölyesine elektrik malzemesi alımı, Üniversitemize ait hızır makinasının tamirata, Jeneratörlerde kullanılmak üzere akü alımı, Üniversitemize ait mini loderin tamirata işleri yaptırılmıştır.

6.1.5. Yayın Alımı

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2022H03-186615	
Proje Adı	Yayın Alımı (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversitemizdeki akademik personel ve öğrencilerimizin dünyadaki bilimsel gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yayınları takip edebilmesi ve çalışmalarında kullanacakları her türlü ortamdaki bilgiye erişmeleri için gerekli yayınların (basılı ve elektronik ortamda) sağlanmasıdır.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022	
Projenin Yılı Ödeneği	2.600.000	2.600.000
Yapılan Harcama (₺)	2.570.017,67	

Bu proje kapsamında; 2022 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 2.600.000,00 ₺ ödenek verilmiştir Bu ödenekten 2022 yılı sonunda 2.570.017,67 ₺ harcanmış olup, harcama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir. Harcanan ödenek ile 10 adet veri tabanı ödemesi, 156.000'den fazla e-kitap erişimi, 1.484'i Türkçe 45 âdeti yabancı dilde olmak üzere toplam 1.529 kitap alımı yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemizin satın aldığı ve abone olduğu veri tabanlarına ilişkin bilgiler aşağıda tablolştırılmıştır.

SATIN ALINAN VE ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI			
SIRA NO	VERİ TABANI ADI	KONUSU	HARCAMA BEDELİ
1	Clinical Key	Tıp	550.403,01
2	İdealonline	Genel	29.919,55
3	Institute of Physics (IOP)	Fen Bilimleri	184.872,06
4	Lexpera	Sosyal Bilimler (Hukuk)	11.965,20
5	Proquest e-book Academic Complete	Genel (e-kitap)	174.792,27
6	SOBİAD	Sosyal Bilimler	15.358,00
7	Springer Nature	Sosyal Bilimler	299.288,32
8	Summon	Keşif Aracı (Arama)	149.874,03
9	Taylor & Francis	Genel	156.044,33
10	TSE Standart Online	Genel	13.500,00
11	Turcademy	Genel	116595,20
12	Uptodate	Tıp	697.339,54
GENEL TOPLAM			2.399.951,51

Tablo 9: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları

2020-2022 YILLARI ARASI TOPLAM KÜTÜPHANE KAYNAKLARI									
Kaynak Türü	2020			2021			2022		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	135.405	249.860	385.265	138.647	267.071	405.718	143.706	457.403	601.129
Dergi Aboneliği	32	71.667	71.699	18	75.493	75.511	15	73.728	73.743
Tez	3.278	5.116.539	5.119.817	3.922	5.338.828	5.342.750	4.145	5.592.562	5.596.707
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	-	39	39	-	35	35	-	26	26
Standartlar	17.719	18.603	36.322	17.719	61.482	79.201	17.719	61.482	79.201
DVD-VCD (Bluray-3D)	2.525	-	2.525	2.525	-	2.525	2.525	-	2.525
TOPLAM	158.998	5.456.669	5.613.103	162.831	5.742.907	5.903.213	168.110	6.185.201	6.353.311

Tablo 10: 2020-2022 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları

6.2. SAĞLIK SEKTÖRÜ

6.2.1. Muhtelif İşler

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2022I00172901	
Proje Adı	Muhtelif işler (Makine Teçhizat Büyük Onarımlar)	
Sektör/ Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Sağlık Alanında İyileştirme	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Büyük Onarım, Makine-Teçhizat, T-2 (1 adet hibe)	
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022	
Projenin Yılı Ödeneği	9.170.000 (1.170.000 Döner Sermaye)	14.044.000
Yapılan Harcama (₺)	11.733.887,33	

Proje kapsamında; 2022 Yılı Bütçe Kanunu ile hastaneye makine teçhizat alımları için 5.000.000 ₺, büyük onarımlar için 3.000.000,00 ₺ olmak üzere toplam 8.000.000 ₺ ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde bu projeye ödenek aktarma yoluyla 4.874.000 ₺ ödenek eklenmiş ve yılsonu itibariyle toplam ödenek 12.874.000 olmuştur. Bu ödenekten 2022 yılı sonunda 11.733.887,33 ₺ harcama yapılmış olup, harcama oranı %84 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca kaynağı döner sermayeden olmak üzere projeye yatırım programıyla 1.170.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde döner sermaye kaynağından herhangi bir harcama yapılmamıştır.

6.2.1.1. Makine Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Özel Bütçe):

Üniversitemizin 2022 Yılı Yatırım Programına; hastanenin makine teçhizat alımları ile bina büyük onarımları için 8.000.000 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde bu ödeneye aktarma yoluyla 4.874.000 ₺ ödenek eklenmiş olup, yılsonu itibariyle toplam ödenek 12.874.000 ₺'ye ulaşmıştır. Bu ödenekten, 2022 yılı sonu itibariyle 11.733.887,33 ₺ tutarında harcama yapılmış ve harcama oranı %84 olarak gerçekleşmiştir.

❖ Makine-Teçhizat Alımları:

Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine makine teçhizat alımları için 5.000.000 ₺, ödenek konulmuştur. Bu ödeneye aktarma yoluyla 4.874.000 ₺ ekleme yapılmış olup yılsonu itibariyle toplam ödenek 9.874.000,00 ₺ ulaşmıştır. Söz konusu ödenekten 2022 yılı sonu itibariyle 9.872.155,66 ₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl içinde hastane birimlerine alınan makine teçhizatın dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2022 YILINDA HASTANEMİZE ALINAN MAKİNE, TEÇHİZAT VE TIBBİ CİHAZLARIN DAĞILIMI TABLOSU		
Sıra No	Bölüm/Birim Adı	Harcama (₺)
1	Hastane Genel	81.037,68
2	Hastane Genel (1250KVA (Tam Yükte) Jeneratör, Senkronizasyon Sistemi Alımı)	5.436.632,00
	Radyoloji A.D.	2.405.138,84
3	Üroloji A.D.	422.067,03
4	Acil Servis	247.981,18
5	Eczane	62.068,00
6	KBB Hastalıkları A.D.	34.047,40
7	Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.	97.511,84
8	Yoğun bakımlar	954.720,00
9	Vezneler	34.159,02
10	Onkoloji	3.673,51
11	Anestezi	3.236,66
12	Adli Tıp	7.820,34
13	Organ nakli	2.336,40
14	Ort. Ve Trav	54.108,00
15	İç Hastalıkları	11.106,12
16	Antikor Tasarım ve Prototip Üretim Merkezi	14.511,64
TOPLAM (₺)		9.872.155,66

Tablo 11: 2022 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu

❖ Büyük Onarımlar:

Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine 2022 yılının bina büyük onarımları için bütçeye 3.000.000 ₺ ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin 873.000,00 ₺.si Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine geriye kalan 2.127.000,00 ₺. ise Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı bütçesine konulmuştur. Hastane bütçesine konulan ödeneklerden; 2021 yılında yapılan Hastane Tadilat İşi için %20 iş artışı verilmiş, bu nedenle iş 2022 yılında da devam etmiştir. %20 iş artışı tamamlanmış ve firmanın ödemeleri yapılmıştır. Ayrıca 2020 yılında ihalesi yapılan Hastane, Onkoloji Binası ile Palyatif Bakım Binasının Tadilat ve Onarım İşi 3.hakediş ödemeleri yapılmıştır. Ayrıca Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı bütçesine konulan ödeneklerden; Hastane tadilat ve onarımları 1 ve 2 nolu fiyat farkı ödemesi, Çelik konstrüksiyon çelik çatı projesi yapımı, Bina Tadilat ve Onarımları işi 4 ve 5 nolu hakediş kalan kısmın ödemesi yapılmıştır. Gerek Hastane gerekse de Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı bütçesine konulan ödeneklerden toplam 1.861.731,67 harcama yapılmıştır.

6.2.1.2. Makine, Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye):

Üniversitemizin 2022 Yılı Yatırım Programına; hastanenin büyük onarımlarında kullanılmak üzere kaynağı döner sermayeden olmak üzere 1.170.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup yılsonu itibarıyla bu ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır.

6.2.2. Çocuk Hastanesi

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2014I002079	
Proje Adı	Çocuk Hastanesi (GAP) (250 Ytk.30.440m ²)	
Sektör/ Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Hasta yoğunluğu nedeni ile daha geniş yerde daha kaliteli hizmet vermek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Hastane İnşaatı (30.440 m2), (250 yatak), Makine- Teçhizat	
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2023	
Projenin Yılı Ödeneği	9.000.000,00	6.440.000,00
Yapılan Harcama (₺)	6.439.464,88	

6.2.2.1. Çocuk Hastanesi Makine Teçhizat


Bu proje kapsamında; 2022 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 9.000.000 ₺ ödenek konulmuş, yıl içerisinde aktarmalarla 2.560.000 ₺ ödenek düşülmüş ve yılsonu itibariyle toplam ödenek 6.440.000 ₺ olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 6.439.464,88 ₺'si harcanmış ve harcanan ödenek ile, 2017 yılı ortalarında inşaat çalışmalarına başlanan Çocuk Hastanesinde 2021 yılı sonu itibariyle %100 fiziki gerçekleştirme sağlanarak hizmete alınan Çocuk Hastanesinin ihtiyacı olan makine teçhizat alınmıştır.

6.2.3. Acil Travma ve Yanık Hastanesi

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2022I00-183763	
Proje Adı	Acil Travma ve Yanık Hastanesi	
Sektör/ Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Üniversitemizin ihtiyacı olan modern bir Acil Travma ve Yanık Hastanesi yapmak.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	İnşaat, Makine Teçhizat	
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2025	
Projenin Yılı Ödeneği	12.000.000	32.300.000
Yapılan Harcama (₺)	6.965.727,80	

6.2.3.1. Acil Travma ve Yanık Hastanesi İnşaatı

2022 yılı yatırım programında 134 yatak ve 24.820 m2 olarak yer alan Acil Travma ve Yanık Hastanesi inşaat projesi kapsamında; 2022 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 12.000.000,00 ₺ ödenek konulmuş, yıl içerisinde likit kaynaklardan 5.300.000,00 ₺, ek bütçe ile 15.000.000,00 ₺ olmak üzere 20.300.000,00 TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 32.300.000,00 ₺ olmuştur. 2022 yılı yatırım programında yer alan Acil Travma ve Yanık Hastanesi 284.970.000,00 ₺ bedel ile ihale edilmiştir. İnşaatın yer teslimi 29.11.2022 tarihinde yapılmış olup, yılsonuna kadar inşaat için 6.965.727,80 ₺ harcama yapılmıştır. Sözleşmeye göre inşaatın 28.11.2024 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.

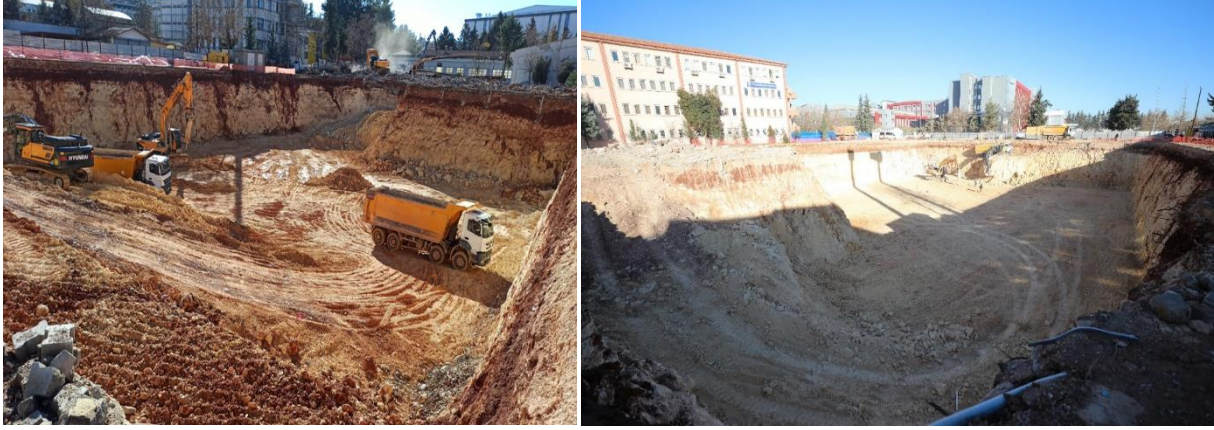

6.3. DİĞER KAMU HİZMETLERİ

6.3.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2020K12-151083	
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	
Sektör/ Alt Sektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma	
Proje Amacı	Bilimsel Araştırma Projelerini Desteklemek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Proje Desteği	
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022	
Projenin Yılı Ödeneği	20.565.000,00	20.565.000,00
Yapılan Harcama (₺)	Bütçe Harcaması: 20.565.000,00 Özel Hesap Harcaması: 21.136.692,85 TL	

Bu proje kapsamında; 2022 Yılı Bütçe Kanunu ile bütçeye 20.565.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, söz konusu ödeneğin tamamı 2022 yılı sonu itibariyle özel hesaba aktarılmıştır. Özel hesaptan bilimsel araştırma projelerinin cari + yatırım harcamaları için 31.564.676,93 ₺ harcama yapılmış olup, 21.136.692,85 TL yatırım harcamasına aittir. Diğer taraftan; 2022 yılı içerisinde 188 adet bilimsel araştırma proje desteklenmiş olup bu projeler için 40.987.632,43 ₺ destek ayrılmıştır. 2021 yılından 189 adet proje 2022 yılına devrolmuştur. Ayrıca yıl içerisinde 127 adet proje sonuçlandırılmıştır.

2022 Yılı İtibariyle BAP Kapsamında Yürütülen Projeler				
Projeler	Önceki Yılda Devreden Proje Sayısı	2022 Yılı İçinde Eklenen Proje Sayısı	Toplam Proje Sayısı	Yıl İçinde Tamamlanan Proje Sayısı
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	189	188	377	127
Genel Toplam	189	188	377	127

Tablo 12: 2022 Yılı İtibariyle BAP Kapsamında Yürütülen Projeler

2022 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Araştırma Projelerinin Birimlere ve Türlere Göre Dağılımı											
Akademik Birimler	Kapsamlı	ÖKAP	Alt Yapı	Hızlı Destek	Uzmanlık Tezi	Yüksek lisans	Doktora	GAP	DKP	ÖNAP	TOPLAM
Diş Hekimliği Fakültesi					14		2				16
Eğitim Fakültesi				11		6	2				9
Fen Bil. Enstitüsü						5	2				7
Fen Edebiyat Fakültesi	1	1	1	1		9	11			11	24
Güzel Sanatlar Fakültesi						1					1
Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi		3					1				4
İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi			3	1							1
İlahiyat Fakültesi			1								
İletişim Fakültesi	1		1			2					3
Mühendislik Fakültesi	1	4	6	4		7	5	1			27
Naci Top. Mesl. Yüks. Okulu											
Rektörlük			1								1
Sağlık Bil. Enstitüsü						1		2			3
Sağlık Bil. Fakültesi			2			2		1			5
Spor Bil. Fakültesi						3					3
Tıp Fakültesi	1		6	6	41	15	7	1	1		77
Araban MYO		1									1
Sosyal Bil. MYO											
Teknik Bil. MYO				3				1			4
Turizm ve Otel. MYO.											
İslahiye MYO											
Nizip Eğiti. Fak.											
Nurdağı MYO				2							2
TOPLAM	4	9	17	18	55	51	30	6	1	1	188

Tablo 13: 2022 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Arş. Projelerinin Birimlere ve Türlere Göre Dağılımı

6.3.2. Merkezi Arařtırma Laboratuvarı

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2010K12-1326	
Proje Adı	Merkezi Arařtırma Laboratuvarı	
Sektör/ Alt Sektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Arařtırma	
Proje Amacı	Bilimsel Arařtırma Projelerini Desteklemek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiđi	İnřaat (6.314 m2),Makine-Teçhizat, Teknolojik Arařtırma	
Başlama-Bitiř Tarihi	2010-2022	
Projenin Yılı Ödeneđi	2.000,00	2.000,00
Yapılan Harcama(₺)	Bütçe Harcaması:2.000,00 Özel Hesap Harcaması: 0,00	

Bu proje kapsamında; 2022 Yılı Bütçe Kanunu ile 2.000,00 ₺ ödenek verilmiş olup, söz konusu ödenek proje tamamlandığı ve ihtiyacı kalmadığından proje özel hesabına aktarılmamıştır. Ayrıca Gülsan A.Ş. tarafından Merkezi Arařtırma Laboratuvarı içerisinde oluşturulacak olan Ali Topçuođlu Yeni Buluşlar, Arařtırma ve Geliřtirme Laboratuvarı için 1.500.000,00 ₺. bađış olarak üniversitemize aktarılmıştır 2022 yılında harcama yapılmamıştır bađışın 2023 yılında yapılacak protokol deđişikliği sonucunda harcaması yapılması planlanmaktadır.



7. EKLER

7.1 2022 Yılı Kamu Yatırımları Özeti (Yılsonu)

Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar (Özel Bütçe+Döner Sermaye)

2022 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2021 Sonu Kümülatif Harcama			2022 Yılı Program Ödeneği			2022 Yılı Revize Ödenek			2022 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Eğitim	5	0	40.080	0	0	12.926	0	0	16.900	0	0	22.859	0	0	22.572
Sağlık	3	0	424.284	0	0	118.830	0	0	30.170	0	0	52.784	0	0	25.139
D.K.H	2	0	52.890	0	0	32.323	0	0	6.194	0	0	20.567	0	0	20.565
Toplam	10	0	517.254	0	0	164.079	0	0	53.264	0	0	96.210	0	0	68.276

Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar (Özel Bütçe)

2022 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2021 Sonu Kümülatif Harcama			2022 Yılı Program Ödeneği			2022 Yılı Revize Ödenek			2022 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Eğitim	5	0	40.080	0	0	12.926	0	0	16.900	0	0	22.859	0	0	22.572
Sağlık	3	0	423.114	0	0	118.830	0	0	29.000	0	0	52.784	0	0	25.139
D.K.H	2	0	52.890	0	0	32.323	0	0	6.194	0	0	20.567	0	0	20.565
Toplam	10	0	516.084	0	0	164.079	0	0	52.094	0	0	95.040	0	0	68.276

Bütçe Türü: Döner Sermaye

2022 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2021 Sonu Kümülatif Harcama			2022 Yılı Program Ödeneği			2022 Yılı Revize Ödenek			2022 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Sağlık	1	0	1.170	0	0	0	0	0	1.170	0	0	1.170	0	0	0
Toplam	1	0	1.170	0	0	0	0	0	1.170	0	0	1.170	0	0	0

7.2 2022 Yılı Harcamaları Yılısonu Gerçekleşme Raporu

Sektör Adı: Eğitim

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2021 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek Dış Öz kaynak	Ödenek Toplam	+ / -	Aktarma/ Tenkis Mikt.	Harcama Dış Kredi	Harcama Dış Öz kaynak	Harcama Toplam
1	1988H03-146	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2023	Gaziantep	0,	10.174	4.214	0,	0,	3.100	+	1.515	0,	0,	4.615
2	2020H03-150666	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2023	Gaziantep	0,	14.500	8.712	0,	0,	3.000	-	160	0,	0,	2.834
3	2020H03-186617	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2022	Gaziantep	0,	200	0,	0,	0,	200		0	0,	0,	124
4	2021H03-186609	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2022	Gaziantep	0,	8.000	0,	0,	0,	8.000	+	4.604	0,	0,	12.429
5	2021H03-186615	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2022	Gaziantep	0,	2.600	0	0	0	2.600		0	0	0	2.570
Toplam						0,	35.474	12.926	0,	0,	16.900	+	5.959	0,	0,	22.572

Sektör Adı: Sağlık

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2021 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek Dış Öz kaynak	Ödenek Toplam	+ / -	Aktarma/ Tenkis Mikt.	Harcama Dış Kredi	Harcama Dış Öz kaynak	Harcama Toplam
1	2014I0D-2079	Çocuk Hastanesi İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2022	Gaziantep	0,	97.938	97.938	0,	0,	0		0	0,	0,	0
		Çocuk Hastanesi (Makine Teçhizat)		2022	Gaziantep	0,	27.332	20.892	0,	0,	9.000	-	2.560	0,	0,	6.439
2	2022I00-172901	Muhtelif işler	ÖZEL BÜTÇE	2022	Gaziantep	0,	14.044	0,	0,	0,	9.170	+	4.874	0,	0,	11.734
			DÖNER SERMAYE	2022	Gaziantep	0	1.170	0	0	0	1.170	+	0	0	0	0
3	2022I00-183763	Acil Travma ve Yanık Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2022	Gaziantep	0	284.970	0	0	0	12.000	+	20.300	0	0	6.966
Toplam							424.284	118.830	0,	0,	30.170		22.614	0,	0,	25.139

Sektör Adı: D.K.H.

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2021 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek Dış Öz kaynak	Ödenek Toplam	+ / -	Aktarma/T enkis Mikt.	Harcama Dış Kredi	Harcama Dış Öz kaynak	Harcama Toplam
1	2010K12-1326	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2022	Gaziantep	0	32.325	32.323	0	0,	2	+	0	0	0,	0
2	2022K12-186848	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2022	Gaziantep	0	20.565	0	0,	0,	6.192	+	14.373	0,	0,	20.565
Toplam							52.890	32.323	0,	0,	6.194	0	14.373	0,	0,	20.565
