



**T.C.  
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**

**2023 YILI YATIRIM PROGRAMI  
İZLEME VE DEĞERLENDİRME  
RAPORU**

**Strateji Geliştirme Başkanlığı  
Ocak-2024**



**T.C**  
**GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**

**2023 YILI YATIRIM PROGRAMI**  
**İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Ocak-2024**

## 1. ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ



1973 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne bağlı bir fakülte olarak kurulan Gaziantep Üniversitesi aradan geçen 51 yılda, 20 fakülte, 2 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu ve 5 enstitüsü 34 araştırma ve uygulama merkezi ile Türkiye'nin en saygın üniversiteleri arasında yer almanın haklı gururunu yaşamaktadır. Gaziantep Üniversitesi; Türkçe, İngilizce ve Arapça eğitim veren Ülkemizdeki tek üniversitedir. 107 ülkeden 7.400'ün üzerinde yabancı uyruklu öğrencisi ile çok renkli, çok kültürlü, çok dilli ve huzurlu bir üniversitedir. 1.722 seçkin akademik personeli, 2.046 idari personeli, 1.748 sürekli işçi olmak üzere toplam 5.516 personel ile 53.375 öğrenci sayısı ile ülkemizin önde gelen üniversitelerinden birisi olmuştur.

Üniversitemizin 2022 yılı yatırım programında; eğitim sektöründe 5, sağlık sektöründe 2 ve diğer kamu hizmetleri sektöründe 1 olmak üzere toplam 8 adet yatırım projesi yer almaktadır. Söz konusu yatırım projelerine merkezi yönetim bütçesinden 146.808.000,00 ₺ döner sermaye bütçesinden 2.400.000,00 ₺ olmak üzere toplam 149.208.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde bu projelere gelir fazlası karşılığı, likit kaynaklarımızdan ve yedek ödenekten toplam 292.304.927,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 441.512.927,00 ₺'ye ulaşmıştır. 2023 yılı sonu itibariyle bu ödeneğin toplam 301.435.099,00 ₺'si harcanmış olup, harcama oranı %68 olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda; Tıp Fakültesi Taşınır Ambarı inşaatının ikmal inşaatı tamamlanmıştır. 2022 yılında 284.970.000,00 ₺ bedel ile ihale edilen Acil Travma ve Yanık Hastanesi inşaatı için 2023 yılında 115.111.883,71 ₺ harcama yapılmış inşaatın fiziki gerçekleşmesi %36 olarak gerçekleşmiş olup, inşaatın 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Diğer taraftan, yıl içinde 2023 yılı yatırım programına alınan Onkoloji Hastanesi Dönüşüm işi hızla devam etmiş ve inşaatın fiziki gerçekleşmesi %86 olarak gerçekleşerek ve inşaatın 2024 yılının Şubat ayında tamamlanması ve binanın hizmete alınması planlanmaktadır. Ayrıca, Naci Topçuoğlu MYO.'nun atölye ve laboratuvar ihtiyacını karşılamak amacıyla inşaatı devam eden Naci Topçuoğlu MYO. Ek Atölye ve Laboratuvar Bina İnşaatının fiziki gerçekleşmesi %50 olarak gerçekleşmiştir. İnşaatın yılın ilk çeyreğinde tamamlanarak, binanın hizmete alınması planlanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25. maddesi gereği Üniversitemiz yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmek üzere 2023 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN**

**Rektör**

## 2. İÇİNDEKİLER

1.	ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ.....	iii
2.	İÇİNDEKİLER.....	iv
3.	ŞEKİLLER TABLOSU .....	v
4.	GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
4.1.	Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri .....	2
4.2.	Yatırımların Finansman Kaynakları .....	3
4.3.	Kuruluşun Mevcut Kapasitesi.....	3
4.4.	2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı .....	5
5.	2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI .....	6
5.1.	Genel Yatırım Uygulama Durumu .....	6
5.2.	Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar/Öneriler .....	7
6.	2022 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	8
6.1.	EĞİTİM SEKTÖRÜ .....	8
6.1.1.	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi .....	8
6.1.2.	Derslik ve Merkezi Birimler.....	9
6.1.3.	Kampüs Altyapısı.....	11
6.1.4.	Muhtelif İşler.....	12
6.1.4.1.	Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Donanım Alımlarına İlişkin Tablolar.....	13
6.1.4.2.	Bina Büyük Onarımları Kapsamında Yapılan İşler:.....	14
6.1.4.2.1	Depremden Hasar Gören Binaların Tadilat ve Onarımları (1. Etap) .....	15
6.1.4.2.2	Depremden Zarar Gören Binaların Tadilat ve Onarımları (2. Etap).....	16
6.1.4.2.3	Depremden Etkilenen Binaların Bakım ve Onarımları.....	17
6.1.5.	Yayın Alımı .....	18
6.2.	SAĞLIK SEKTÖRÜ .....	19
6.2.1.	Muhtelif İşler.....	19
6.2.1.1.	Makine Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Özel Bütçe):.....	20
6.2.1.2.	Makine, Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye):.....	23
6.2.2.	Acil Travma ve Yanık Hastanesi .....	23
6.2.2.1.	Acil Travma ve Yanık Hastanesi İnşaatı.....	23
.....	.....	23
6.3.	DİĞER KAMU HİZMETLERİ.....	24
6.3.1.	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri.....	24
7.	EKLER.....	26
7.1	2023 Yılı Kamu Yatırımları Özeti (Yılsonu).....	26
7.2	2023 Yılı Harcamaları Yılsonu Gerçekleşme Raporu .....	28

### 3. ŐEKİLLER TABLOSU

Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler.....	2
Tablo 2: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı .....	3
Tablo 3: Tamamlanan İnşaatlar ve İşler .....	5
Tablo 4: Devam Eden İnşaatlar ve İşler .....	6
Tablo 5: 2023 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı .....	6
Tablo 6: 2023 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı.....	7
Tablo 7: 2023 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı .....	7
Tablo 8: Muhtelif İşler Proj. Makine.-Teçhizat, Bilgisayar ve Yazl. Donanım Alm. Tablosu	14
Tablo 9: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları .....	18
Tablo 10: 2021-2023 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları.....	19
Tablo 11: 2023 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Tablosu.....	21
Tablo 12: 2023 Yılı İtibariyle BAP Kapsamında Yürütölen Projeler .....	24
Tablo 13: 2023 Yılında Kabul Edilen Bil. Arş. Proj. Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı .....	25



#### 4. GENEL DEĞERLENDİRME

Üniversitemizin 2020-2024 dönemi stratejik planında; kurumsal misyon, vizyon amaç ve hedefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

##### MİSYONUMUZ

Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli insan yetiştiren; bireylere, topluma ve tüm kurum-kuruluşlara eğitim, bilim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında hizmet üreten değişime açık bir üniversite.

##### VİZYONUMUZ

Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde uluslararası rekabet kabiliyeti yüksek bir dünya üniversitesi olmak.

#### 4.1. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemizin 2020-2024 dönemi Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedefler aşağıda sıralanmıştır. 2023 yılı yatırımlarına da bu amaç ve hedefler doğrultusunda harcama yapılmıştır.

<b>Stratejik Amaç-1 Ulusal ve Uluslararası Alanda Etkin, Saygın, Girişimci ve Yenilikçi Bir Araştırma Üniversitesi Olmak</b>	
Hedef-1	Bilimsel araştırmaları nicelik ve nitelik olarak arttırmak,
Hedef-2	Üniversitenin ulusal ve uluslararası tanınırlığını ve başarı endekslerindeki düzeyini artırmak,
Hedef-3	Araştırma materyalleri ve fiziki altyapısının güçlendirilmesi,
Hedef-4	Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların üniversitemizde yapılmasının teşvik edilmesi,
<b>Stratejik Amaç-2 Sağlık alanında bölgesel referans merkezi olmak</b>	
Hedef-1	Yurt içi ve yurt dışı sağlık turizminin geliştirilmesi,
Hedef-2	Hastanelerin fiziki ve teknolojik alt yapısının güçlendirilmesi,
<b>Stratejik Amaç-3 Etkin ve sürdürülebilir üniversite Sanayi işbirliğinin sağlanması</b>	
Hedef-1	AR-GE işbirliklerini arttırmak
Hedef-2	Teknoloji Transfer Ofisi (TARGET TTO) ile TEKNOPARK'ın etkinliğinin geliştirilmesi,
<b>Stratejik Amaç-4 Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli eğitim yapmak</b>	
Hedef-1	Nitelikli öğretim elemanı sayısını arttırmak,
Hedef-2	Üniversitenin tanıtımı yapılarak nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine zemin hazırlamak,
Hedef-3	İhtiyaç duyulan eğitim, sportif ve sosyal binalarının yapılması, mevcut binaların yenilenmesi ve kampüs altyapısının iyileştirilmesi,
Hedef-4	Eğitim materyalleri alt yapısını güçlendirmek,
Hedef-5	Ders dışı eğitim ve sertifika programlarının yaygınlaştırılması,
Hedef-6	Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere katılımının artırılması,
<b>Stratejik Amaç-5 Kurumsallaşma ve Kurum Kültürünün Güçlendirilmesi</b>	
Hedef-1	Kurum iş ve hizmet kalitesinin artırılması,
Hedef-2	Kurumsal aidiyetin artırılmasına yönelik eğitim ve sosyal faaliyetleri arttırmak,

Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler

## 4.2. Yatırımların Finansman Kaynakları

2023 yılı yatırım programında bulunan 8 adet yatırım projesi için; 2023 yılı Bütçe Kanunu ile 146.808.000,00 ₺, döner sermaye bütçesinden ise 2.400.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, toplam yatırım ödeneğimiz 149.208.000,00 ₺ olmuştur. Yıl içinde Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında 35.000.000,00 ₺, Ek Bütçe kapsamında 150.500.000,00 ₺, likit karşılığı 20.105.000,00 ₺, gelir fazlası 19.199.927,00 ₺, yedek ödenekten 67.500.000,00 ₺ olmak üzere toplam 292.304.927 ₺ ödenek eklenmiş olup, 2023 yılı sonu itibariyle toplam ödenek 441.512.927 ₺'ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 301.435.099,44 ₺'si harcanmış, harcama oranı ise %68 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemize verilen 149.208.000,00 ₺'lik başlangıç yatırım ödeneğinin 130.395.000,00 ₺' si hazine yardımı, 16.413.000,00 ₺' si öz gelir ve 2.400.000,00 ₺' si döner sermaye ödeneğinden oluşmaktadır. 2023 yılsonu itibariyle hazine yardımı, öz gelir, likit kaynaklar ile döner sermaye ödeneklerinin dağılımı ve harcamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı (Bin ₺)				
Finans Kaynağı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı (%)
Hazine Yardımı	130.395	365.867	268.741	66
Likit Kaynaklar Karşılığı Kaydedilen	0	40.105		
Öz Gelir ve Gelir Fazlası Karşılığı Kaydedilen	16.413	33.141	32.694	99
<b>Bütçe Toplamı</b>	<b>146.808</b>	<b>439.113</b>	<b>301.435</b>	<b>68</b>
Döner Sermaye	2.400	2.400	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>149.208</b>	<b>441.513</b>	<b>301.435</b>	<b>68</b>

Tablo 2: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı

## 4.3. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi

Gaziantep Üniversitesinin temeli, 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümüne dayanmaktadır. 27 Haziran 1987 yılında, 3389 sayılı yasa ile bugünkü statüsüne kavuşan üniversitemiz zaman içerisinde hızla büyüyerek bugün itibariyle; 20 Fakülte, 2 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 5 Enstitü, 32 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1.681 akademik personel, 2.136 idari personel, 1.772 sürekli işçi olmak üzere toplam 5.589 personel ve 55.926 öğrencisi ile sadece bölgemizin değil ülkemizin sayılı üniversiteleri arasına girmiş bulunmaktadır. Gaziantep Üniversitesinin toplam yüzölçümü 3.123.678,25 m<sup>2</sup>, toplam kapalı alanı ise 517.931 m<sup>2</sup>'dir. Üniversitemizin toplam 8 adet yerleşkesi bulunmaktadır. Merkez kampüste 88 adet lojman bulunmakta olup bu lojmanların 8 tanesi dubleks, 16 tanesi 2+1, geriye kalan 64 tanesi ise 3+1'dir.





Üniversitemiz sağlık hizmetlerini Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi aracılığıyla sunmaktadır. Üniversite hastanemiz özellikle çevre illerden ve komşu ülkelerin (Irak, Suriye) yoğun talebiyle karşılaşmaktadır. 2000 yılında üniversite kampüsü içinde yer alan bina hizmete alınmış ve geçen yıllar içinde fiziki kapasite sürekli gelişmiştir. İhtiyaçların şekil ve boyut

değiştirmesi ile sürekli yenilenme devam etmektedir. 1.238 yatak kapasiteli hastanelerimizde günlük ortalama 7.000'in üzerinde poliklinik hizmeti verilmekte, yılda 50.000'in üzerinde de ameliyat ve girişimsel işlem yapılmaktadır.

Hastanemiz bünyesinde; 110 poliklinik, 44 klinik, Diyaliz Ünitesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, Merkez Laboratuvarı, Kan Bankası, Dâhili ve Cerrahi Yoğun Bakım Üniteleri, Obezite Merkezi, Doku Tipleme, Genetik ve Hücre Kültür Laboratuvarı, Padoloji, Androloji İnfertilite Laboratuvarı, Günöbirlik ameliyatların yapıldığı gün hastanesi ve Girişimsel Radyoloji alanında tüm işlemlerin yapıldığı Radyoloji Bölümü hizmet vermektedir.

Üniversitemiz Hastanesi, her yıl kendini daha geliştirerek ilerlemektedir. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile şehrimizin ve bölgemizin ve hatta komşu ülkelerin sağlık sorunlarına çözüm üretilmektedir. Hastanenin organ nakli konusunda nakil istatistikleri incelendiğinde ülkemizde önemli bir konuma yerleşmiştir. Organ Nakli Merkezinde canlıdan ve kadavradan nakiller yapılmaktadır. Ayrıca 2021 yılında üniversitemizde mevcut bir binanın onarımı yapılarak böbrek nakli merkezine dönüştürülmüş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışı yapılmıştır. Yine Hastanemiz bünyesinde yer alan Palyatif Bakım Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sahip olduğu donanımla bölgemizdeki önemli bir ihtiyaca hizmet vermektedir.

Üniversitemizin 2022 yılı yatırım programında yer alan 134 yataklı Acil Travma ve Yanık Hastanesi binasının ihalesi yapılarak, bina inşaatına aynı yılın Aralık ayında başlanmıştır. İnşaatı hızla devam etmekte olan ve 24.820 m2 kapalı alana sahip Acil Travma ve Yanık Hastanesinin 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır.



Diğer taraftan, 2023 yılında ilimizi de etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler neticesinde Onkoloji Hastanesi binamız hasar almış ve boşaltılmıştır. Üniversitemizin Onkoloji Hastanesi ihtiyacını gidermek üzere İnşaatı tamamlanan Tıp Fakültesi ambar binasının Onkoloji Hastanesine dönüştürülmesi işine ilişkin proje Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulmuş ve proje kabul edilmiştir. Projenin ihalesi yapılmış ve dönüşüm işinin 2024 yılının ilk aylarında tamamlanması planlanmaktadır.



Diş Hekimliği Fakültesi, 31.10.2006 tarihinde 26332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuştur. 2008 yılının Nisan ayında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi binasında eğitim-öğretim ve tedavi hizmetine başlamıştır. Kasım 2012 tarihi itibarıyla de 16.370 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip yeni binasına taşınan Diş Hekimliği Fakültemiz burada hizmet vermeye başlamıştır. Fakültemiz;

Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Periodontoloji, Pedodonti, Endodonti, Restoratif Diş Tedavisi ile Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dallarında ilimiz ve çevre illerden gelen hastalara hizmet vermektedir. Tescilli alınmış olan Genel Anestezi Ameliyathanesinin kısa sürede tekrar hizmete açılması planlanmaktadır. Diş Hekimliği Fakültemizin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri standardına göre eğitim ve hastane kapsamında belgelendirilmesi Ocak 2020’de tamamlanmıştır. Fakültemiz; TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi almıştır. Eğitim-öğretim hizmetleri ve ağız diş sağlığı hizmetleri sunumu kapsamında mekanda erişim konusunda yapılan düzenlemeler ile 2020 yılında Turuncu Bayrak almaya hak kazanmıştır..

#### 4.4. 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2023 yılında Üniversitemizde; Çocuk Hastanesi Bağlantı yoluna istinat duvarı yaptırılması, 2022 yılı genel bina tadilat ve onarımları yaptırılması ve Araban MYO. Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılması işleri tamamlanmıştır. Ayrıca kapalı alanı 5.040 m<sup>2</sup> olan Tıp Fakültesi Ambar Binası tamamlanmıştır. Kapalı alanı 24.850 m<sup>2</sup> olan Acil Travma ve Yanık Hastanesi işlerinin yapımına devam edilmekte olup, Turizm ve Otelcilik MYO tadilatları işinin ihalesi tamamlanmış, yer teslimi yapılmıştır. Naci Topçuoğlu Ek Atölye ve Lab. Bina İnşaatı hızla devam etmekte inşaatın 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Yatırım projeleri kapsamında 2023 yılında Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca tamamlanan işler ile devam eden inşaatlar aşağıda gösterilmiştir.

İnşaatın/İşin Adı	İşin Toplam Maliyeti (₺)	İşin Başlangıç/Bitis Tarihi	Tamamlanma Süresi (Ay)
1- Tıp Fakültesi Ambar Binası İkmal İnşaatı	17.313.825,20	07.10.2022 - 04.04.2023	6 ay
2- Depremden hasar gören binaların tadilat ve onarımları (1. Etap)	6.676341,68	17.07.2023- 04.09.2023	50 gün
3- Depremden zarar gören binaların tadilat ve onarımları ( 2. Etap)	12.111.826,22	28.07.2023 - 06.10.2023	71 gün
4- Depremden etkilenen binaların bakım ve onarımları işleri	9.196.218,37	03.07.2023- 20.11.2023	70 gün
<b>TOPLAM</b>	<b>45.298.211,47</b>		

Tablo 3: Tamamlanan İnşaatlar ve İşler

Devam Eden İnşaatlar ve İşler				
İnşaatın Adı	İhale Bedeli (KDV Dâhil )	Kapalı alanı (m2)	İnşaatın Başlangıç/Bitiş Tarihi	Tamamlanma Oranı (%)
1- Acil Travma ve Yanık Hastanesi inşaatı	284.970.000,00	24.820	29.11.2022-28.11.2024	36
2- Onkoloji Hastanesi Dönüşüm İşi	39.660.000,00	5.040	31.08.2023-17.01.2024	86
3-Naci Topçuoğlu Ek Atölye ve Lab. Bina İnşaatı	28.588.587,87	2.880	04.09.2023-07.01.2024	50
<b>TOPLAM</b>				

Tablo 4:Devam Eden İnşaatlar ve İşler

## 5. 2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

### 5.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım projelerinin harcamaları için bütçeden 146.808.000,00 ₺ ve döner sermaye bütçesinde ise 2.400.000,00 ₺ ödenek verilerek toplam ödenek 149.208.000,00 ₺ olmuştur. Yıl içinde bu ödeneye 292.304.927 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 441.512.927,00 ₺' ye ulaşmıştır. Anılan bu ödenenin 301.435.099,44 ₺' si yıl içinde 8 adet yatırım projesi için harcanmış ve harcama oranı % 68 olarak gerçekleşmiştir.

Sıra No:	Proje Adı:	Sektörü	Başlangıç Ödeneği	2023 Yılı Toplam Ödeneği	Harcama	Fiziki Gerç. (%)
1	Muhtelif İşler	Eğitim	6.460.000	55.481.927	52.994.788,21	96
2	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi		200.000	3.255.000	1.374.136,00	42
3	Derslik ve Merkezi Birimler		34.640.000	93.140.000	25.359.638,98	27
4	Kampus Altyapısı		4.000.000	4.000.000	1.462.088,98	37
5	Yayın Alımı		3.700.000	3.700.000	3.698.264,31	100
6	Rektörlük Bilm. Araşt. Projeleri	DKH.	12.808.000	29.536.000	29.536.000,00	100
7	Muhtelif İşler (*)	Sağlık	42.400.000	82.400.000	71.898.299,25	90
8	Acil Travma ve Yanık Hastanesi		45.000.000	170.000.000	115.111.883,71	66
<b>Genel Toplam</b>			<b>149.208.000</b>	<b>441.512.927,00</b>	<b>301.435.099,44</b>	<b>68</b>

(\*) Bu ödenenin 2.400.000 döner sermaye gelirinden karşılanacak olup bütçe toplamına dahil edilmiştir.

Tablo 5: 2023 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı

2023 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin ₺)					
Sektör Adı	Proje Sayısı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
Eğitim	5	49.000	159.577	84.889	53
Sağlık	2	87.400	252.400	187.010	73
D.K.H	1	12.808	29.536	29.536	100
<b>TOPLAM</b>	<b>8</b>	<b>149.808</b>	<b>441.513</b>	<b>301.435</b>	<b>68</b>
(*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.					

Tablo 6: 2023 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı

2023 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı (Bin ₺)					
Sektör Adı	Proje Sayısı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
Tamamlanan Projeler	5	97.760	320.171	245.077	77
Devam Eden Projeler	3	51.448	121.342	56.358	44
<b>TOPLAM</b>	<b>8</b>	<b>149.208</b>	<b>441.513</b>	<b>301.435</b>	<b>68</b>
(*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karşılanmış olup bütçe toplamına dâhil edilmiştir.					

Tablo 7: 2023 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı

## 5.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar/Öneriler

- ❖ Yatırım tavanlarının belirlenmesi sürecinde, yatırımcı kuruluşlar ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile daha fazla görüşme yapılarak sürdürülebilir yatırım tavanlarının ortaya çıkması sağlanabilir. Bu yolla hem yıl içinde yatırımların aksamadan yürütülmesi sağlanacak hem de yıl içinde oluşacak yedek ödenek talepleri de en aza indirilebilecektir.
- ❖ Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve mevsimsel şartlar Strateji ve Bütçe Başkanlığınca göz önüne alınır ve buna göre ödenek oranı belirlenirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir.
- ❖ Ayrıntılı Finans Programının sadece ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde hazırlanması 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine uygun olacaktır.
- ❖ Ödenek tavanları belirlenmesi sürecinde objektif kıstas belirlenerek, bu kriterlerin bütçe hazırlayan kurumlara duyurulması halinde daha reel duruma uygun bütçeler ortaya çıkacaktır.
- ❖ Kurumların, öz gelirlerini yatırım bütçesine tam olarak yansıtma imkânı sağlanmalıdır.

## 6. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI

Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırım Programında 8 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Bunların beşi eğitim, ikisi sağlık, biri de diğer kamu hizmetleri sektöründe yer almaktadır. Aşağıda bu projelerin yıl içindeki uygulamaları belirtilmiştir.

### 6.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ

#### 6.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2023H03-212060	
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	İnşaat ve ihale aşaması için hazırlık yapılması ve projelendirme işlerinin yapılması.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Etüd-Proje ve Müşavirlik	
Başlama-Bitiş Tarihi	2023- 2023	
Projenin Yılı Ödeneği	200.000	3.255.000
Yapılan Harcama (₺)	1.374.136,00	

Bu proje kapsamında; 2023 Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 200.000,00 ₺ ödenek verilmiştir. Yıl içinde Ek Bütçeyle 2.000.000,00 ₺, yedek ödenekten 950.000,00 ₺, likit kaynaklardan 105.000,00 ₺ olmak üzere toplam 2.950.000,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 3.255.000,00 ₺'ye ulaşmıştır. Bu ödenekten 2023 yılı sonunda 1.374.136 ₺ harcama yapılmış ve harcama oranı % 42 olmuştur. Proje kapsamında; Kütüphane binası ve Sosyal Bilimler MYO. Binası deprem performansı analizi yapılabilmesi için laboratuvar (karot ve donatı) işi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havalimanında bulunan Uçak Hangar Binasının Köpüklü Yangın Söndürme Sisteminin ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Yeni Atölye Binasının Mekanik ve Elektrik Tesisat Projelerinin ve İhale Dosyalarının Hazırlanması İşi, İmar uygulaması planı hazırlanması işi, Araban ilçesi GES için zemin etüdü, jeolojik-jeoteknik etüd raporu ve imar planı hazırlanması, Kütüphane binası (18.700 m<sup>2</sup>) statik, peyzaj ve ihale dokümanlarının hazırlanması ve Kütüphane binası (18.700 m<sup>2</sup>) statik, peyzaj ve ihale dokümanlarının hazırlanması işleri yaptırılmıştır.

## 6.1.2. Derslik ve Merkezi Birimler

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	1988H03-146	
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Her yıl yeni açılan akademik birimlerin bina ihtiyaçlarını karşılamak ve kapasitesi yetiştirmeyen binalara yeni ve ek bina yapımını sağlamak	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Eğitim (5.040 m <sup>2</sup> ), Kütüphane Binası (18.700 m <sup>2</sup> ), Naci Topçuoğlu Ek Atölye ve Lab Binası (2.880 m <sup>2</sup> )	
Başlama-Bitiş Tarihi	1988 - 2025	
Projenin Yılı Ödeneği	34.640.000,00	93.140.000,00
Yapılan Harcama (₺)	25.359.638,98	

Bu proje kapsamında; 2023 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 34.640.000,00 ₺. ödenek verilmiş olup, yıl içinde Ek Bütçe ile 43.500.000,00 ₺., Yedek Ödenekten 15.000.000,00 ₺. olmak üzere yıl sonu itibariyle toplam 93.140.000,00 ₺. ödeneye ulaşmıştır. Söz konusu ödenekten 2023 yılı sonu itibariyle 25.359.638,98 TL harcanmıştır. Bu kapsamda, Tıp Fakültesi Ambar Binası İkmal inşaatı %100 tamamlanmıştır. Naci Topçuoğlu Ek Atölye ve Labaratuvar Binası inşaatı ise %86 oranında tamamlanmış inşaatın 2024 yılının Şubat ayı itibariyle tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır. Ayrıca Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Üniversitemizin kütüphane ihtiyacını karşılamak üzere 18.700 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip 561.210.000,00 ₺ maliyetli Kütüphane Binası 2023 yılı Yatırım Programına alınmıştır. Programa alınan Kütüphane Binasının ihalesi 2024 yılı Ocak ayında yapılacak ve inşaatı en kısa sürede başlanacak olup, inşaatın 2 yıl içinde tamamlanarak binanın hizmete alınması planlanmaktadır.



## 1-Tıp Fakültesi Ambar Binası İkmal İnşaatı

Tıp Fakültesi Ambar Binası İkmal İnşaatı	
İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dâhil)	17.313.825,20
2023 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	13.112.996,77
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	17.07.2023-27.09.2023
İnşaatın Kapalı Alanı	5.040 m <sup>2</sup>
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%100
AÇIKLAMA	Bina; bodrum, zemin, birinci ve ikinci kattan oluşmaktadır. Bodrum katta; arşiv olarak planlanan kısımda tomoterapive radyoterapi ünitesi yapılması planlanmaktadır. Bununla ilgili olarak ihale süreci devam etmektedir. Zemin katta; 8 adet ofis, 2 adet temizlik odası bay-bayan wc, Birinci Katta; 8 adet ofis, bay-bayan wc, İkinci Katta ise; 8 adet ofis ve bay-bayan wc bulunmaktadır.

## 2-Naci Topçuoğlu Ek Atölye ve Laboratuvar Binası

Naci Topçuoğlu MYO Atölye Binası (Ek bina) İnşaatı	
İnşaatın Toplam Maliyeti (iş artışı ve KDV dahil)	31.447.446,66 TL
2023 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	12.246.642,21
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	04.09.2023-07.01.2024
İnşaatın Kapalı Alanı	2.880 +340 = 3220 m <sup>2</sup>
Fiziki Gerçekleşme Durumu	% 40,50
AÇIKLAMA:	Bu projede; Bodrum kat: Doğalgaz odası, kaynak odası, elektrik odası ve eşanjör odası. Zemin kat: 2 adet tekstil atölyesi, 3 adet derslik, 2 adet giyim atölyesi, , 2 adet kuyumculuk atölyesi, 1 adet biyomedikal atölyesi, 1 adet radyo-tv atölyesi, 1 adet pano odası. 1.kat 4 adet bilgisayar atölyesi, 2 adet derslik, 1 adet sayısal elektronik atölyesi, 1 adet haberleşme atölyesi, 1 adet temel elektronik atölyesi, 1 adet güç elektroniği odası, 2 adet ofis 1 adet pano odası bulunmaktadır.

### 6.1.3. Kampüs Altyapısı

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2020H03-150666	
Proje Adı	Kampüs Alt yapısı (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversite alt yapısının iyileştirilmesi, yeni yapılan binalarda altyapı çalışmalarının yapılması	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	
Başlama-Bitiş Tarihi	1991 -2024	
Projenin Yılı Ödeneği	4.000.000,00	4.000.000,00
Yapılan Harcama (₺)	1.462.088,98	

Bu proje kapsamında; 2023 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 4.000.000,00 ₺ ödenek verilmiş olup, bu ödenekten 2023 yılı sonunda 1.462.088,98 ₺ harcanmış olup, harcama oranı % 37 olarak gerçekleşmiştir.

#### 6.2.3.1. Kampüs Altyapısı Kapsamında Yapılan İşler

Bu proje kapsamında; G.Ü. Personel Yemekhanesi kızgın su hattı tadilatı, Nurdağı MYO'da depremden hasar gören trafo, pano ve trafo binasının tadilatı, Rektörlük Binası Su Soğutmalı Soğutma Grubunun ve Klima Santrallerinin Bakımlarının Yapılması, Nurdağı MYO tarım arazisinde direk tipi trafo, pano ve tadilat onarımı, Böbrek Hastanesi yanına yeni yol yapılması, Oğuzeli MYO klima sistemi tamirata, Naci Topçuoğlu MYO ve Güzel Sanatlar Fak. Isıtma soğutma sis. bakım onarımı, Rektörlük ve çevresi, Gaündam ve çevresi ile Kütüphane ve çevresini destekleyen jeneratörlerin bakım ve onarımı, Araban Yerleşkesine yapılacak Güneş Enerjisi proje alanına totem yapılması, Böbrek Nakli binası yanına açılan yeni yol için panel çit ve profil alımı, İslahiye yerleşkesinde bulunan yüksek gerilim trafosunun bakım ve onarımı, Çatı bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere malzeme alımı, Kampüs içerisinde kapı girişlerinin düzenlenmesi ve yol yapımında kullanılmak üzere malzeme alımı, Arazi Değerlendirme Mühendisliğinde bulunan elektrikli kombinin bakım ve onarımı, Muhtelif yerlerde rögar kapaklarının yenilenmesi ve Makine Mühendisliği Dekanlık binasının alt katının bölünmesinde kullanılmak üzere sac levha alımı ve Cerablus Meslek Yüksekokulu için boya malzemesi alımı işleri doğrudan temin usulüyle yaptırılmıştır.



#### 6.1.4. Muhtelif İşler

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2022H03-186609	
Proje Adı	Muhtelif İşler	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversitenin makine-teçhizat, bilgi teknolojileri, bina onarım ve taşıt ihtiyacını temin etmek.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023	
Projenin Yılı Ödeneği	6.460.000,00	55.481.927
Yapılan Harcama	52.994.788,21	

Bu proje kapsamında; 2023 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 6.460.000,00 ₺ ödenek verilmiş, anılan toplu projeye; gelir fazlası karşılığı 2.471.927 ₺, Yedek Ödenekten 11.550.000,00 ₺ OHAL kapsamında 35.000.000,00 ₺ olmak üzere toplam 49.021.927 ₺ ödenek eklenmiştir. Yapılan eklemeler sonucu toplam ödenek 55.481.927.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten yılsonu itibariyle 52.994.788,21 ₺ harcanmış olup, harcama oranı % 96 olarak gerçekleşmiştir. Proje ile; Makine teçhizat ve donanım alımları için 13.987.748,98 ₺, Bilgisayar ve Yazılım alımları için 4.927.708,77 ₺, Makine Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları için 34.079.330,46 ₺, harcama yapılmıştır. Proje Kapsamında yapılan harcamalar ile akademik ve idari birimlerin makine teçhizat, donanım, bilgisayar ve yazılım ihtiyaçları büyük oranda karşılanmıştır.

#### 6.1.4.1. Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Donanım Alımlarına İlişkin Tablolar

MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI		
Sıra No	Birimler	Harcanan Bütçe
1	Rektörlük	48.720,00
2	Mustafa Kemal Üniversitesi	229.491,12
3	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	155.568,63
4	Üniversite Geneli( Merkez Ambarı )	1.885.251,64
5	Sağlık Bilimleri Fakültesi	167.344,00
6	Böbrek Nakli Merkezi	835.755,68
7	Nacitopçuoğlu MYO	69.000,50
8	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	5.704,00
9	Basın Yayın	18.996,00
10	Mühendislik Fakültesi	3.014.973,52
11	Naci Topçuoğlu MYO.	1.199.732,00
12	Yapı İşleri Teknik Dairesi Başkanlığı (Telefon Santrali)	3.688.800,00
TOPLAM		11.319.337,09

DONANIM ALIMLARI		
Sıra No	Birimler	Harcanan Bütçe
1	Turizm ve Otelcilik MYO	41.580,27
2	Böbrek Nakil Merkezi	91.300,00
3	Merkez Ambar	20.900,00
4	İletişim Fakültesi	25.850,00
5	Nurdağı MYO	33.000,00
6	Nizip Eğitim Fakültesi	173.694,40
7	Mühendislik Fakültesi	1.555.785,49
8	Merkez Ambar	726.301,73
TOPLAM		2.668.411,89

BİLGİSAYAR VE YAZILIM ALIMLARI		
Sıra No	Birimler	Harcanan Bütçe
1	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	54.492,00
2	Böbrek Nakil Merkezi	8.260,00
3	Mühendislik Fakültesi	368.016,31
4	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	132.000,00
5	Evrak Arşiv İşletme Müdürlüğü	143.512,60
6	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	22.038,00
7	İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	10.200
8	Naci Topçuoğlu MYO.	134.342,56
9	Üniversite Geneli( Merkez Ambarı )	4.054.847,30
TOPLAM		4.927.708,77

#### 6.1.4.2. Bina Büyük Onarımları Kapsamında Yapılan İşler:

Üniversitemizdeki bina ile makine teçhizatların bakım onarımları için bütçeye 4.103.000,00 ₺ ödenek konulmuş bu ödeneye yıl içinde 32.071.927 ₺ eklenerek toplam ödenek 36.174.927 ₺ olmuştur. Bu ödenekten yıl sonu itibariyle 34.079.330,46 ₺ harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında; Depremden hasar gören binaların tadilat ve onarımları (1. Etap), Depremden zarar gören binaların tadilat ve onarımları ( 2. Etap), Depremden etkilenen binaların bakım ve onarımları işleri yapılmıştır. Ayrıca doğru temin usulüyle; Lojman binalarının deprem sonrası çatı bakım ve onarımı. Deprem sonrası bakım onarımlar, personel yemekhanesi, öğrenci yemekhanesi rektörlük binası hakediş ödemeleri, Üniversitemiz araçlarına lastik alımı, Üniversitemiz araçlarına lastik alımı, Üniversitemize ait aracın bakım ve onarımı, Depremden hasar gören kampüs içindeki asansörlerin hasar gören parçaları için malzeme alımı, Başkanlığımız bünyesinde kullanılmak üzere yedek parça ve cihaz alımı, Üniversitemize ait aracın bakım ve tamirataı, Y.İ.T.D.B. kendi bünyesinde atölyelerde kullanılmak üzere alet ve malzeme alımı, G.Ü. Öğrenci yemekhanesinde bulunan asansörün tadilat ve onarımı, Y.İ.T.D.Başkanlığında bulunan VRF sistem tavan tipi klimanın iç ünite elektronik kartın yetkili servise değiştirilmesi işi, Üniversitemize ait aracın klima bakım ve onarımı, Üniversitemiz traktörlerine tamir ve bakım için malzeme alımı, Merkez telefon santrali ve Nurdağı yerleşkesindeki telefon santrali arızasının giderilmesi işi, Isı santralindeki brülörlerin bakımı ve 4 adet gaz analiz sensörü değişimi işi, Taşıt İşletme Müdürlüğü atölyelerinde kullanılmak üzere krika alımı, Başkanlığımıza bağlı atölyelerde kullanılmak üzere hırdavat malzemeleri alımı, Başkanlığımıza bağlı ısı santralinde kullanılmak üzere yedek parça alımı, Araç bakım ve onarımı, ısı santraline ısı eşanjörünün plaka contası ve yapıştırıcısı alımı işi, Üniversitemize ait araç ve jeneratörlerde kullanılmak üzere antifriz ve yağ alımı, Ana kampüs ve yerleşke kampüslerde bulunan asansörlerin periyodik bakım ücretinin ödenmesi işi, Hukuk Fakültesi yanındaki meydanın düşen granit mermerin yapılması ve mavera kültür merkezinin merdiven basamağının değişmesi işi, Mavera Kültür Merkezi hava kanalları ve fleksi boruların bağlantıları bakım ve onarımı işi, Kampüs içerisinde bulunan asansörler için yedek parça alımı, Otoparkların zemin dolgusu için çakıl taşı alımı, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi onarım işi, Taşıt İşletme Müdürlüğünde bulunan araç ve jeneratörlerde kullanılmak üzere akü alımı, Y.İ.T.D. Başkanlığınca yapılmakta olan otoparkın zemin dolgusu için çakıltaşı alımı işlerinin ödemeleri bu projeden yapılmıştır.

### 6.1.4.2.1 Depremden Hasar Gören Binaların Tadilat ve Onarımları (1. Etap)

#### Bina Tadilat ve Onarımları

İnşaatın Toplam Maliyeti  
(KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)

6.676.341,68

İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi

17.07.2023-27.09.2023

Fiziki Gerçekleşme Durumu

%100

**AÇIKLAMA.** Bu onarım işlerinde; Nurdağı MYO ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği binalarında iç ve dış cephe boyası, çatı parapetlerinin yenilenmesi, Sosyal Bilimler MYO, Teknik Bilimler MYO, Konservatuvar binası, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Dekanlık binası, İnşaat Mühendisliği binası, Kütüphane binası, Gıda Mühendisliği binası, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası, Yabancı Diller Yüksekokulu binası, Diş Hekimliği Fakültesi binası iç cephe tadilat ve tamiratları, Makine Mühendisliği derslik binası ve İnşaat Mühendisliği laboratuvarı binalarının kısmi çatı onarımları yapılmıştır.



## 6.1.4.2.2-Depremden Zarar Gören Binaların Tadilat ve Onarımları (2. Etap)

Bina Tadilat ve Onarımları	
İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)	12.111.826,22
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	28.07.2023 - 06.10.2023
İnşaatın Kapalı Alanı	
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%100

**AÇIKLAMA:** Bu onarım işi kapsamında; İslahiye, Nizip, Oğuzeli, Araban, Naci Topçuoğlu MYO yerleşke binalarında boya tamiratları ve boyama işleri, çatı izolasyonları, Nurdağı MYO 'da trafo yenileme işi, Merkez kampüste depremden hasar gören binalarda boya tamiratları ve boyama işleri, İslahiye MYO'da depremde dolayı hasar gören kalorifer kazanının ve su deposunun tamirati, wc'lerde duvar ve zemin seramiklerinin tamirati yapıldı.





### 6.1.4.2.3- Depremden Etkilenen Binaların Bakım ve Onarımları

#### Depremden etkilenen binaların bakım ve onarımları

İnşaatın Toplam Maliyeti  
(KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)

9.196.218,37

İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi

03.07.2023 - 20.11.2023

İnşaatın Kapalı Alanı

Fiziki Gerçekleşme Durumu

%100

**AÇIKLAMA:** Bu onarım kapsamında; İlahiyat Fakültesi, Maveria Kültür Sanat Merkezi ve Hukuk Fakültesi binalarında çatı izolasyon işleri ve çatı tadilatları, Eğitim Fakültesi, 75. Yıl derslik binası, İletişim Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Bilgi İşlem Merkezi, Kreş ve Anaokulu, Maveria Kültür Sanat Merkezi, İlahiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Sağlık Hizmetleri MYO binalarında boya, sıva, asma tavan, dilatasyon profilleri tadilatları, zemin kaplamaları, ıslak mahallerde fayans tamiratı işleri yapılmıştır.



### 6.1.5. Yayın Alımı

TAMAMLANMA RAPORU		
<b>AÇIKLAMA</b>	<b>YATIRIM PROGRAMI</b>	<b>REVİZE</b>
Proje No	2023H03-212062	
Proje Adı	Yayın Alımı (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversitemizdeki akademik personel ve öğrencilerimizin dünyadaki bilimsel gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yayınları takip edebilmesi ve çalışmalarında kullanacakları her türlü ortamdaki bilgiye erişmeleri için gerekli yayınların (basılı ve elektronik ortamda) sağlanmasıdır.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023	
Projenin Yılı Ödeneği	3.700.000,00	3.700.000,00
Yapılan Harcama (₺)	3.698.264,31	

Bu proje kapsamında; 2023 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 3.700.000,00 ₺ ödenek verilmiştir Bu ödenekten 2023 yılı sonunda 3.698.264,31 ₺ harcanmış olup, harcama oranı %99,95 olarak gerçekleşmiştir. Harcanan ödenek ile 10 adet veri tabanı ödemesi, 235'i Türkçe 2.210 âdeti yabancı dilde olmak üzere toplam 2.445 kitap alımı yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemizin satın aldığı ve abone olduğu veri tabanlarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloleştirilmiştir.

SATIN ALINAN VE ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI			
Sıra No.	VERİ TABANI ADI	KONUSU	HARCAMA BEDELİ
1	The Cochrane Library	Tıp	Deprem Nedeniyle Ücretsiz Sağlandı
2	Clinical Key	Tıp	853.061,44
3	De Gruyter Complete Journal	Sosyal Bilimler	Deprem Nedeniyle Ücretsiz Sağlandı
4	Elsevier Materials Science	Fen Bilimleri	174.263,56
5	İdealonline	Genel	50.386,00
6	Institute of Physics (IOP)	Fen Bilimleri	324.124,28
7	Legal Online	Hukuk	Deprem Nedeniyle Ücretsiz Sağlandı
8	Lexpera	Sosyal Bilimler (Hukuk)	22.125,00
9	Military Big Datagör	Sosyal Bilimler	Deprem Nedeniyle Ücretsiz Sağlandı
10	Oxford Online Journals	Genel	Deprem Nedeniyle Ücretsiz Sağlandı
11	Proquest Central	Genel	766.347,12
12	Proquest e-book Academic Complete	Genel (e-kitap)	291.604,35
13	SOBİAD	Sosyal Bilimler	27.645,00
14	Statista	Sosyal Bilimler	Deprem Nedeniyle Ücretsiz Sağlandı
15	Summon	Keşif Aracı (Arama)	245.640,18

16	Total Materia	Genel	Deprem Nedeniyle Ücretsiz Sağlandı
17	TSE Standart Online	Genel	Deprem Nedeniyle Ücretsiz Sağlandı
18	Turcademy	Genel	Deprem Nedeniyle Ücretsiz Sağlandı
19	Uptodate	Tıp	919.533,29
GENEL TOPLAM (₺)			3.674.730,22

(\*)15 adet veri tabanı ULAKBİM/EKUAL kapsamında üniversitemizin erişimine açıktır.

Tablo 9: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları

2021-2023 YILLARI ARASI TOPLAM KÜTÜPHANE KAYNAKLARI									
	2021			2021			2023		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	138.647	267.071	405.718	143.706	457.403	601.129	134.298	402.013	536.311
Dergi Aboneliği	18	75.493	75.511	15	73.728	73.743	12	77.188	77.200
Tez	3.922	5.338.828	5.342.750	4.145	5.592.562	5.596.707	4.318	5.832.672	5.836.990
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	-	35	35	-	26	26		19	19
Standartlar	17.719	61.482	79.201	17.719	61.482	79.201	17.719	44.909	62.628
DVD-VCD (Bluray-3D)	2.525	-	2.525	2.525	-	2.525	2.525	-	2.525
TOPLAM	162.831	5.742.907	5.903.213	168.110	6.185.201	6.353.311	158.872	6.356.782	6.515.654

Tablo 10: 2021-2023 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları

## 6.2. SAĞLIK SEKTÖRÜ

### 6.2.1. Muhtelif İşler

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2023I00-191293-191295	
Proje Adı	Muhtelif işler (Makine Teçhizat)	
Sektör/ Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Sağlık Alanında İyileştirme	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Makine-Teçhizat, Bakım Onarım	
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023	
Projenin Yılı Ödeneği	82.400.000,00	
Yapılan Harcama (₺)	71.898.299,25	82.400.000,00



Proje kapsamında; 2023 Yılı Bütçe Kanunu ile hastaneye makine teçhizat alımları için 25.000.000,00 ₺, Bina Büyük Onarımları için 2.400.000,00 ₺, si kaynağı döner sermayeden olmak üzere 17.400.000,00 ₺ ödenek verilmiştir. Bu ödeneğe yıl içinde Onkoloji Hastanesi Dönüşüm işi için 40.000.000,00 ₺ ödenek verilmiş olup yılsonu itibariyle toplam ödenek 82.400.000,00 ₺'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle ödeneğin 71.898.299,25 ₺'si harcanmış olup harcama oranı %87 olarak gerçekleşmiştir.

#### 6.2.1.1. Makine Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Özel Bütçe):

Üniversitemizin 2023 Yılı Yatırım Programına; hastanenin makine teçhizat alımları ile bina büyük onarımları için 40.000.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde bu ödeneğe yedek ödenekten 40.000.000,00 ₺ ödenek eklenmiş olup, yılsonu itibariyle toplam ödenek 80.000.000,00 ₺'ye ulaşmıştır. Bu ödenekten, 2023 yılı sonu itibariyle 71.898.299,25 ₺ tutarında harcama yapılmış ve harcama oranı %90 olarak gerçekleşmiştir.

#### ❖ Makine-Teçhizat Alımları:

Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine makine teçhizat alımları için 25.000.000,00 ₺, ödenek konulmuştur.. Söz konusu ödenekten 2023 yılı sonu itibariyle 24.997.885,00 ₺ harcama yapılmış ve harcama oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl içinde hastane birimlerine alınan makine teçhizatın dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2023 YILINDA HASTANEMİZE ALINAN MAKİNE, TEÇHİZAT VE TIBBİ CİHAZLARIN DAĞILIMI TABLOSU		
Sıra No	Bölüm/Birim Adı	Harcama (₺)
1	Hastane Geneli	1.495.886,47
2	Ameliyathane	1.942.294,01
3	Radyoloji A.D.	2.669.400,00
4	Genel Cerrahi	13.637,35
5	Kardiyoloji	361.411,29
6	Üroloji A.D.	59.000,00
7	Acil Servis	377.762,92
8	Çocuk Psikiyatri	826.200,00
9	KBB Hastalıkları A.D.	615.600,00
10	Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.	879.120,00
11	Nöroloji A.D.	456.812,00
12	Göz Hast. A.D.	2.910.175,00
13	Çocuk Nefroloji	26.290,00
14	Beyin Cer.	351.000,00
15	Kalp Damar Cerr	887.700,00
16	Böbrek Nakli Hast.	5.932.465,85
17	Göğüs Hast. A.D.	1.620.000,00
18	Patoloji	206.500,00
19	Bilgi İşlem	618.552,90

20	Çocuk Hast.Radyoloji Ünitesi	58.800,00
21	Genel Dahiliye	128.376,44
22	Klinik ve Yoğun Bakım	131.626,44
23	Personel işleri	21.794,77
24	Nükleer Tıp	867.759,56
25	Çamaşırhane	1.452.000,00
26	Geriatri (Onkoloji Servisi)	75.300,00
27	Palyatif	12.420,00
TOPLAM (₺)		24.997.885,00

**Tablo 11:** 2022 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu


### ❖ Büyük Onarımlar:

Bu proje kapsamında; 2023 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 15.000.000,00 ₺ ödenek verilmiş, fakat anılan projeye Mevcut Ambar Binasının Onkoloji Hastanesine Dönüştürülme işi kapsamında 40.000.000,00 ₺ ek ödenek eklenerek toplam ödenek 55.000.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten yılsonunda 46.900.413,82 ₺ ( Onkoloji Hastanesi Dönüştürülme işi: 38.196.135,70 ₺) harcanmış olup, 8.704.278,12 ₺ Hastane tadilat ve onarımları için kullanılmıştır.

#### Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tadilat ve Onarımları

İnşaatın Toplam Maliyeti	6.326.803,33
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	01.06.2023-23.11.2023
İnşaatın tamamlanma oranı	%60

**AÇIKLAMALAR:** Tıp Fakültesi 3. Blok ve protokol üzeri çatılarının trapez sac ile kaplanması, morg girişi üzeri çatının trapez sac kaplaması yapılması, olukların yenilenmesi, hastane içerisinde bir çok klinikte iç cephe boyası yapılması, muhtelif alanlarda taban pvc ve yer döşeme kaplamalarının yenilenmesi, ameliyathane üzeri , yoğun bakım üzeri ve sarf malzeme deposu üzeri klima santrallerinin taban döşemelerinin sürme esaslı su yalıtımı işleri yapılmıştır. Ayrıca Çocuk Hastanesi binası zemin kat hasta başı acil müdahale yerinin yapılması, zemin kat ve ikinci kat iç bahçe duvarlarının boyanması ve yine aynı mahallerin çatı üzerine çelik konstrüksiyon yapılp, üzerinin polikarbon malzeme ile kapatılması , depo iniş yağmur suyu mazgallarının genişletilmesi ve derinleştirilmesi, Çocuk Hastanesi çevre tretuvarlarının üzerine beton dökülmesi işleri yapılmıştır. Ancak iş bitim tarihi 28.10.2023 olmasına rağmen, , cezalı çalışma süresi içerisinde iken yüklenici işi tamamlayamayacağını ifade etmiş ve işin fesh edilmesini talep etmiştir. İdaremiz tarafından yüklenicinin bu talebi Hukuk Müşavirliğimizden alınan görüş doğrultusunda 23.11.2023 tarihi itibarıyla fesih kararı ve onayı alınmıştır.

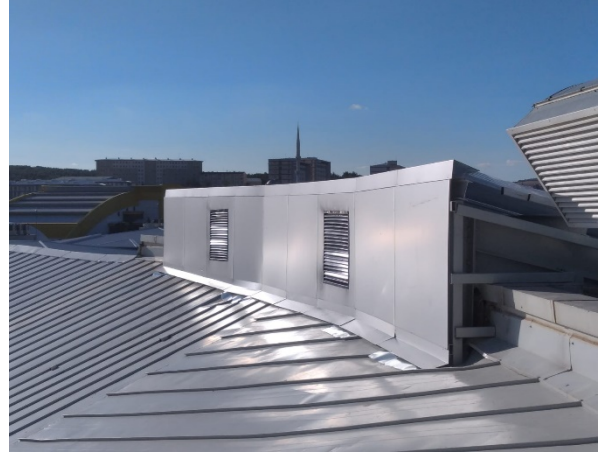

### 6.2.5.2. Mevcut Ambar Binasının Onkoloji Hastanesine Dönüştürülmesi

#### Mevcut Ambar Binasının Onkoloji Hastanesine Dönüştürülmesi İşi

İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV, İş Artışı ve Fiyat Farkı Dâhil)	43.626.000,00
2023 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	38.196.135,70
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	28.08.2023-17.01.2024
İnşaatın Kapalı Alanı	5.040m <sup>2</sup>
Fiziki Gerçekleşme Durumu	% 87

Zemin kat kemoterapi merkezi, 1. Kat palyatif odaları, tek ve iki kişilik hasta yatak odaları, doktor ve hemşire odaları Kat toplantı salonu, yemekhane, idari ofisler, tek ve iki kişilik hasta yatak odaları, doktor ve hemşire odaları bulunmaktadır.



### 6.2.1.2. Makine, Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye):

Üniversitemizin 2022 Yılı Yatırım Programına; hastanenin büyük onarımlarında kullanılmak üzere kaynağı döner sermayeden olmak üzere 2.400.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup yılsonu itibariyle bu ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır.

### 6.2.2. Acil Travma ve Yanık Hastanesi

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2022I00-183763	
Proje Adı	Acil Travma ve Yanık Hastanesi	
Sektör/ Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Üniversitemizin ihtiyacı olan modern bir Acil Travma ve Yanık Hastanesi yapmak.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	İnşaat, Makine Teçhizat	
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2025	
2022 yılı harcaması	6.965.727,80	
Projenin Yılı Ödeneği	45.000.000,00	170.000.000,00
Yapılan Harcama (₺)	115.111.883,71	

#### 6.2.2.1. Acil Travma ve Yanık Hastanesi İnşaatı

2023 yılı yatırım programında 134 yatak ve 24.820 m2 olarak yer alan Acil Travma ve Yanık Hastanesi inşaat projesi kapsamında; 2023 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 45.000.000,00 ₺ ödenek konulmuş, yıl içerisinde likit kaynaklardan 20.000.000,00 ₺, ek bütçe ile 105.000.000,00 ₺ olmak üzere 125.000.000,00 ₺. ödenek eklenerek toplam ödenek 170.000.000,00 ₺ olmuştur. 2023 yılı yatırım programında yer alan Acil Travma ve Yanık Hastanesi 284.970.000,00 ₺ bedel ile ihale edilmiştir. İnşaatın yer teslimi 29.11.2022 tarihinde yapılmış olup, 6.965.727,80 ₺ harcama 2022 yılından, 115.111.883,71 ₺ 2023 yılından olmak üzere 2023 yılı sonu itibariyle 122.077.611,51 harcama yapılmıştır. Sözleşmeye göre inşaatın 28.11.2024 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.



### 6.3. DİĞER KAMU HİZMETLERİ

#### 6.3.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

TAMAMLANMA RAPORU		
<b>AÇIKLAMA</b>	<b>YATIRIM PROGRAMI</b>	<b>REVİZE</b>
Proje No	2020K12-151083	
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	
Sektör/ Alt Sektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma	
Proje Amacı	Bilimsel Araştırma Projelerini Desteklemek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Proje Desteği	
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023	
Projenin Yılı Ödeneği	12.808.000,00	29.536.000,00
Yapılan Harcama (₺)	Bütçe Harcaması: 29.536.000,00 Özel Hesap Harcaması: 17.976.161,00	

Bu proje kapsamında; 2023 Yılı Bütçe Kanunu ile bütçeye yatırım projesi kapsamında 12.808.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup yıl içinde gelir fazlası olarak 16.728.000,00 TL ödenek eklenmiş toplam ödenek 29.536.000,00 ₺. ye ulaşmıştır. Söz konusu ödeneğin tamamı 2023 yılı sonu itibariyle özel hesaba aktarılmıştır. Özel hesaptan bilimsel araştırma projelerinin cari + yatırım harcamaları için 41.467.423,65 ₺ harcama yapılmış olup, 17.976.161,00 TL yatırım harcamasına aittir. Diğer taraftan; 2023 yılı içerisinde 116 adet bilimsel araştırma proje desteklenmiş olup bu projeler için 52.954.024,21 ₺ destek ayrılmıştır. 2022 yılından 97 adet proje 2022 yılına devrolmuştur. Ayrıca yıl içerisinde 116 adet proje sonuçlandırılmıştır.

2023 Yılı İtibariyle BAP Kapsamında Yürütülen Projeler				
Projeler	Önceki Yılda Devreden Proje Sayısı	2023 Yılı İçinde Eklenen Proje Sayısı	Toplam Proje Sayısı	Yıl İçinde Tamamlanan Proje Sayısı
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	97	116	213	116
<b>Genel Toplam</b>	<b>97</b>	<b>116</b>	<b>213</b>	<b>116</b>

Tablo 12: 2023 Yılı İtibariyle BAP Kapsamında Yürütülen Projeler

2023 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Araştırma Projelerinin Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı											
Akademik Birimler	Maip	ÖKAP	Alt Yapı	Hızlı Destek	Uzmanlık Tezi	Yüksek lisans	Doktora	GAP	DKP	ÖNAP	TOPLAM
Diş Hekimliği Fakültesi	2		3		3		1				9
Eğitim Fakültesi						2			1		3
Fen Bil. Enstitüsü						20	5				25
Fen Edebiyat Fakültesi	2	1	2								5
Güzel Sanatlar Fakültesi						2					2
Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi											0
İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi											0
İlahiyat Fakültesi						1					1
İletişim Fakültesi											0
Mühendislik Fakültesi	5		6				3	1			15
Naci Top. Mesl. Yüks. Okulu	2										2
Rektörlük											0
Sağlık Bil. Enstitüsü						11	4				15
Sağlık Bil. Fakültesi			1				1				2
Spor Bil. Fakültesi											0
Tıp Fakültesi	3	1	6	5	19		2				36
Araban MYO											0
Sosyal Bil. MYO											0
Teknik Bil. MYO											0
Turizm ve Otel. MYO.						1					1
İslahiye MYO											0
Nizip Eğiti. Fak.											0
Nurdağı MYO											0
<b>TOPLAM</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>116</b>

**Tablo 13:** 2023 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Arş. Projelerinin Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı





## 7. EKLER

### 7.1 2023 Yılı Kamu Yatırımları Özeti (Yılsonu)

Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar (Özel Bütçe+Döner Sermaye)

2023 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2022 Sonu Kümülatif Harcama			2023 Yılı Program Ödeneği			2023 Yılı Revize Ödenek			2023 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Eğitim	5	0	662.558	0	0	19.271	0	0	49.000	0	0	159.577	0	0	84.889
Sağlık	3	0	417.400	0	0	7.000	0	0	87.400	0	0	252.400	0	0	115.112
D.K.H	2	0	29.536	0	0	0	0	0	12.808	0	0	29.536	0	0	29.536
<b>Toplam</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1.109.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.435</b>

**Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar (Özel Bütçe)**

2023 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2022 Sonu Kümülatif Harcama			2023 Yılı Program Ödeneği			2022 Yılı Revize Ödenek			2023 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Eğitim	5	0	662.558	0	0	19.271	0	0	49.000	0	0	159.577	0	0	84.889
Sağlık	3	0	415.000	0	0	7.000	0	0	85.000	0	0	250.000	0	0	115.112
D.K.H	2	0	29.536	0	0	0	0	0	12.808	0	0	29.536	0	0	29.536
<b>Toplam</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1.107.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.435</b>

**Bütçe Türü: Döner Sermaye**

2023 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2022 Sonu Kümülatif Harcama			2023 Yılı Program Ödeneği			2022 Yılı Revize Ödenek			2023 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Sağlık	1	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400	0	0	2.400	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 7.2 2023 Yılı Harcamaları Yılısonu Gerçekleşme Raporu

### Sektör Adı: Eğitim

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2022 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek Dış Öz kaynak	Ödenek Toplam	+ / -	Aktarma/ Tenkis Mikt.	Harcama Dış Kredi	Harcama Dış Öz kaynak	Harcama Toplam
1	1988H03-146	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2025	Gaziantep	0,	570.409	7.559	0,	0,	34.640	+	58.500	0,	0,	25.360
2	2020H03-150666	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2024	Gaziantep	0,	29.712	11.712	0,	0,	4.000		0	0,	0,	1.462
3	2023H03-212060	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2023	Gaziantep	0,	3.255	0,	0,	0,	200	+	3.055	0,	0,	1.374
4	2023H03-212064	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2023	Gaziantep	0,	55.482	0,	0,	0,	6.460	+	49.022	0,	0,	52.995
5	2023H03-212062	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2023	Gaziantep	0,	3.700	0	0	0	3.700		0	0	0	3.698
Toplam						0,	662.558	19.271	0,	0,	49.000	+	110.577	0,	0,	84.889

### Sektör Adı: Sağlık

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2022 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek Dış Öz kaynak	Ödenek Toplam	+ / -	Aktarma/ Tenkis Mikt.	Harcama Dış Kredi	Harcama Dış Öz kaynak	Harcama Toplam
1	2023I00-191293	Muhtelif işler	ÖZEL BÜTÇE	2023	Gaziantep	0,	80.000	0,	0,	0,	40.000	+	40.000	0,	0,	71.898
			DÖNER SERMAYE	2023	Gaziantep	0	2.400	0	0	0	2.400	+	0	0	0	0
2	2022I00-183763	Acil Travma ve Yanık Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2025	Gaziantep	0	335.000	7.000	0	0	45.000	+	125.000	0	0	115.112
Toplam							417.400	7.000	0,	0,	87.400		165.000	0,	0,	187.010

**Sektör Adı: D.K.H.**

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2022 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek Dış Öz kaynak	Ödenek Toplam	+ / -	Aktarma/ Tenkis Mikt.	Harcama Dış Kredi	Harcama Dış Öz kaynak	Harcama Toplam
1	2023K12-213125	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2023	Gaziantep	0	29.536	0	0,	0,	12.808	+	16.728	0,	0,	29.536
Toplam							29.536	0	0,	0,	12.808	0	16.728	0,	0,	29.536
