



**T.C.  
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**

**2024 YILI YATIRIM PROGRAMI  
İZLEME VE DEĞERLENDİRME  
RAPORU**

**Strateji Geliştirme Başkanlığı  
Ocak-2025**



**T.C**  
**GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**

**2024 YILI YATIRIM PROGRAMI**  
**İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Ocak-2025**

## 1. ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ



Bilim dünyasına yaptığı evrensel katkılar ve yükseköğretim alanındaki öncü misyonuyla ülkemizde önemli bir yere sahip olan Üniversitemizi daha ileriye taşımak için tüm gayretimizle çalışacağız. Yeni dönemde Üniversitemizi arzu ettiğimiz yere taşımak için devam eden yatırım projelerinin yanısıra yeni yatırım projeleri teklif edilecektir. Gerek devam eden yatırımlar için verilen ödenekler gerekse de yeni yatırım projeleri kapsamında tahsis edilecek ödenekler mevzuatımızın öngördüğü şekilde etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasına azami riayet edilecektir.

2024 yılı yatırım programında; eğitim sektöründe beş, sağlık sektöründe iki ve diğer kamu hizmetleri sektöründe bir proje olmak üzere toplam sekiz adet yatırım projesi yer almaktadır. Söz konusu yatırım projelerine merkezi yönetim bütçesinden 389.458.000,00 TL. döner sermaye bütçesinden 4.320.000,00 TL. olmak üzere toplam 393.778.000,00 TL. ödenek konulmuş olup, yıl içinde bu projelere gelir fazlası karşılığı, likit kaynaklarımızdan ve yedek ödenekten toplam 247.708.000,00 TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 641.486.000,00 TL. 'ye ulaşmıştır. 2024 yılı sonu itibariyle bu ödeneğin toplam 628.440.227,82 TL. 'si harcanmış olup, harcama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda; Naci Topçuoğlu Ek Atölye ve Laboratuvar bina inşaatı tamamlanmıştır. Acil Travma ve Yanık Hastanesi inşaatı hızla devam etmekte olup, inşaatın 2024 yılsonu itibariyle tamamlanma oranı %80'e ulaşmıştır. Hastane inşaatımızın 2025 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca 2024 yılı Mayıs ayında inşaatına başlanan ve ilk yıl %25 fiziki gerçekleşme öngörülen Kütüphane binası inşaatı hızla devam etmekte ve yılsonu itibariyle inşaatın fiziki gerçekleşmesi %30 olmuştur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25. maddesi gereği Üniversitemiz yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmek üzere, 2024 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**Prof. Dr. Sait Mesut DOĞAN**

**Rektör**

## 2. İÇİNDEKİLER

1.	ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ.....	iii
2.	İÇİNDEKİLER.....	iv
3.	ŞEKİLLER TABLOSU .....	v
4.	GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
4.1.	Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri .....	2
4.2.	Yatırımların Finansman Kaynakları .....	3
4.3.	Kuruluşun Mevcut Kapasitesi.....	3
4.4.	2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı .....	4
5.	2024 YILI YATIRIM UYGULAMALARI .....	5
5.1.	Genel Yatırım Uygulama Durumu .....	5
5.2.	Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar/Öneriler .....	6
6.	2024 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	7
6.1.	EĞİTİM SEKTÖRÜ .....	7
6.1.1.	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi .....	7
6.1.2.	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi .....	8
6.1.3.	Kampus Altyapı .....	10
6.1.4.	Muhtelif İşler.....	13
6.1.1.1	Bina Büyük Onarımları Kapsamında Yapılan İşler: .....	14
6.1.1.2	Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Donanım Alımlarına İlişkin Tablolar .....	17
6.1.5.	Yayın Alımları .....	18
6.2.	SAĞLIK SEKTÖRÜ .....	19
6.2.1.	Muhtelif İşler.....	19
6.2.1.1.	Makine Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları .....	20
6.2.2.	Acil Travma ve Yanık Hastanesi.....	24
6.3.	DiĞER KAMU HİZMETLERİ.....	25
6.3.1.	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri .....	25
7.	EKLER.....	27
7.1.	2024 Yılı Harcamaları Yılısonu Gerçekleşme Raporu .....	27

### 3. ŐEKİLLER TABLOSU

Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler .....	2
Tablo 2: Tamamlanan İnŐaatlar ve İŐler .....	4
Tablo 3:Devam Eden İnŐaatlar ve İŐler .....	5
Tablo 4: 2024 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı .....	6
Tablo 5: 2024 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı .....	6
Tablo 6: Muhtelif İŐler Kapsamında Alınan Makine.-Teçhizat, Bilgisayar ve Yazılım ile Donanım Alımları.....	17
Tablo 7: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları .....	18
Tablo 8: 2022-2024 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları.....	19
Tablo 9: 2024 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu .....	20
Tablo 10: 2024 Yılı İtibariyle BAP Kapsamında Yürütölen Projeler .....	25
Tablo 11: 2024 Yılında Kabul Edilen Bilimsel ArŐ. Projelerinin Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı.....	26

#### 4. GENEL DEĞERLENDİRME

2024 Yılı Yatırım Programında, Üniversitemizin 8 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Bu projelerin 5 adedi eğitim, 2 adedi sağlık 1 adedi ise teknolojik araştırma sektöründe yer almaktadır. Bu projelere bütçe kanunu ile 393.778.000,00 TL. ödenek verilmiş, yıl içinde yapılan alınan yedek ödenek yapılan aktarma ve eklemelerle yıl sonu itibariyle toplam ödenek 641.486.000,00 TL.'ye ulaşmıştır. Söz konusu ödenekten 628.440.227,82 TL. harcama yapılmış ve harcama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemizin 2020-2024 dönemi stratejik planında; kurumsal misyon, vizyon amaç ve hedefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

<b>MİSYONUMUZ</b>
Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli insan yetiştiren; bireylere, topluma ve tüm kurum-kuruluşlara eğitim, bilim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında hizmet üreten değişime açık bir üniversite.

<b>VİZYONUMUZ</b>
Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde uluslararası rekabet kabiliyeti yüksek bir dünya üniversitesi olmak.

#### 4.1. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemizin 2020-2024 dönemi Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedefleri aşağıda sıralanmıştır. 2024 yılı yatırım projeleri bu amaç ve hedefler doğrultusunda planlanmış ve yıl içi harcamaları bu doğrultuda yapılmıştır.

<b>Stratejik Amaç-1 Ulusal ve Uluslararası Alanda Etkin, Saygın, Girişimci ve Yenilikçi Bir Araştırma Üniversitesi Olmak</b>	
Hedef-1	Bilimsel araştırmaları nicelik ve nitelik olarak arttırmak,
Hedef-2	Üniversitenin ulusal ve uluslararası tanınırlığını ve başarı endekslerindeki düzeyini artırmak,
Hedef-3	Araştırma materyalleri ve fiziki altyapısının güçlendirilmesi,
Hedef-4	Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların üniversitemizde yapılmasının teşvik edilmesi,
<b>Stratejik Amaç-2 Sağlık alanında bölgesel referans merkezi olmak</b>	
Hedef-1	Yurt içi ve yurt dışı sağlık turizminin geliştirilmesi,
Hedef-2	Hastanelerin fiziki ve teknolojik alt yapısının güçlendirilmesi,
<b>Stratejik Amaç-3 Etkin ve sürdürülebilir üniversite Sanayi işbirliğinin sağlanması</b>	
Hedef-1	AR-GE işbirliklerini arttırmak
Hedef-2	Teknoloji Transfer Ofisi (TARGET TTO) ile TEKNOPARK'ın etkinliğinin geliştirilmesi,
<b>Stratejik Amaç-4 Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli eğitim yapmak</b>	
Hedef-1	Nitelikli öğretim elemanı sayısını arttırmak,
Hedef-2	Üniversitenin tanıtımı yapılarak nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine zemin hazırlamak,
Hedef-3	İhtiyaç duyulan eğitim, sportif ve sosyal binalarının yapılması, mevcut binaların yenilenmesi ve kampüs altyapısının iyileştirilmesi,
Hedef-4	Eğitim materyalleri alt yapısını güçlendirmek,
Hedef-5	Ders dışı eğitim ve sertifika programlarının yaygınlaştırılması,
Hedef-6	Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere katılımının artırılması,
<b>Stratejik Amaç-5 Kurumsallaşma ve Kurum Kültürünün Güçlendirilmesi</b>	
Hedef-1	Kurum iş ve hizmet kalitesinin artırılması,
Hedef-2	Kurumsal aidiyetin artırılmasına yönelik eğitim ve sosyal faaliyetleri arttırmak,

**Tablo 1:** Stratejik Amaç ve Hedefler

## 4.2. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemizin, 2024 yılı yatırım programında 8 adet yatırım projesi bulunmaktadır. 2024 yılı Bütçe Kanunu ile söz konusu projelere; 389.458.000,00 TL. döner sermaye bütçesinden ise 4.320.000,00 TL. olmak üzere toplam 393.778.000,00 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde likit karşılığı olarak 132.2868.000,00 TL., gelir fazlası olarak 35.350.000,00 TL. şartlı bağış karşılığı olarak 2.000.000,00 TL. ödenek eklenmiş ayrıca yedek ödenekten 77.500.000,00 TL. olmak üzere toplam 247.718.000,00 TL. ödenek eklenmiş olup, 2024 yılı sonu itibariyle toplam ödenek 641.496.000,00 TL.'ye ulaşmıştır. Bahse konu ödeneğin 628.440.227,82 TL.'si harcanmış, harcama oranı ise %98 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemize verilen 393.778.000,00 TL.'lik başlangıç yatırım ödeneğinin 363.395.000,00 TL.'si hazine yardımı, 26.063.000,00 TL.'si öz gelir ve 2.400.000,00 TL.'si döner sermaye ödeneğinden oluşmaktadır. 2024 yılsonu itibariyle hazine yardımı, öz gelir, likit kaynaklar ile döner sermaye ödeneklerinin dağılımı ve harcamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı (Bin TL.)				
Finans Kaynağı	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı (%)
Hazine Yardımı	363.395	440.545		
Likit Kaynaklar Karşılığı Kaydedilen	0	133.218	565.919	99
Öz Gelir ve Gelir Fazlası Karşılığı Kaydedilen	26.063	61.413	61.413	100
Şartlı Bağış ve Yardımlar	0	2.000	1.108	55
Bütçe Toplamı	389.458	637.176	628.440	99
Döner Sermaye	4.320	4.320	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>393.778</b>	<b>641.496</b>	<b>628.440</b>	<b>98</b>

## 4.3. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi

Gaziantep Üniversitesinin temeli, 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği bölümüne dayanmaktadır. 27 Haziran 1987 yılında, 3389 sayılı yasa ile bugünkü statüsüne kavuşan üniversitemiz zaman içerisinde hızla büyüyerek bugün itibariyle; 20 Fakülte, 2 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 5 Enstitü, 31 Araştırma ve Uygulama Merkezini bünyesinde barındırmaktadır. Üniversitemizde; 1.669 akademik personel, 2.122 idari personel, 1.697 sürekli işçi olmak üzere toplam 5.488 personel bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde yapılan yeni kayıtlarla birlikte 52.932 öğrenci sayısına ulaşarak sadece bölgemizin değil ülkemizin sayılı üniversiteleri arasına girmiş bulunmaktadır. Gaziantep Üniversitesinin toplam yüzölçümü 3.059.560,68 m<sup>2</sup>, toplam kapalı alanı ise 523.606 m<sup>2</sup>'dir. Üniversitemizin toplam 8 adet yerleşkesi bulunmaktadır. Merkez kampüste 88 adet lojman bulunmakta olup bu lojmanların 8 tanesi dubleks, 16 tanesi 2+1, geriye kalan 64 tanesi ise 3+1'dir. Üniversitemiz genel sağlık hizmetlerini Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Onkoloji Hastanesinde Diş Sağlığına ilişkin Hizmetlerini ise Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde vermektedir.



#### 4.4. 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2024 yılında Üniversitemizde; Naci Topçuoğlu MYO. Ek Atölye ve Laboratuvar binası, Çarşı İçi ve Onkoloji Hastanesi Çevre Düzenlemesi, Mevcut Ambar Binasının Onkoloji Hastanesine Dönüştürülmesi, Bina Tadilat ve Onarımları, Nizip MYO. Eğitim Binası Çatı Tadilat ve Onarımları, Atık Depolama Tesisi Subasman İmalatı, Çocuk Hastanesi Otopark ve Peyzaj Düzenlemesi işi, Kampüs içerisinde otomatik sulama sistemi yapılması, Merkezi Isı Santrali kazan bakım ve onarımı işleri tamamlanmıştır. Diğer taraftan, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi tadilat ve onarımları %98 oranında tamamlanmıştır.

Ayrıca, 24.820 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip Acil Travma ve Yanık Hastanesi ve 18.700 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip Kütüphane binası inşaatları devam etmektedir.

Yatırım projeleri kapsamında 2024 yılında Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca tamamlanan işler ile devam eden inşaatlar aşağıda gösterilmiştir.

TAMAMLANAN İŞLER			
İnşaatın/İşin Adı	İşin Toplam Maliyeti	İşin Başlangıç/Bitiş Tarihi	Tamamlanma Süresi (Ay)
1-Mevcut Ambar Binasının Onkoloji Hastanesine Dönüştürülmesi	49.146.223,68	31.08.2023 17.01.2024	139 gün
2-Çarşı İçi ve Onkoloji Hastanesi Çevre Düzenlemesi	2.210.631,12	04.04.2024- 02.06.2024	60 gün
3-Bina Tadilat ve Onarımları	4.137.457,80	17.05.2024 13.09.2024	120 gün
4- Nizip MYO. Eğitim Binası Çatı Tadilat ve Onarımları	1.101.905,52	05.08.2024 18.09.2024	45 gün
5-Atık Depolama Tesisi Subasman İmalatı	891.809,11	08.07.2024 21.08.2024	45 gün
6-Naci Topçuoğlu MYO Ek Atölye ve Laboratuvar binası	31.493.542,82	04.09.2023 07.03.2024	185 gün
7- Merkezi Isı Santrali kazan bakım ve onarımı	2.096.532,00	07.11.2024 26.11.2024	18 gün
8- Çocuk Hastanesi Otopark ve Peyzaj Düzenlemesi işi	2.025.666,54	03.12.2024 22.12.2024	20 gün
9-Kampüs içerisinde otomatik sulama sistemi yapılması	1.286.143,62	17.10.2024 15.12.2024	60 gün
10-Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tadilat ve Onarımları	20.260.631,10	03.06.2024 09.12.2024	190 gün
<b>TOPLAM</b>	<b>114.650.543,31</b>		

**Tablo 2:** Tamamlanan İnşaatlar ve İşler

TAMAMLANAN/DEVAM EDEN İNŞAATLAR				
İnşaatın Adı	İhale Bedeli/Maliyeti (KDV Dâhil )	Kapalı alanı (m2)	İnşaatın Başlangıç/Bitiş Tarihi	Tamamlanma Oranı (%)
1- Onkoloji Hastanesi	49.146.223,68	5.040	31.08.2023 17.01.2024	100
2- Acil Travma ve Yanık Hastanesi inşaatı	289.800.000,00	24.820	29.11.2022 08.08.2025	80
3- Kütüphane Binası	693.600.000,00	18.700	28.05.2024 17.05.2026	30
<b>TOPLAM</b>	<b>1.031.746.223,68</b>	<b>43.520</b>		

**Tablo 3:**Devam Eden İnşaatlar ve İşler

## 5. 2024 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

### 5.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım projelerinin harcamaları için bütçeden 389.458.000,00 TL. ve döner sermaye bütçesinde ise 4.320.000,00 TL. ödenek verilerek toplam ödenek 393.778.000,00 TL. olmuştur. Yıl içinde bu ödeneye 247.718.000,00 TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 641.496.000,00 TL.'ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 628.440.227,82 TL.'si yıl içinde 8 adet yatırım projesi için harcanmış ve harcama oranı % 98 olarak gerçekleşmiştir.

SEKTÖR	PROJE	ALT PROJE	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	HARC ORANI (%)	
EĞİTİM YÜKSEK ÖĞRETİM	146- Derslik ve Merkezi Birimler		100.000.000	192.778.000	192.720.481,44	100	
		216522- Ek Atölye ve Laboratuvar Binası	10.000.000	19.253.000	19.246.900,61	100	
		214162- Kütüphane Binası	90.000.000	173.525.000	173.473.580,83	100	
		150666- Kampüs Altyapısı	6.000.000	12.858.000	11.665.184,39	91	
		232801- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi		1.000.000	1.000.000	60.000	6
		232803- Yayın Alımı		5.000.000	5.544.000	5.541.795,72	100

	232805- Muhtelif İşler		30.000.000	42.650.000	36.993.650,20	<b>87</b>
<b>EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM TOPLAMI</b>			<b>142.000.000</b>	<b>254.830.000</b>	<b>246.981.111,75</b>	<b>97</b>
SAĞLIK	183763- Acil Travma ve Yanık Hastanesi		160.000.000	264.888.000	264.517.742,85	<b>100</b>
		183765- İnşaat	130.000.000	234.888.000	234.520.742,85	<b>100</b>
		183769- Makine Teçhizat	30.000.000	30.000.000	29.997.000,00	<b>100</b>
	218079- Muhtelif İşler		69.320.000	69.320.000	64.483.373,22	<b>93</b>
		218080- Büyük Onarım (Deprem)	39.320.000	39.320.000	34.487.598,18	<b>88</b>
		218079- Makine Teçhizat	30.000.000	30.000.000	29.995.775,04	<b>100</b>
<b>SAĞLIK TOPLAMI</b>			<b>229.320.000</b>	<b>334.208.000</b>	<b>329.001.116,07</b>	<b>98</b>
DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	233480- Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri		22.458.000	52.458.000	52.458.000,00	<b>100</b>
<b>DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA TOPLAMI</b>			<b>22.458.000</b>	<b>52.458.000</b>	<b>52.458.000,00</b>	<b>100</b>
			<b>393.778.000</b>	<b>641.496.000</b>	<b>628.442.742,37</b>	<b>98</b>

**Tablo 4:** 2024 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı

Sektör Adı	Proje Sayısı	Bütçe Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcama	Harc. Oranı (%)
Devam Eden Projeler	3	266.000.000	470.524.000	468.903.408,68	<b>100</b>
Tamamlanan Projeler	5	127.778.000	170.972.000	159.536.819,14	<b>93</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>8</b>	<b>393.778.000</b>	<b>641.496.000</b>	<b>628.440.227,82</b>	<b>98</b>

**Tablo 5:** 2024 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı

## 5.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar/Öneriler

- ❖ Yatırım tavanlarının belirlenmesi sürecinde, yatırımcı kuruluşlar ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile daha fazla görüşme yapılarak sürdürülebilir yatırım tavanlarının ortaya çıkması sağlanabilir. Bu yolla hem yıl içinde yatırımların aksamadan yürütülmesi sağlanacak hem de yıl içinde oluşacak yedek ödenek talepleri de en aza indirilebilecektir.

- ❖ Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve mevsimsel şartlar Strateji ve Bütçe Başkanlığınca göz önüne alınır ve buna göre ödenek serbest bırakma oranları belirlenirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir.
- ❖ Ayrıntılı Finans Programının sadece ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde hazırlanması 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine daha uygun olacaktır.
- ❖ Ödenek tavanları belirlenmesi sürecinde objektif kıstas belirlenerek, bu kriterlerin bütçe hazırlayan kurumlara duyurulması halinde daha reel duruma uygun yatırım bütçeleri ortaya çıkacaktır.
- ❖ Kurumların, öz gelirlerini yatırım bütçesine tam olarak yansıtma imkânı sağlanmalıdır.

## 6. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI

Üniversitemiz 2024 Yılı Yatırım Programında 8 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Bunların beşi eğitim, ikisi sağlık, biri de diğer kamu hizmetleri sektöründe yer almaktadır. Aşağıda bu projelerin yıl içindeki uygulamaları belirtilmiştir.

### 6.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ

#### 6.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2024H03-232801	
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	İnşaat ve ihale aşaması için hazırlık yapılması ve projelendirme işlerinin yapılması.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Etüd-Proje ve Müşavirlik	
Başlama-Bitiş Tarihi	2024- 2024	
Projenin Yılı Ödeneği	1.000.000	1.000.000
Yapılan Harcama (TL.)	60.000	

Bu proje kapsamında; 2024 Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 1.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten 2024 yılı sonunda 60.000,00 TL harcama yapılmış ve harcama oranı %6 olmuştur. Proje kapsamında Sıfır Atık Tesisi Binası statik projesi ödemesi yapılmıştır.

## 6.1.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	1988H03-146	
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Her yıl yeni açılan akademik birimlerin bina ihtiyaçlarını karşılamak ve kapasitesi yetiştirmeyen binalara yeni ve ek bina yapımını sağlamak	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Eğitim (5.040 m <sup>2</sup> ), Kütüphane Binası (18.700 m <sup>2</sup> ), Naci Topçuoğlu Ek Atölye ve Lab Binası (2.880 m <sup>2</sup> )	
Başlama-Bitiş Tarihi	1988 – 2026	
Projenin Yılı Ödeneği	100.000.000	192.778.000
Yapılan Harcama (TL.)	192.720.481,44	

Bu proje kapsamında; 2024 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 100.000.000,00 TL. ödenek verilmiş olup, yıl içinde likit karşılığı olarak 67.778.000,00 TL., yedek ödenekten ise 25.000.000,00 TL. olmak üzere yıl sonu itibariyle toplam ödenek 192.778.000,00 TL. 'ye ulaşmıştır. Söz konusu ödenekten 2024 yılı sonu itibariyle 192.720.481,44 TL. harcama yapılmıştır. Naci Topçuoğlu Ek Atölye ve Laboratuvar Binası inşaatı tamamlanmıştır. Ayrıca Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 693.600.000,00 TL. bedel ile ihalesi yapılan kütüphane binası inşaatı hızla devam etmekte olup, yılsonu itibariyle inşaatın fiziki gerçekleşmesi %30 olarak gerçekleşmiştir.

Kütüphane Bina İnşaatı	
İnşaatın Toplam Maliyeti ( KDV dahil)	693.600.000,00 TL
2024 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	173.473.580,83 TL
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	28.05.2024-17.05.2026
İnşaatın Kapalı Alanı	18.700 m <sup>2</sup>
Fiziki Gerçekleşme Durumu	30
AÇIKLAMA : Kütüphane projesinde; BODRUM KAT (2.133 m <sup>2</sup> ) : Sığınak, kazan dairesi, eşanjör dairesi, su deposu, yangın su deposu, personel giyinme odaları, ZEMİN KAT (5343 m <sup>2</sup> ) : 6 adet 35 kişilik derslik, 2 adet 150 kişilik 7/24 çalışma salonu, Sergi salonu, iletişim ve kontrol odası, bilgi tarama merkezi, dijitalleştirme birimi, BİRİNCİ KAT (5443 m <sup>2</sup> ) : 1 adet 62 kişilik bireysel çalışma odası, 1 adet 363 kişilik 7/24 çalışma salonu,	

6 adet 25 kişilik çalışma odası,  
21 adet 10 kişilik grup çalışma salonu,  
Teknoloji odası, görsel işitsel materyal odası  
İKİNCİ KAT (5781 m<sup>2</sup>) :  
2 adet 185 kişilik basılı kaynak odaları ve ofisler  
1 adet 70 araçlık otopark alanı mevcuttur.

### Naci Topçuoğlu MYO Atölye Binası (Ek bina) İnşaatı

İnşaatın Toplam Maliyeti (iş artışı ve KDV dahil)	31.493.542,82 TL
2023 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama	12.246.642,21 TL
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	04.09.2023-07.03.2024
İnşaatın Kapalı Alanı	2.880 +340 = 3.220 m <sup>2</sup>
Fiziki Gerçekleşme Durumu	100

Bu projede; Bodrum kat: Doğalgaz odası, kaynak odası, elektrik odası ve eşanjör odası.

Zemin kat: 2 adet tekstil atölyesi, 3 adet derslik, 2 adet giyim atölyesi, , 2 adet kuyumculuk atölyesi, 1 adet biyomedikal atölyesi, 1 adet radyo-tv atölyesi, 1 adet pano odası. 1.kat 4 adet bilgisayar atölyesi, 2 adet derslik, 1 adet sayısal elektronik atölyesi, 1 adet haberleşme atölyesi, 1 adet temel elektronik atölyesi, 1 adet güç elektroniği odası, 2 adet ofis 1 adet pano odası bulunmaktadır.



### 6.1.3. Kampus Altyapı

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2020H03-150666	
Proje Adı	Kampüs Alt yapısı	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversite alt yapısının iyileştirilmesi, yeni yapılan binalarda altyapı çalışmalarının yapılması	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	
Başlama-Bitiş Tarihi	1991 -2024	
Projenin Yılı Ödeneği	6.000.000	<b>12.858.000</b>
Yapılan Harcama (TL.)	<b>11.665.184,39</b>	

Bu proje kapsamında; 2024 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 6.000.000,00 TL. ödenek verilmiştir. Bu ödeneye yıl içerisinde 1.748.000,00 TL kuyu açılması işi, 2.000.000,00 TL sulama sisteminin otomatik sisteme dönüştürülmesi işi için, 3.110.000,00 TL. Isı Santrali kazan bakım ve onarımı işi için ödenek eklenmiş ve toplam ödeneğimiz 12.858.000,00 TL. olmuştur. Bu ödenekten 2024 yılı sonunda 11.665.184,39 TL harcanmış olup, harcama oranı % 91 olarak gerçekleşmiştir.

#### Kampüs Altyapısı Kapsamında Yapılan İşler

Bu proje kapsamında; Isı Santrali 1 nolu kazan tadilatı, Isı Santrali 4 nolu kazan için malzeme alımı, Isı merkezi 4 nolu kazan tadilatları işine ait demontaj, montaj ve onarım işleri, Kimya Bölümü Öğrenci Laboratuvarı merkezi klimasında VRF sistemi arızasından dolayı gaz testi yapıp arızanın giderilmesi işi, Kampüs alanı ve Araban MYO. Güneş Enerji Santrali alanı için hizmet alımı işi, Isı Santralindeki ısıtma sisteminin tesisatında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yedek parça alımı, Nizip Eğitim Fakültesi trafosuna ait kesicinin tadilat ve onarımı, Onkoloji Hastanesi önü çevre düzenlemesi yapılması, Kampüs içerisinde derin sondaj kuyusu açılması işi, Isı Merkezi 3 nolu kazan için malzeme alımı, Derin Sondaj Kuyusundaki Suyun Kuyu Ağzına Getirilmesi, yeni yapılmakta olan Kütüphane Binasının yanındaki kuyudan depoya su taşıma hattı çekilmesi, Isı santralinde bulunan kazanların bakım ve onarımı, Isı santralinde vana değişimi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü için, Isı Santrali tarafından kullanılmak üzere malzeme alımı, Isı Santrali için eşanjör malzeme alımı, Güzel Sanatlar Fakültesi klima bakım onarımları için malzeme alımı işleri doğrudan temin usulüyle yaptırılmıştır. Ayrıca; Çarşı İçi ve Onkoloji Hastanesi Çevre Düzenlemesi 1 ve 2 nolu kesin hakediş ödemesi, Kampüs içerisinde otomatik sulama sistemi yapılması işinin 1 nolu ve

kesin hakediş ödemesi ve Merkezi Isı Santrali Kazan Bakım ve Onarımı işinin de 1 nolu ve kesin hakediş ödemesi yapılmıştır.

<b>Kampüs içerisinde otomatik sulama sistemi yapılması</b>	
<b>İnşaatın Toplam Maliyeti</b>	1.286.143,62 TL
<b>İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi</b>	17.10.2024-15.12.2024
<b>Fiziki Gerçekleşme Durumu</b>	% 100
<b>AÇIKLAMA</b>	Gaziantep Üniversitesi kampüsü yeşil alanların manuel olarak yapılan basınçlı sulama sistemi, hem daha etkili ve kesinti olmadan sulama imkânı sunan hem de sulama işlemi için gerekli olan çalışan ve kullanılan su miktarından tasarruf sağlayan otomatik sulama sistemine dönüştürülmüştür. İş kapsamında var olan sulama noktalarına selenoid vana ile kontrol üniteleri takılarak suyun tam istenildiği miktarda ve tam istenildiği zamanda ideal oranda kullanılmasını sağlanacaktır.





## Merkezi Isı Santrali kazan bakım ve onarımı

İnşaatın Toplam Maliyeti	2.096.532,00 TL
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	07.11.2024-26.11.2024
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%100
<b>AÇIKLAMA</b>	Isı merkezinde bulunan 1 ve 2 nolu kazanların çürüyen boru ve aynaları değiştirilmiştir.



### Çarşı İçi ve Onkoloji Hastanesi Çevre Düzenlemesi

İnşaatın Toplam Maliyeti	2.210.631,12 TL
İnşaatın Başlangıç ve Bitiş Tarihi	04.04.2024-02.06.2024
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%100
AÇIKLAMA	Onkoloji Hastanesi çevresinde kilit taşı ile yer döşemesi ve kaldırım imalatları yapılmıştır. Çarşı içerisinde; mekanik tesisatın galeriden dükkânların içlerine çektikleri sıcak su hattının yapılırken sökülen karoların yerine yenileri döşenmiştir



#### 6.1.4. Muhtelif İşler


TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No Proje Adı	2024H03-232805	
Sektör/ Alt Sektör Proje Amacı	Muhtelif İşler	
Proje Yeri	Eğitim	
Karakteristiği	Üniversitenin makine-teçhizat, bilgi teknolojileri, bina onarım ve taşıt ihtiyacını temin etmek.	
Başlama-Bitiş Tarihi Projenin Yılı Ödeneği	Gaziantep	
	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri,	
	Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	
	2024-2024	
	30.000.000	42.650.000
Yapılan Harcama	36.993.650,20	

Bu proje kapsamında; 2024 Yılı Bütçe Kanunu 30.000.000,00 ödenek verilmiş, fakat anılan projeye yıl içerisinde Sıfır Atık Projesi Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 2.000.000,00 TL. hibe alınmıştır. Alınan hibe ile Atık Depolama Tesisi Subasman imalatı yapılmış ve bedeli ödenmiş olup, tesisin 2025 yılında tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır. Ayrıca, projeye yedek ödenekten tasarruflu LED ampul alımları için 2.500.000,00 TL. ödenek verilmiş diğer taraftan gelir fazlası ve likit karşılığı olmak üzere 8.150.000,00 TL. eklenerek yılsonu itibariyle toplam ödenek 42.650.0000,00 TL.'ye ulaşmıştır. Bahse konu ödeneğin 36.993.650,20 TL.'si harcanmış olup, harcama oranı %87 olarak gerçekleşmiştir.

#### **6.1.1.1 Bina Büyük Onarımları Kapsamında Yapılan İşler:**

Bu proje kapsamında; Bina Tadilat ve Onarımları, Nizip MYO. Eğitim Binası çatı bakım ve onarımları ve Atık Depolama Tesisi (Subasman imalatı) işlerinin hakediş ödemeleri yapılmıştır. Ayrıca doğrudan temin usulüyle; Rektörlük binasında bulunan güç kaynağında oluşan arızanın giderilmesi için malzeme alınması, Temel Tıp Bilimlerindeki normal ve kızgın su boruları ile çarşı kompleksinin sıcak su tesisatı için malzeme alımı, Isı Santralinde bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere malzeme alımı, Öğrenci Yemekhanesi 3.kat asma tavan yapım işi, Okul bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere malzeme alımı, Üniversitenin çeşitli birimlerinde okul bakım onarımlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzeme alımı 60x60 LED aydınlatma armatürü alımı işi, Biyoloji Bölümü Laboratuvarına malzeme alımı, Eğitim Fakültesi kapı yapımı, ana kampüste bulunan 40 adet asansörün periyodik bakım ücretinin ödemeleri bu projeden yapılmıştır. Üniversitemizde 2024 yılında bina büyük onarımları için toplam 8.744.493,09, makine teçhizat bakım onarımları için ise 1.412.935,20 TL. harcama yapılmıştır.

<b>Bina Tadilat ve Onarımları</b>	
İnşaatin Toplam Maliyeti	4.137.457,80
İnşaatin Başlangıç-Bitiş Tarihi	17.05.2024 – 13.09.2024
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%100
AÇIKLAMA	Bu onarım işlerinde; Rektörlük binasının iç cephe duvar ve tavan boyaları yapıldı, odaların tabanlarındaki eski halı kaplamalar sökülerek yerine laminant parke döşemeler yapıldı. Mekanik tesisat olarak klima sistemleri yenilendi, elektrik kapsamında ise tavan lambaları değişikliği işleri yapıldı. Merkezi Derslik binasında ise amfi tabanına PVC yer döşemesi işi yapıldı.

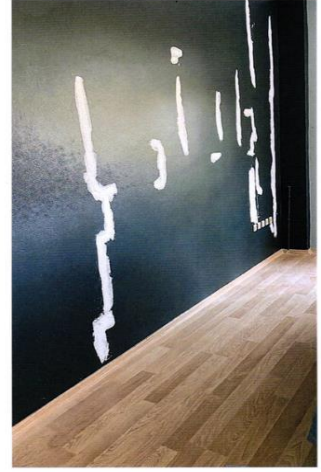

Nizip MYO. Eğitim Binası Çatı Tadilat ve Onarımları	
İnşaatın Toplam Maliyeti	1.101.905,52
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	05.08.2024-18.09.2024
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%100
AÇIKLAMA	Bu onarım işi kapsamında; Fırtınadan dolayı hasar gören çatının ahşap çatı konstrüksiyonu ve çatı örtüsü yapılarak onarımı yapılmıştır.



Atık Depolama Tesisi (Subasman imalatı)	
İnşaatın Toplam Maliyeti	891.809,11
İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi	08.07.2024-21.08.2024
Fiziki Gerçekleşme Durumu	%100
AÇIKLAMA	Atık depolama tesisinin subasman ve temel imalatları yapılarak tamamlanmıştır.



### 6.1.1.2 Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Donanım Alımlarına İlişkin Tablolar

MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI		
Sıra No	Birimler	Harcanan Bütçe
1	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	30.002,40
2	Araban MYO.	1.392,00
3	Nurdağı MYO ve Cenani Konağı	115.216,80
4	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	132.024,00
5	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	14.400,00
6	Üniversite Geneli( Merkez Ambarı )	3.194.432,22
7	Evrak arşiv İşleri Müdürlüğü	173.000,00
8	Gıda Mühendisliği	780.000,00
9	Naci Topçuoğlu MYO. (OSB)	3.643.836,00
10	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	60.000,00
TOPLAM:		8.144.303,42

DONANIM ALIMLARI		
Sıra No	Birimler	Harcanan Bütçe
1	Sağlık Bilimleri Fakültesi	59.067,80
2	Üniversite Geneli( Merkez Ambarı )	3.236.439,86
3	Naci Topçuoğlu MYO	2.233.221,97
4	İlahiyat Fakültesi	30.592,32
TOPLAM:		5.559.321,95

BİLGİSAYAR VE YAZILIM ALIMLARI		
Sıra No	Birimler	Harcanan Bütçe
1	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	7.920,00
2	Genel Sekreterlik	80.240,40
3	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1.613.994,00
4	Evrak Arşiv İşleri Müdürlüğü	402.286,00
5	Gıda Mühendisliği	120.000,00
6	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	300.000,00
7	Tıp Fakültesi Dekanlığı	78.000,00
8	Üniversite Geneli( Merkez Ambarı )	10.213.821,31
9	Naci Topçuoğlu MYO.	119.616,93
TOPLAM:		12.935.878,64

**Tablo 6:** Muhtelif İşler Kapsamında Alınan Makine.-Teçhizat, Bilgisayar ve Yazılım ile Donanım Alımları

### 6.1.5. Yayın Alımları

Bu proje kapsamında; 2024 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 5.000.000,00 TL. ödenek verilmiş olup, mevcut e-kaynak aboneliklerinin fatura ödemelerine yeterli gelmemesi nedeniyle 544.000,00 TL. likit karşılığı ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 5.544.000,00 TL. olmuştur. Bu ödenekten 2024 yılı sonunda 5.541.971,72 TL. harcanmış olup, harcama oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. Harcanan ödenek ile 12 adet veri tabanı ödemesi, 661 adet yabancı dilde e-kitap alımı yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemizin satın aldığı ve abone olduğu veri tabanlarına ilişkin bilgiler aşağıda tablolaştırılmıştır.

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2024H03-232803	
Proje Adı	Yayın Alımı	
Sektör/ Alt Sektör	Eğitim	
Proje Amacı	Üniversitemizdeki akademik personel ve öğrencilerimizin dünyadaki bilimsel gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yayınları takip edebilmesi ve çalışmalarında kullanacakları her türlü ortamdaki bilgiye erişmeleri için gerekli yayınların (basılı ve elektronik ortamda) sağlanmasıdır.	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	
Başlama-Bitiş Tarihi	2024-2024	
Projenin Yılı Ödeneği	5.000.000	5.544.000
Yapılan Harcama (₺)	<b>5.541.971,72</b>	

SATIN ALINAN VE ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI			
SIRA NO	VERİ TABANI ADI	KONUSU	HARCAMA BEDELİ
1	Clinical Key	Tıp	1.056.317,97
2	Institute of Physics (IOP)	Fen Bilimleri	412.826,04
3	JSTOR	Genel	99.465,50
4	Lexpera	Sosyal Bilimler (Hukuk)	41.624,40
5	Proquest e-book Academic Complete	Genel (e-kitap)	360.863,96
6	Scifinder	Fen Bilimleri	703.420,02
7	SOBİAD	Sosyal Bilimler	77.000,00
8	Springer Nature e-kitap (Enerji ve Eğitim)	Genel	55.896,31
9	Statista	Sosyal Bilimler	311.779,81
10	Summon	Keşif Aracı (Arama)	303.981,98
11	TSE Standart Online	Genel	66.000,00
12	Turcademy	Genel	552.519,64
13	Uptodate	Tıp	1.500,100,09
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>5.541.795,72</b>

(\*14 adet veri tabanı, 3 adet intihal engelleyen program ve 1 adet Kaynakça Yönetim Programı ULAKBİM/EKUAL kapsamında üniversitemizin erişimine açıktır.

**Tablo 7:** Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları

2022-2024 YILLARI ARASI TOPLAM KÜTÜPHANE KAYNAKLARI									
Açıklamalar	2022			2023			2024		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	143.706	457.403	601.129	134.298	402.013	536.311	143.182	468.001	611.183
Dergi Aboneliği	15	73.728	73.743	12	77.188	77.200	16	78.386	78.402
Tez	4.145	5.592.562	5.596.707	4.318	5.832.672	5.836.990	4.439	6.224.079	6.228.518
Abone Olunan Veri Tabanı sayısı	-	26	26		19	19	-	12	12
Standartlar	17.719	61.482	79.201	17.719	44.909	62.628	17.719	45.090	62.809
DVD-VCD (Bluray-3D)	2.525	-	2.525	2.525	-	2.525	2.525	-	2.525
<b>TOPLAM</b>	<b>168.110</b>	<b>6.185.201</b>	<b>6.353.311</b>	<b>158.872</b>	<b>6.356.782</b>	<b>6.515.654</b>	<b>167.881</b>	<b>6.815.568</b>	<b>6.983.449</b>

**Tablo 8:** 2022-2024 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları

## 6.2. SAĞLIK SEKTÖRÜ

### 6.2.1. Muhtelif İşler

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2024I00-218079-218081	
Proje Adı	Muhtelif işler (Makine Teçhizat ve Bakım Onarım)	
Sektör/ Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Sağlık Alanında İyileştirme	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Makine-Teçhizat	
Başlama-Bitiş Tarihi	2024-2024	
Projenin Yılı Ödeneği	69.320.000	<b>69.320.000</b>
Yapılan Harcama (₺)	<b>64.483.373,22</b>	

Proje kapsamında; 2024 Yılı Bütçe Kanunu ile hastaneye makine teçhizat alımları için 30.000.000,00 TL. ödenek verilmiştir. Bu ödenekten 2024 yılı sonunda 29.995.775,00 TL. harcama yapılmış olup, harcama oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca kaynağı döner sermayeden olmak üzere projeye yatırım programıyla 4.320.000,00 ödenek konulmuş olup, yıl içinde döner sermaye kaynağından herhangi bir harcama yapılmamıştır



### 6.2.1.1. Makine Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları

Üniversitemizin 2024 Yılı Yatırım Programına; hastanenin makine teçhizat alımları ile bina büyük onarımları için 65.000.000,00 TL. ödenek konulmuş olup, bu ödenekten, 2024 yılı sonu itibariyle 64.483.373,22 TL. tutarında harcama yapılmış ve harcama oranı %99 olarak gerçekleşmiştir.

#### ❖ Makine-Teçhizat Alımları:

Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine makine teçhizat alımları için 30.000.000,00 TL., ödenek konulmuştur.. Söz konusu ödenekten 2024 yılı sonu itibariyle 29.995.775,04 TL. harcama yapılmış ve harcama oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. Yıl içinde hastane birimlerine alınan makine teçhizatın dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2024 YILINDA HASTANEMİZE ALINAN MAKİNE, TEÇHİZAT VE TIBBİ CİHAZLARIN DAĞILIMI TABLOSU		
Sıra No	Bölüm/Birim Adı	Harcama (TL.)
1	Hastane Geneli	746.400,00
2	Sterilizasyon Birimi	139.200,00
3	Dahili Yoğun Bakım B.D.	660.660,00
4	Endoskopi Ünitesi/Gastroenteroloji	7.980.500,00
5	Göğüs Hastalıkları A.D.	10.757,12
6	Ameliyathane	1.196.823,06
7	Anesteziyoloji A D.	1.205.065,17
8	Tıbbi Onkoloji B.D.	1.388.684,55
9	Radyoloji A.D.	6.119.536,50
10	Genel Cerrahi	211.365,00
11	KBB Hastalıkları A.D.	1.553.507,81
12	Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.	19.898,29
13	Göz Hast. A.D.	13.507,81
14	Çocuk Nefroloji	386.500,00
15	Kalp Damar Cerrahi	4.202.000,00
16	Patoloji	1.430.000,00
17	Bilgi İşlem	91.369,69
18	Çamaşırhane	2.640.000,00
TOPLAM (₺)		29.995.775,00

Tablo 9: 2024 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu

#### ❖ Büyük Onarımlar:

Bu proje kapsamında; 2024 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 35.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten yılsonunda 34.487.598,18 TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 99 oranında gerçekleşmiştir.

Bu projeden; Mevcut Ambar binasının Onkoloji Hastanesine Dönüştürülmesi işinin hakediş ödemeleri, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi tadilat ve onarımları işinin hakediş ödemeleri ve Çocuk Hastanesi Otopark ve Peyzaj Düzenlemesi işi 1 nolu ve kesin hakediş ödemesi yapılmıştır. Ayrıca; Onkoloji Hastanesi girişine engelli platformu yapılması, Onkoloji Hastanesine sedye bandı ve duvar köşe bandı yapım işi karşılığı, Tıp Fakültesi amfilerinin önüne alüminyum bölme yapılması, Onkoloji Hastanesinde pis su hattında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzeme alımı işi, Çocuk Hastanesi çevre peyzaj düzenleme yapılması işi ödemeleri doğrudan temin usulüyle bu projeden yaptırılmıştır.

<b>Mevcut Ambar Binasının Onkoloji Hastanesine Dönüştürülmesi İşi</b>	
<b>İnşaatın Toplam Maliyeti (KDV+iş artışı dahil)</b>	49.146.223,68 TL
<b>2023 yılı harcaması</b>	38.196.135,70 TL
<b>İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi</b>	31.08.2023 -17.01.2024
<b>İnşaatın Kapalı Alanı</b>	5.040 m <sup>2</sup>
<b>Fiziki Gerçekleşme Durumu</b>	%100
<b>AÇIKLAMA</b>	Zemin kat kemoterapi merkezi, 1.kat palyatif odaları, tek ve iki kişilik hasta yatak odaları, doktor ve hemşire odaları 2.kat toplantı salonu, yemekhane, idari ofisler, tek ve iki kişilik hasta yatak odaları, doktor ve hemşire odaları bulunmaktadır.



## Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tadilat ve Onarımları

İnşaatin Toplam Maliyeti (KDV+iş Artışı Dahil) 20.260.631,10


İnşaatin Başlangıç-Bitiş Tarihi 03.06.2024-19.12.2024

İnşaatin Tamamlanma Oranı % 98

### AÇIKLAMA

Bu onarım kapsamında;

- 1- Çocuk hastanesi acil girişi sundurma ve onarım işleri,
- 2- Çocuk hastanesi yemekhane terası sundurma yapılması,
- 3- Çocuk hastanesi zemin kat acil bekleme salonu,
- 4- Çocuk hastanesi zemin kat kan alma ünitesi yanı oyun alanı,
- 5- Dış Hekimliği Fakültesi onarımları (iç cephe boya ve seramik işleri)
- 6- Eski yeni doğan yoğun bakıma 3 adet hasta odası yapılması,
- 7- Hastane geneli onarım tadilat işleri ( boya, seramik, banko yapımı, dolap yapımı, asma tavan, pvc zemin kaplama vb. işler)
- 8- Onkoloji hastanesi yanı tıbbi gaz tüp odası ve tesisat odalarının çatısı ve yanlarının kaplamaları,
- 9- Tıp fakültesi hastanesi çatı parapet işleri,
- 10- Tıp fakültesi hastanesi protokol üzeri çatı onarımı,
- 11- Tıp fakültesi hastanesi ziyaretçi girişi tadilatı,
- 12- Tıp fakültesi hastanesine asansör yapılması,
- 13- Tıp fakültesi protokol önü otopark yağmur suyu toplama kanalı yapılması işleri yapılmıştır.

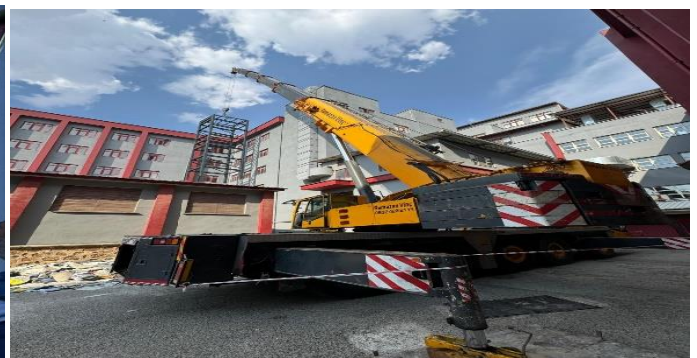


<b>Çocuk Hastanesi Otopark ve Peyzaj Düzenlemesi İşi</b>	
İnşaatin Toplam Maliyeti	2.025.666,54
İnşaatin Başlangıç-Bitiş Tarihi	03.12.2024- 22.12.2024
Fiziki Gerçekleşme Durumu	% 100
Açıklama	Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Poliklinik ve Ziyaretçi Girişi önünde kaldırım ve hasta yakınları için bekleme alanı düzenlemesi yapılmıştır. Aynı zamanda Engelli Araç ve Ambulans Yolu otomatik bariyer ve bordürlerle sivil araç yolundan ayrılacak şekilde yol düzenlemesi yapılmış, araç park cepleri oluşturulmuştur.



## 6.2.2. Acil Travma ve Yanık Hastanesi

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2022I00-183763	
Proje Adı	Acil Travma ve Yanık Hastanesi	
Sektör/ Alt Sektör	Sağlık	
Proje Amacı	Hasta yoğunluğu nedeni ile daha geniş yerde daha kaliteli hizmet vermek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Hastane İnşaatı (24.820 m <sup>2</sup> ), (134 yatak), Makine-Teçhizat	
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2025	
2022+2023 yılı harcaması	122.077.611,51	
Projenin Yılı Ödeneği	160.000.000	264.888.000
Yapılan Harcama (2024)	<b>264.517.742,85</b>	

Bu proje kapsamında; 2024 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından inşaat için 130.000.000,00 TL. makine teçhizat için 30.000.000,00 TL. olmak üzere toplam 160.000.000,00 TL. ödenek konulmuştur. Yıl içinde likit kaynaklardan 54.888.000,00 TL. yedek ödenekten 50.000.000,00 TL. olmak üzere toplam 104.888.000,00 TL. ödenek eklenerek yılsonu itibariyle toplam ödenek 234.888.000,00 TL.:’ye ulaşmıştır. Söz konusu ödenekten inşaat için 234.520.742,85 TL. harcama yapılmış olup, inşaatın fiziki gerçekleşmesi % 30 dur. Makine teçhizat kapsamında verilen 30.000,000,00 TL. ödenekten 29.997.000,00 TL.’ye ile bir adet anjiyografi cihazı alınmıştır.

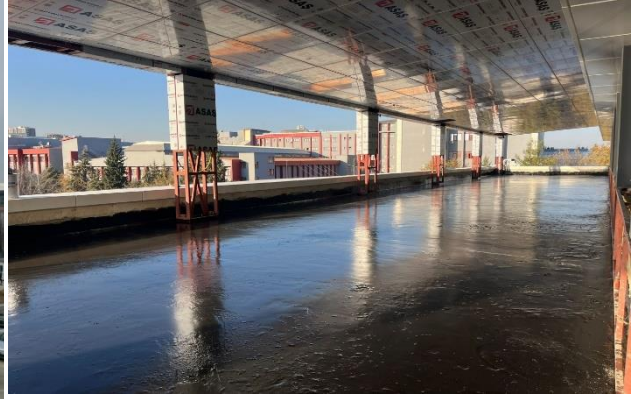

### 6.3. DİĞER KAMU HİZMETLERİ

#### 6.3.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

TAMAMLANMA RAPORU		
AÇIKLAMA	YATIRIM PROGRAMI	REVİZE
Proje No	2024K12-233480	
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	
Sektör/ Alt Sektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma	
Proje Amacı	Bilimsel Araştırma Projelerini Desteklemek	
Proje Yeri	Gaziantep	
Karakteristiği	Proje Desteği	
Başlama-Bitiş Tarihi	2024-2024	
Projenin Yılı Ödeneği	22.458.000	52.458.000
Yapılan Harcama (₺)	Bütçe Harcaması: 52.458.000,00 Özel Hesap Harcaması: 71.929.682,72	

Bu proje kapsamında; 2024 Yılı Bütçe Kanunu ile bütçeye yatırım projesi kapsamında 22.458.000,00 TL. ödenek konulmuş olup yıl içinde gelir fazlası olarak 30.000.000,00 TL ödenek eklenmiş toplam ödenek 52.458.000,00 TL. ye ulaşmıştır. Söz konusu ödeneğin tamamı 2024 yılı sonu itibariyle özel hesaba aktarılmıştır. Özel hesaptan bilimsel araştırma projelerinin cari yatırım harcamaları için 108.588.386,95 TL. harcama yapılmış olup, harcanan toplam tutarın 71.929.682,72 TL.'si yatırım harcamasına aittir. Diğer taraftan; 2024 yılı içerisinde 154 adet bilimsel araştırma proje desteklenmiş olup bu projeler için 70.994.488,38 TL. destek ayrılmıştır. 2023 yılından 199 adet proje 2024 yılına devrolmuştur. Ayrıca yıl içerisinde 140 adet proje sonuçlandırılmıştır.

2024 Yılı İtibariyle BAP Kapsamında Yürütülen Projeler				
Projeler	2023 Yılından Devreden Proje Sayısı	2024 Yılında Eklenen Proje Sayısı	Toplam Proje Sayısı	2024 Yılında Tamamlanan Proje Sayısı
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	199	154	213	140
<b>Genel Toplam</b>	<b>199</b>	<b>154</b>	<b>213</b>	<b>140</b>

**Tablo 10:** 2024 Yılı İtibariyle BAP Kapsamında Yürütülen Projeler

2024 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Araştırma Projelerinin Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı												
Akademik Birimler	Maip	ÖKAP	Alt Yapı	Hızlı Destek	Uzmanlık Tezi	Yüksek lisans	Doktora	GAP	DKP	ÖNAP	DAP	TOPLAM
Diş Hekimliği Fakültesi			3		10							13
Eğitim Fakültesi									2			2
Eğitim Bilimleri Enstitüsü									1			1
Fen Bilimleri Enstitüsü						2	1					3
Fen Edebiyat Fakültesi		2	1	1		8	1	1				14
Güzel Sanatlar Fakültesi	1					3						4
Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi			1	1		1						3
Hukuk Fakültesi		1										1
Nizip Eğitim Fakültesi						1						1
İlahiyat Fakültesi				1		1	2					4
Göç Enstitüsü						1						1
Mühendislik Fakültesi	2		2	1		9	11	1	1		1	28
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu	2			4								6
Rektörlük				1					4			5
Sağlık Bilimleri Enstitüsü						1						1
Sağlık Bilimleri Fakültesi			1				5					6
Spor Bilimleri Fakültesi						2	6					8
Tip Fakültesi			4	1	27	3	6	2	1		3	47
Sağlık Hizmetleri MYO.						2		1				3
Sosyal Bilimleri Enstitüsü						2						2
Teknik Bilimleri MYO.		1										1
<b>TOPLAM</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>154</b>

**Tablo 11:** 2024 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Arş. Projelerinin Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı

## 7. EKLER

### 7.1. 2024 Yılı Harcamaları Yılsunu Gerçekleşme Raporu (TL.)

Proje No	Proje Adı	Yeri	Karakteristiği	Başlama Bitiş Yılı	Proje Tutarı	2023 Kümülatif Harcama	2024 Yılı		
							Başlangıç Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama
<b>EĞİTİM- Yükseköğretim</b>					<b>747.591.681</b>	<b>34.211.681</b>	<b>142.000.000</b>	<b>254.830.000</b>	<b>246.981.111,75</b>
1988H03-146	Derslik ve Merkezi Birimler	Gaziantep	Atölye Binası (2.764 m <sup>2</sup> ), Kütüphane (18.700 m <sup>2</sup> )	1988-2026	669.828.000	18.500.000	100.000.000	192.778.000	192.720.481,44
1988H03-146-214162	Kütüphane Binası	Gaziantep	Kütüphane (18.700 m <sup>2</sup> )	2023-2026	632.075.000	0	87.000.000	173.525.000	173.473.580,83
1988H03-146-216522	Ek Atölye ve Laboratuvar Binası	Gaziantep	Atölye Binası (2.764 m <sup>2</sup> )	2023-2024	37.753.000	18.500.000	13.000.000	19.253.000	19.246.900,61
2020H03-150666	Kampüs Altyapısı	Gaziantep	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2024	28.569.681	15.711.681	6.000.000	12.858.000	11.665.184,39
2024H03-232801	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Gaziantep	Etüt-Proje	2024-2024	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	60.000,00
2024H03-232803	Yayın Alımı	Gaziantep	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2024-2024	5.544.000	0	5.000.000	5.544.000	5.541.795,72
2024H03-232805	Muhtelif İşler	Gaziantep	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2024-2024	42.650.000	0	30.000.000	42.650.000	36.993.650,20
<b>SAĞLIK</b>					<b>522.137.000</b>	<b>187.929.000</b>	<b>229.320.000</b>	<b>334.208.000</b>	<b>329.001.116,07</b>
2022I00-183763	Acil Travma ve Yanık Hastanesi	Gaziantep	Hastane İnşaatı (24.820 m <sup>2</sup> , 134 yatak), Makine-Teçhizat	2022-2024	452.817.000	187.929.000	160.000.000	264.888.000	264.517.742,85
2022I00-183763-183765	İnşaat	Gaziantep	Hastane İnşaatı (24.820 m <sup>2</sup> , 134 yatak)	2022-2024	422.817.000	187.929.000	130.000.000	234.888.000	234.520.742,85
2022I00-183763-183769	Makine Teçhizat	Gaziantep	Makine-Teçhizat	2024-2024	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	29.997.000,00



2024I00-218079	Muhtelif İşler	Gaziantep	Büyük Onarım, Makine-Teçhizat	2024-2024	69.320.000	0	69.320.000	69.320.000	64.483.373,22
2024I00-218079-218080	Büyük Onarım (Deprem)	Gaziantep	Büyük Onarım	2024-2024	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	34.487.598,18
2024I00-218079-218081	Makine ve Teçhizat	Gaziantep	Makine-Teçhizat	2024-2024	34.320.000	0	34.320.000	34.320.000	29.995.775,04
<b>DKH-SOSYAL- Teknolojik Araştırma</b>					<b>52.458.000</b>	<b>0</b>	<b>22.458.000</b>	<b>52.458.000</b>	<b>52.458.000,00</b>
2024K12-233480	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Gaziantep	Proje Desteği	2024-2024	52.458.000	0	22.458.000	52.458.000	52.458.000,00
<b>Genel Toplam</b>					<b>1.322.186.681</b>	<b>222.140.681</b>	<b>393.778.000</b>	<b>641.496.000</b>	<b>628.440.227,82</b>
